



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

**RELAZIONE
SULLA PROSECUZIONE DEL CONTROLLO
SULLA GESTIONE IN CORSO D'ESERCIZIO
- INTERVENTO M6-C1-I1.1 P.N.R.R. -
CASE DI COMUNITÀ E PRESA IN CARICO
DELLA PERSONA
DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA/ VALLÉE D'AOSTE.**

Deliberazione n. 20 del 30 settembre 2025



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE
SULLA PROSECUZIONE DEL CONTROLLO
SULLA GESTIONE IN CORSO D'ESERCIZIO
- INTERVENTO M6-C1-I1.1 P.N.R.R. -
CASE DI COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA
PERSONA
DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE.**

Relatore:

Consigliere Sara Bordet

Hanno collaborato all'attività istruttoria e all'elaborazione dei dati:

dr.ssa Debora Marina Marra

dr.ssa Isabella Petroz



Deliberazione n. 20/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

(ADUNANZA PLENARIA)

composta dai magistrati:

Cristiana Rondoni	Presidente
Fabrizio Gentile	Consigliere
Franco Emilio Mario Vietti	Consigliere
Sara Bordet	Consigliere relatore
Davide Floridia	Primo Referendario

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modifiche e integrazioni ("Statuto speciale per la Valle d'Aosta");

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934 n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti");

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 10 marzo 2025, n. 2, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2025;

visto il decreto del Presidente della Sezione 22 aprile 2025, n. 4, con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2025, l'istruttoria, relativa alla relazione sulla prosecuzione del controllo sulla gestione in corso d'esercizio sull'intervento del PNRR M6-C1-I-1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona – il cui soggetto attuatore è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è stata assegnata al consigliere Sara Bordet;

vista l'ordinanza 29 settembre 2025, n. 14, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'adunanza, anche in collegamento da remoto (videoconferenza)

udito il relatore, cons. Sara Bordet, nell'adunanza in camera di consiglio del 30 settembre 2025;

DELIBERA

di approvare il documento allegato “Relazione sulla prosecuzione del controllo sulla gestione in corso d'esercizio - Intervento M6-C1-I1.1 P.N.R.R. – Case di Comunità e presa in carico della persona della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste” che alla presente si unisce, quale parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; al Direttore dell'Azienda USL Valle d'Aosta.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.

Il relatore
(Bordet Sara)

Il presidente
(Cristiana Rondoni)

Depositato in segreteria in data corrispondente a quella di sottoscrizione del funzionario.
Il funzionario (Debora Marina Marra)

INDICE

Premessa e metodologia dell'indagine	01
1. Quadro normativo di riferimento	05
2. Intervento M6-C1-I1.1 Case di Comunità	08
2.1 Iter procedurale e Quadro esigenziale di riferimento dell'intervento	08
2.2 Casa di Comunità di Aosta	20
2.3 Casa di Comunità di Chatillon	25
2.4 Casa di Comunità di Donnas	30
2.5 Casa di Comunità di Morgex	35
3. Osservazioni	40
4. Considerazioni di sintesi	42

INDICE TABELLE

Tabella n. 1 - Servizi e attività specialistiche da attivare	15
Tabella n. 2 - Quadro economico Casa di Comunità Aosta	22
Tabella n. 3 - Quadro economico Casa di Comunità Chatillon	27
Tabella n. 4 - Quadro economico Casa di Comunità Donnas	32
Tabella n. 5 - Quadro economico Casa di Comunità Morgex	37

INDICE GRAFICI

Grafico n. 1 - Avanzamento economico e finanziario Casa di Comunità Aosta	20
Grafico n. 2 - Avanzamento economico e finanziario Casa di Comunità Chatillon	25
Grafico n. 3 - Avanzamento economico e finanziario Casa di Comunità Donnas	30
Grafico n. 4 - Avanzamento economico e finanziario Casa di Comunità Morgex	35

Premessa e metodologia dell'indagine.

Con deliberazione di questa Sezione n. 2 del 10 marzo 2025¹ è stato approvato il programma delle attività di controllo relative all'anno 2025, tra le quali, la prosecuzione del controllo sulla gestione in corso di esercizio dell'intervento Case di Comunità e presa in carico della persona della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

L'istruttoria di tale intervento è stata assegnata al sottoscritto relatore con Decreto del Presidente n. 4 del 22 aprile 2025.

Nella relazione si illustra la prosecuzione dell'attività di controllo sulla gestione in corso di esercizio svolta nei confronti dell'intervento facente parte del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ricompreso nella Missione 6 "Salute", Componente 1 "Le reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale", Intervento 1.1 "Case di comunità e presa in carico della persona", di seguito definito intervento M6-C1-I1.1 P.N.R.R.

Tale attività trova fondamento nell'ambito dei controlli successivi sulla gestione, a norma di quanto previsto all'art. 3, comma 4 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994², ed è diretta a formulare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia in ordine all'acquisizione e all'impiego delle risorse provenienti dai fondi P.N.R.R., nell'ottica della piena attuazione dello stesso e del pieno raggiungimento degli obiettivi in esso stabiliti. Il controllo è inteso come stimolo alla sana gestione degli enti e funzionale a prevenire squilibri di bilancio, accertando, tempestivamente, ritardi e anomalie nell'azione amministrativa, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le disfunzioni accertate. La Sezione verifica, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

Tenuto conto della tipologia dell'intervento sottoposto a controllo, l'attività ha riguardato, in particolare, la verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso la consultazione dei documenti attinenti all'oggetto dell'indagine e collegati alle valutazioni del P.N.R.R. e il grado di avanzamento complessivo del progetto nel rispetto dei Target stabiliti.

¹ Corte di conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, "Programma delle attività della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste relative all'anno 2025" (Deliberazione 10 marzo 2025, n. 2).

² L. 14 gennaio 1994, n. 20 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".

Più nello specifico, per quanto riguarda gli strumenti del controllo, uno fra i principali strumenti utilizzati è stato l'accesso al sistema informativo previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178³ (Legge di bilancio 2021), denominato "Re.GIS" - sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato - che rappresenta la modalità attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal P.N.R.R.

L'acquisizione dei dati e delle informazioni è avvenuta con le consuete modalità di confronto e dialogo con le amministrazioni responsabili della gestione degli interventi sottoposti al controllo, attraverso apposite richieste in sede istruttoria.

L'attività istruttoria è stata effettuata nel rispetto del contraddittorio, pertanto il presente referto è stato inviato alla Regione e all'Azienda USL Valle d'Aosta⁴, per eventuali osservazioni allo schema di Relazione. L'azienda USL Valle d'Aosta, con propria nota ns. prot. n. 1139 del 19 settembre 2025 ha riferito di non avere alcuna osservazione da formulare. La Regione Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste ha fatto pervenire le proprie osservazioni in data 25 settembre 2025, ns. prot. n. 1144.

La Sezione ha già esaminato lo stato di attuazione del progetto in questione, nell'ambito dei controlli per l'anno 2023, approvando uno specifico referto, con deliberazione n. 22 del 21 giugno 2023⁵, nella quale accertava e disponeva quanto di seguito:

"All'esito di quanto illustrato la Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, preso atto della situazione delineata, a conclusione dell'attività di controllo svolta, rileva, con riferimento all'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza M6-C1-I1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona - l'esigenza di recuperare il ritardo accumulato nelle approvazioni delle progettazioni idonee per l'indizione delle gare per tutte e quattro le Case della comunità entro il successivo trimestre rispetto a quello individuato nel target con scadenza T1 2023, attenendosi alle disposizioni del Ministero della Salute.

³ L. 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

⁴ Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nota 9 settembre 2025, n. 1131.

⁵ Corte di conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, "Relazione sull'attività svolta nell'ambito del controllo sulla gestione in corso di esercizio - Intervento M6-C1-I1.1 – Case della Comunità e presa in carico delle persona - P.N.R.R. della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" (Deliberazione 21 giugno 2023, n. 22).

A tale fine si invita la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, quale soggetto attuatore, e l'Azienda USL Valle d'Aosta, quale soggetto attuatore esterno/delegato, ciascuno per il proprio ruolo,

- ad attenersi agli impegni assunti e riportati nella nota Regione ns. prot. n. 759 del 12 giugno 2023 e precisamente: di adottare ogni adeguato rimedio diretto all'approvazione dei progetti, assegnazione dei codici CIG e stipula dei contratti per la realizzazione della Centrale operativa territoriale e per l'interconnessione aziendale entro giugno 2023; all'aggiudicazione delle gare relative alle Case della comunità entro settembre 2023; e alla stipulazione dei contratti per la realizzazione degli interventi entro dicembre 2023;*
- a comunicare, entro sei mesi dal ricevimento della presente Relazione, le misure conseguenziali adottate per superare le osservazioni formulate in linea con la nota del Presidente di questa Sezione prot. n. 549 del 12 luglio 2022.*

La Sezione, anche nell'ambito del monitoraggio delle misure conseguenziali adottate, valuterà ulteriori approfondimenti."

Con nota del 12 febbraio 2024, ns. prot. n. 214, la Regione Valle d'Aosta, come richiesto, riferiva: "Con riferimento alla Vostra nota pervenuta in data 3 luglio 2023, con protocollo n. 5575, acquisita al protocollo del Dipartimento sanità e salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali in medesima data, con il n. 6083/SAN, si comunica di seguito lo stato dell'arte aggiornato dell'investimento M6C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona" a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per il quale la Sezione di controllo della Corte dei conti, nella deliberazione di cui all'oggetto, aveva osservato che, alla data del 31 marzo 2023, per nessuna delle quattro Case della comunità vi era stata l'approvazione di progettazione idonea per l'indizione della gara per la realizzazione (target T1 2023 ITA).

In particolare, si evidenzia quanto segue:

- con le determine dirigenziali della S.C. Tecnico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta di seguito elencate sono state affidate le progettazioni relative alle quattro Case della comunità:*
 - n. 1055 in data 14 dicembre 2022, Casa della comunità di Aosta;*
 - n. 29 in data 5 gennaio 2023, Casa della comunità di Châtillon;*
 - n. 80 in data 19 gennaio 2023 Casa della comunità di Morgex;*
 - n. 137 in data 10 febbraio 2023 Casa della comunità di Donnas.*
- in data 23 maggio 2023, si è svolta una riunione del Nucleo Tecnico nel corso della quale il dirigente dell'Ufficio 1, Vicario dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del*

Ministero della Salute, in qualità di Coordinatore delle attività del Nucleo stesso, ha segnalato l'importanza del raggiungimento di milestone e target intermedi previsti e sottoscritti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), invitando la Regione ed i Responsabili Unici del Procedimento dell'Azienda USL della Valle d'Aosta a recuperare i ritardi accumulati e a raggiungere i Target con scadenza T1 2023 entro il successivo trimestre (T2 2023 ovvero giugno 2023).

- con determina dirigenziale della S.C. Tecnico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 618 in data 29 giugno 2023 sono stati approvati i progetti esecutivi (depositati in originale presso la S.C. Tecnico) e sono, inoltre, state indette le gare per la realizzazione delle quattro Case della comunità finanziate nella Regione Valle d'Aosta, ottemperando, pertanto, alle prescrizioni dettate dal Nucleo Tecnico e riallineando le attività alle scadenze del PNRR.

- in data 4 settembre 2023, l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha aggiudicato i lavori di realizzazione dei quali si tratta:

- per la Casa della comunità di Morgex alla ditta Capasso Antonio;*
- per la Casa della comunità di Donnas alla ditta Casale Impianti S.r.l.;*
- per la Casa della comunità di Aosta alla ditta Verde Mattone S.r.l.*

Per la Casa della comunità di Châtillon i lavori di realizzazione sono stati aggiudicati, in data 22 settembre 2023, alla ditta I.E.F. Leonardo S.r.l.

- l'Azienda USL della Valle d'Aosta:

- in data 19 settembre 2023, ha sottoscritto i contratti per l'esecuzione dei lavori per le Case della comunità di Donnas e di Aosta;*
- in data 26 settembre 2023, ha sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori per la Casa della comunità di Morgex;*
- in data 29 settembre 2023, ha sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori per la Casa della comunità di Châtillon.”⁶*

Preso, pertanto, atto che i rilievi delineati nella precedente ricognizione e le misure consequenziali adottate dall'Amministrazione regionale, volte al recupero del ritardo accumulato, sono risultate efficaci a superare le criticità, la prosecuzione del presente controllo verterà, principalmente, sull'iter realizzativo e sullo stato di fatto attuale degli interventi in questione.

⁶ Regione Valle d'Aosta, Presidenza della Regione, nota 12 febbraio 2024, ns. prot. n. 214.

1. Quadro normativo di riferimento.

Alla Corte dei conti è affidato il controllo sull'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito anche P.N.R.R., e dalle altre fonti di finanziamento (Fondo per lo sviluppo e la coesione-F.S.C., Piano nazionale per gli investimenti complementari-P.N.C. e risorse di bilancio), previsto dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021⁷, convertito con modificazioni, con la legge 29 luglio 2021, n. 108.

Tale norma prevede che la Corte dei conti eserciti il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994⁸, svolgendo valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia in ordine all'acquisizione e all'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al P.N.R.R., nell'ottica della piena attuazione dello stesso e del pieno raggiungimento degli obiettivi in esso stabiliti.

A tale fine, con deliberazione n. 31, del 28 dicembre 2022⁹ la Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste della Corte dei conti approvava le linee programmatiche del controllo concomitante per l'anno 2023, individuando gli ambiti e i criteri selettivi delle indagini, gli strumenti e gli esiti e gli interventi da sottoporre al controllo, tra i quali l'intervento denominato "Case di comunità e presa in carico della persona", distinto al M6-C1-I1.1.

⁷ D.L. 31 maggio 2021 n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", art. 7, comma 7: "La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20".

⁸ L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4: "La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organismi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico."

⁹ Corte dei conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, "Linee programmatiche del controllo concomitante della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste per l'anno 2023" (Deliberazione 28 dicembre 2022, n. 31).

Senonché, l'art. 1, comma 12 *quinquies*, del decreto-legge n. 44, del 22 aprile 2023¹⁰, convertito con modificazioni, con la legge 21 giugno 2023, n. 74, intervenendo a modifica dell'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76¹¹, escludeva, dalla data di entrata in vigore della norma (22 giugno 2023), il controllo concomitante sui progetti previsti o finanziati dal P.N.R.R. o dal P.N.C., sui quali la Sezione ha, però, continuato a svolgere il controllo sulla gestione in corso di esercizio, ai sensi della legge n. 20/1994, formulando valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia in ordine all'acquisizione e all'impiego delle risorse provenienti da detti piani, nell'ottica della piena attuazione degli stessi e del pieno raggiungimento degli obiettivi in essi stabiliti¹².

Questo anche a fronte delle linee programmatiche dettate dalle Sezioni riunite in sede di controllo, da ultimo, con deliberazione n. 61/SSRRCO/INPR/2024, secondo le quali, nell'individuare le attività di controllo in sede territoriale, si attribuiscono alle Sezioni regionali di controllo l'indicazione di temi da sviluppare, valorizzando l'attività da loro svolta in ragione della loro vicinanza al territorio. Tra questi, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno individuato gli interventi P.N.R.R. affermando: *“Il quadro programmatico generale, pertanto, nel proporre alcuni temi da sviluppare, valorizza l'attività svolta dalle Sezioni regionali di controllo in ragione della loro vicinanza al territorio, che ne rappresenta valore fondante. Ed invero - come più volte sottolineato - l'articolazione centrale, e insieme territoriale dell'Istituto di controllo, in una visione unitaria delle funzioni di controllo, consente di offrire sia al*

¹⁰ D.L. 22 aprile 2023 n. 44, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*.

¹¹ D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*.

¹² Corte di conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, *“Relazione sull'attività svolta nell'ambito del controllo sulla gestione in corso di esercizio - Intervento M6-C1-I1.1 - Case della Comunità e presa in carico delle persona - P.N.R.R. della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”* (Deliberazione 21 giugno 2023, n. 22).

Corte di conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, *“Relazione sull'attività svolta nell'ambito del controllo sulla gestione in corso di esercizio - Intervento M6-C1-I1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedi e delle sue strutture - Ospedali di Comunità - P.N.R.R. della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”* (Deliberazione 17 ottobre 2023, n. 29).

Corte di conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, *“Relazione sulla prosecuzione del controllo sulla gestione in corso di esercizio - Intervento M6-C1-I1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedi e delle sue strutture - Ospedali di Comunità - P.N.R.R. della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”* (Deliberazione 6 dicembre 2024, n. 31).

Corte di conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, *“Relazione sugli esiti del controllo sulla gestione in corso di esercizio del progetto “Arvier agile. La cultura del cambiamento” Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi - Linea di azione A”, finanziato nell'ambito del PNRR”* (Deliberazione 20 dicembre 2024, n. 33).

Corte di conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, *“Adduzione di acqua irrigua a servizio dei comprensori dei Consorzi di Miglioramento Fondiario Champlong, Cumiod-Montovert, Torrette e Ru Brean”* (Deliberazione 20 dicembre 2024, n. 34).

Parlamento nazionale che alle diverse Assemblee regionali valutazioni e riferimenti finanziari e gestionali non altrimenti disponibili. Testimonianza costante e tangibile di questo approccio può essere individuata proprio nelle molteplici filiere di attuazione dei programmi assentiti con le risorse del PNRR, laddove una larga parte degli interventi vede infatti una stretta interazione tra Amministrazioni centrali responsabili e soggetti attuatori a livello regionale e locale. Interazione che si riverbera sia sul versante procedurale e amministrativo che su quello più squisitamente contabile dell'allocazione, messa a disposizione e utilizzazione delle risorse. La spesa per investimenti pubblici locali, principalmente finanziata con le risorse del PNRR, assume, pertanto, una rilevanza fondamentale nel quadro generale di finanza pubblica atteso che sull'andamento della stessa è strettamente correlata, per i suoi riflessi sulla crescita, l'effettiva possibilità di un risanamento duraturo e sostenibile dei conti pubblici."

Sulla scorta di questo quadro normativo di riferimento viene svolta l'attività di controllo del presente referto.

2. Intervento M6-C1-I1.1 Case di Comunità

Nella Regione Valle d'Aosta sono state finanziate quattro Case di Comunità da realizzarsi nei Poliambulatori USL di Aosta, Chatillon, Donnas e Morgex.

L'importo complessivo del finanziamento è di euro 3.490.030,00, suddiviso in quattro interventi distinti ed autonomi:

- Case di comunità di Aosta – CUP B67H22001650006 – euro 516.176,00
- Case di comunità di Chatillon – CUP B57H22000970006 – euro 820.571,00
- Case di comunità di Donnas – CUP B87H22001270006 – euro 1.303.117,00
- Case di comunità di Morgex – CUP B27H22000740006 – euro 850.166,00

Per tutti e quattro gli interventi l'Amministrazione titolare del finanziamento è il Ministero della Salute, il soggetto attuatore è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il soggetto attuatore esterno/delegato è l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

2.1 Iter procedurale e Quadro esigenziale di riferimento dell'Intervento

Il progetto è ricompreso nella Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza P.N.R.R. "Salute", Componente 1 "Le reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale".

Tale componente è volta a perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale e organizzativo, che consenta al Paese di conseguire standard qualitativi di cura adeguati, in linea con i migliori Paesi europei e che considera, sempre più, il Servizio Sanitario Nazionale S.S.N. come parte di un più ampio sistema di welfare comunitario e si concretizza con la realizzazione/attivazione di oltre 1.400 (previsione iniziale 1.350) Case di comunità sull'intero territorio nazionale, anche di nuova costruzione, dotate di attrezzature tecnologiche che garantiscano parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone.

Per Casa della comunità si intende¹³ la struttura socio-sanitaria erogatrice di servizi sanitari di prossimità ai residenti, principalmente anziani, e diretta alla riduzione del numero delle ospedalizzazioni. Tali strutture dovranno costituire un punto di riferimento per l'assistenza primaria sul territorio in favore di disabili, pazienti cronici o affetti da disturbi psichici, o non autosufficienti. La misura ha, quindi, lo scopo di rafforzare la capacità del S.S.N. di fornire servizi adeguati sul territorio.

Per la realizzazione di tale obiettivo il Piano ha messo, complessivamente, a disposizione risorse pari a euro 2 miliardi.

Con decreto del Ministero della salute del 20 gennaio 2022¹⁴, nell'ambito della ripartizione delle risorse alle Regioni e Province autonome per i progetti del P.N.R.R. e P.N.C., veniva assegnata alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la somma di euro 3.493.579,03 per il finanziamento dell'intervento 1.1. Case della Comunità.

Con delibera di Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 241¹⁵ la Regione approvava gli indirizzi in merito agli investimenti assegnati e, con riferimento all'intervento di cui ci si occupa, la realizzazione di quattro Case:

- Casa della Comunità sita nel Comune di Aosta presso il Poliambulatorio situato in Via Guido Rey n. 1/3 – Soggetto attuatore Azienda USL della Valle d'Aosta;
- Casa della Comunità sita nel Comune di Chatillon presso il Poliambulatorio – Soggetto attuatore Azienda USL della Valle d'Aosta;
- Casa della Comunità sita nel Comune di Donnas presso il Poliambulatorio – Soggetto attuatore Azienda USL della Valle d'Aosta;
- Casa della Comunità sita nel Comune di Morgex presso il Poliambulatorio – Soggetto attuatore Azienda USL della Valle d'Aosta.

¹³ Sito governativo Italia Domani.

¹⁴ Decreto Ministero della salute del 20 gennaio 2022, "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alla province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", pubblicato sulla G.U. 9 marzo 2022 Serie generale n. 57, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022.

¹⁵ D.g.r. 7 marzo 2022, n. 241 "Approvazione degli indirizzi in merito agli investimenti e ai relativi soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli interventi complementari – Missione 6 "Salute", componenti 1. "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" e 2. "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale".

Seguiva il provvedimento dirigenziale n. 1820, del 30 marzo 2022¹⁶ dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, Dipartimento sanità e salute, con il quale venivano nominati i referenti regionali e i Responsabili unici del procedimento (RUP), relativi alle diverse linee di investimento previste dal Piano.

Con delibera di Giunta regionale 26 maggio 2022, n. 596¹⁷ la Regione approvava il Piano operativo regionale - P.O.R. - e le schede tecniche relativi al P.N.R.R. - Missione 6 "Salute" che, con riferimento agli interventi in questione M6-C1-I1.1 - Case della comunità e presa in carico della persona, per un importo complessivo di euro 3.490.030,00, disponeva la seguente ripartizione:

A. Casa della Comunità di Aosta - Capitolo E0022797 "Contributi agli investimenti per il finanziamento della realizzazione della Casa della Comunità di Aosta a valere sul Piano nazionale di riprese e resilienza (P.N.R.R.), per complessivi euro 516.176,00:

Anno 2022 euro 10.323,00;

Anno 2023 euro 10.324,00;

Anno 2024 euro 185.823,00;

Anno 2025 euro 309.706,00.

B. Casa della Comunità di Morgex - Capitolo E0022807 "Contributi agli investimenti per il finanziamento della realizzazione della Casa della Comunità di Morgex a valere sul Piano nazionale di riprese e resilienza (P.N.R.R.), per complessivi euro 850.166,00:

Anno 2022 euro 17.003,00;

Anno 2023 euro 17.003,00;

Anno 2024 euro 306.060,00;

¹⁶ Provvedimento dirigenziale 30 marzo 2022, n. 1820 dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali Dipartimento Sanità e salute "Nomina dei referenti regionali dei responsabili unici del procedimento (RUP) relativamente alle linee di investimento previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 6 "Salute", componenti 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" e 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale", ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 241 in data 7 marzo 2022.

¹⁷ D.g.r. 26 maggio 2022, n. 596 "Approvazione del Piano operativo regionale e delle schede tecniche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli interventi complementari - Missione 6 "Salute", componenti 1. "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" e 2. "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale".

Anno 2025 euro 510.100,00.

- C. Casa della Comunità di Donnas – Capitolo E0022809 “Contributi agli investimenti per il finanziamento della realizzazione della Casa della Comunità di Donnas a valere sul Piano nazionale di riprese e resilienza (P.N.R.R.), per complessivi euro 1.303.117,00:

Anno 2022 euro 26.062,00;

Anno 2023 euro 26.062,00;

Anno 2024 euro 469.122,00;

Anno 2025 euro 781.871,00.

- D. Casa della Comunità di Chatillon – Capitolo E0022804 “Contributi agli investimenti per il finanziamento della realizzazione della Casa della Comunità di Chatillon a valere sul Piano nazionale di riprese e resilienza (P.N.R.R.), per complessivi euro 820.571,00:

Anno 2022 euro 16.411,00;

Anno 2023 euro 16.411,00;

Anno 2024 euro 295.406,00;

Anno 2025 euro 492.343,00.

Seguiva la sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo CIS e del relativo Piano Operativo allegato con il Ministero della Salute in data 30 maggio 2022, prot. n. 9487 dell’Ufficio di Gabinetto della Regione autonoma Valle d’Aosta e registrato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Salute, per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia della Regione.

I cronoprogrammi delle linee di intervento venivano, poi, rimodulati come segue¹⁸:

A. Casa della Comunità di Aosta – CUP B67H22001650006:

Anno 2022 euro 49.552,90

Anno 2023 euro 148.658,69

Anno 2024 euro 136.270,45

Anno 2025 euro 181.693,95

B. Casa della Comunità di Morgex – CUP B27H22000740006:

Anno 2022 euro 81.615,94

Anno 2023 euro 244.847,81

Anno 2024 euro 224.443,82

Anno 2025 euro 299.258,43

C. Casa della Comunità di Donnas – CUP B87H22001270006:

Anno 2022 euro 125.099,23

Anno 2023 euro 375.297,70

Anno 2024 euro 344.022,89

Anno 2025 euro 458.697,18

D. Casa della Comunità di Chatillon – CUP B57H22000970006:

Anno 2022 euro 78.774,82

Anno 2023 euro 236.324,45

Anno 2024 euro 216.630,74

Anno 2025 euro 288.840,99

Completavano il quadro delle attività preordinate alla realizzazione degli interventi la delibera di Giunta regionale 4 luglio 2022, n. 768¹⁹, con la quale venivano approvati lo

¹⁸ Provvedimento dirigenziale 30 settembre 2022, n. 5652 dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali Dipartimento Sanità e salute "Riprogrammazione dei fondi a destinazione vincolata assegnati dallo Stato per il finanziamento delle linee di investimento previste dalla Regione autonoma Valle d'Aosta a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 6 "Salute", componenti 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" e 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale", ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 962 in data 29 agosto 2022.

¹⁹ D.g.r. 4 luglio 2022, n. 768 "Approvazione dello Schema di Accordo di programma tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e l'Azienda USL della Valle d'Aosta per la realizzazione delle Linee di investimento a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli interventi complementari – Missione 6 "Salute", componenti 1.

schema di Accordo di programma tra la Regione e l'Azienda USL e la bozza di Atto di delega per l'attuazione degli interventi, poi entrambi sottoscritti il 13-28 luglio 2022; la trasmissione all'Azienda USL del Quadro esigenziale²⁰ del 2 settembre 2022, sulla base del quale venivano individuate i servizi e le attività specialistiche da attivare nella quattro Case di Comunità all'esito degli interventi finanziati e l'approvazione del Documento generale di programmazione dell'assistenza territoriale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero della salute del 23 maggio 2022 n. 77²¹.

Quanto al Quadro esigenziale, la realizzazione di una Casa di Comunità si colloca nel campo dell'assistenza integrata ed è intesa come luogo fisico e snodo organizzativo che accolga i servizi propri della comunità, integrando i servizi sociali con quelli sanitari e deve offrire strumenti e spazi per un'adequata partecipazione non solo alle scelte di politica sanitaria, ma anche la gestione della propria salute e allo sviluppo di forme di auto aiuto.

Per soddisfare questo compito complesso la Casa di Comunità deve essere una struttura riconosciuta e raggiungibile dalla popolazione di riferimento.

A questo scopo nella Regione Valle d'Aosta sono state individuate come sedi *Hub* quattro Poliambulatori Distrettuali già esistenti che soddisfano alcuni requisiti fondamentali.

Si tratta di strutture pubbliche del S.S.R. dove, almeno parzialmente, già prima degli interventi in oggetto, si realizzava l'integrazione con il sistema dei servizi sociali, elemento decisivo per realizzare (come previsto dall'obiettivo M6C1-1 del P.N.R.R.) il raccordo intrasettoriale dei servizi in termini di percorsi e soluzioni basati sull'integrazione delle diverse dimensioni di intervento e dei diversi ambiti di competenza, con un approccio orizzontale e trasversale ai bisogni, tenendo conto anche della dimensione personale dell'assistito.

"Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" e 2. "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale".

²⁰ Azienda USL della Valle d'Aosta, Relazione Responsabile Unico del Procedimento, Allegato n. 4, nota 4 luglio 2023, ns. prot. n. 837.

²¹ D.g.r. 22 dicembre 2022, n. 1609 "Approvazione del Documento generale di programmazione dell'assistenza territoriale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero della salute del 23 maggio 2022, n. 77 e dei Atti di programmazione volti a istituire le Associazioni funzionali territoriali (AFT) dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS), nonché delle Unità complesse di cure primari (UCCP), ai sensi degli Accordi collettivi nazionali vigenti della medicina convenzionata. Revoca dell'allegato A della d.g.r. 1304/2008".

La casa della Comunità è organizzata per aree, ciascuna finalizzata ad offrire al cittadino una risposta immediata ai suoi bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria, concentrando in un'unica struttura la gran parte dell'offerta distrettuale del S.S.R.

È il punto d'incontro più prossimo tra il cittadino e il sistema organizzato del SS e dei servizi socio-sanitari.

Ad essa si rivolgono i cittadini per le informazioni e le prenotazioni di visite, esami e altre prestazioni di cura (CUP), per la presa in carico dei loro bisogni assistenziali e per l'organizzazione di una risposta adeguata (PUA).

Le aree di riferimento sono quella dei servizi sanitari (Prestazioni urgenti e prelievi, Ambulatorio dei medici di Medicina generale, Continuità assistenziale, Ambulatorio infermieristico, Attività specialistiche e Tecnologie diagnostiche), dei servizi socio-sanitari (Serd, Salute mentale, Neuropsichiatria infantile e Psicologia, Recupero e riabilitazione funzionale, Assistenza domiciliare integrata -ADI-, Prevenzione, Consultorio familiare e Unità di valutazione multidimensionale -UVMD-) e dei servizi sociali (Uffici per il servizio sociale/volontariato, Attività amministrative e Tecnologie informatiche).

A seguito degli interventi i servizi e le attività specialistiche che si prevedono di attivare nelle quattro Case di Comunità sono i seguenti:

Tabella n. 1 – Servizi e attività specialistiche da attivare

Specialità/Servizio	Casa di Comunità Morgex	Casa di Comunità Aosta	Casa di Comunità Chatillon	Casa di Comunità Donnas
Cardiologia	X	X	X	X
Chirurgia Generale	X	X	X	X
Chirurgia Vascolare	X	X	X	X
Chirurgia Toracica	X	X	X	X
Dermatologia	X	X	X	X
Dietologia Endocr/Diabetologia	X	X	X	X
Geriatrica	X	X	X	X
Urologia	X	X	X	X
Neurologia	X	X	X	X
Neuropsich. Infantile	X		X	X
Medicina legale		X	X	
Oculistica	X	X	X	X
Odontostomatologia		X		X
Ortopedia	X	X	X	X
Ostetricia Ginecologia	X	X	X	X
Otorinolaringoiatria	X	X	X	X
Pneumologia	X	X	X	X
SERD		X	X	X
Psichiatria	X		X	X
MMG	X	X	X	X
POLS	X	X	X	X
Continuità assistenz.	X	X	X	X
Sede 118	X			X
Punto prelievi	X	X	X	X
COT		X		
USCA		X		
Psicologia	X	X	X	X
Sportello sociale	X		X	X
ADI	X	X	X	X
IFeC Ambulatorio inf.	X	X	X	X
Palestra fisioterapia	X		X	X
Logopedia	X		X	X
Centro trasfusionale				X
Prevenzione	X		X	X
Amministrativi	X	X	X	X
CUP/SR	X	X	X	X
DIAGNOSTICA				
Ecografia	X	X	X	X
TAC				X
Mammografia				X
RNM articolare				X
Radiologico tradiz.	X			X

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati Azienda USL Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

Inoltre, dal Documento generale di programmazione dell'assistenza territoriale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM Salute del 23 maggio 2022, n. 77, precedentemente menzionato, il modello organizzativo di Case della Comunità avrà le seguenti caratteristiche²²:

“La Casa della Comunità è un presidio del Distretto, il cui coordinamento è affidato ad un responsabile organizzativo.

La Casa della Comunità promuove un modello di intervento integrato e multidisciplinare, in qualità di sede privilegiata per la progettazione e l'erogazione di interventi sanitari, sociosanitari e sociali. L'attività, infatti, deve essere organizzata in modo tale da permettere un'azione d'équipe tra i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, gli Specialisti Ambulatoriali Interni, anche nelle loro forme organizzative, gli Specialisti ospedalieri, gli Infermieri e Infermieri di Famiglia o Comunità e altri professionisti della salute (Psicologi, Professionisti dell'area prevenzione e della riabilitazione, assistenti sociali).

La Casa della Comunità rappresenta, per i medici e i professionisti convenzionati, un'importante opportunità di sviluppo professionale, poiché offre la possibilità di lavorare in maniera integrata a garanzia di una risposta ai bisogni della popolazione, della presa in carico delle persone affetta da patologie croniche e, più in generale, delle persone fragili nell'ambito di specifici programmi e percorsi assistenziali.

Coerentemente con il PSBS, si prevede di garantire l'assistenza h 24, 7 giorni su 7 mediante le Case della Comunità ad alta complessità (Hub) che saranno dotate di tutti i servizi come obbligatori dal DM 77/2022, mentre il ruolo delle Case della Comunità Spoke sarà garantito tramite le Case della Comunità a media complessità (h 12, 7 giorni su 7).

²²Allegato A) alla d.g.r. 22 dicembre 2022, n. 1609 “Approvazione del Documento generale di programmazione dell'assistenza territoriale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero della salute del 23 maggio 2022, n. 77 e deli Atti di programmazione volti a istituire le Associazioni funzionali territoriali (AFT) dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS), nonché delle Unità complesse di cure primari (UCCP), ai sensi degli Accordi collettivi nazionali vigenti della medicina convenzionata. Revoca dell'allegato A della d.g.r. 1304/2008”.

Servizi	Modello Organizzativo	
	Casa della Comunità <i>hub</i>	Casa della Comunità <i>spoke</i>
Servizi di cure primarie erogati attraverso équipe multiprofessionali (MMG, PLS, SAI, IFoC, ecc.)	OBBLIGATORIO	
Punto Unico di Accesso	OBBLIGATORIO	
Servizio di assistenza domiciliare	OBBLIGATORIO	
Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza	OBBLIGATORIO	
Servizi infermieristici	OBBLIGATORIO	
Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale	OBBLIGATORIO	
Integrazione con i Servizi Sociali	OBBLIGATORIO	
Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione	OBBLIGATORIO	
Collegamento con la Casa della Comunità <i>hub</i> di riferimento	-	OBBLIGATORIO
Presenza medica	OBBLIGATORIO H24, 7/7 gg	OBBLIGATORIO H12, 7/7 gg
Presenza infermieristica	OBBLIGATORIO H12, 7/7 gg	OBBLIGATORIO H12, 6/7 gg
	FORTEMENTE RACCOMANDATO H24, 7/7 gg	
Servizi diagnostici di base	OBBLIGATORIO	FACOLTATIVO
Continuità Assistenziale	OBBLIGATORIO	FACOLTATIVO
Punto prelievi	OBBLIGATORIO	FACOLTATIVO
Attività consultoriali e attività rivolta ai minori	FACOLTATIVO	FACOLTATIVO
Interventi di salute pubblica (incluse le vaccinazioni per la fascia 0-18)	FACOLTATIVO	FACOLTATIVO
Programmi di screening	OBBLIGATORIO	FACOLTATIVO
Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza	RACCOMANDATO	
Medicina dello sport	RACCOMANDATO	

A partire dall'attuale modello organizzativo dell'offerta assistenziale, capillare e a livelli diversi di intensità, il modello di organizzazione previsto dall'attuale atto nel mantenere invariati gli attuali punti di erogazione ne qualifica l'offerta attraverso un'integrazione funzionale per setting assistenziali prevedendo la necessaria integrazione con ambiti attualmente distinti quali quello sociale, quello rappresentativo dei portatori di interesse e quello relativo alle attività di empowerment. La denominazione di Casa della Comunità anche per i punti erogativi già esistenti, seppure non rappresentando, questi, i criteri strettamente previsti dal DM 77, ha un preciso intento che è quello di rappresentare ai cittadini un modello innovativo rispetto alle logiche di offerta dei servizi esistenti e, soprattutto, collegato in rete per garantire una presa in carico realmente integrata rispetto al bisogno espresso.

Un successivo atto definirà, per singola Casa della Comunità, i livelli di servizi minimi garantiti stante, sia quelli già esistenti, sia quelli di nuova o rinnovata funzionalità.

Pertanto, alle Case della Comunità a media e alta complessità si affiancano, in ciascun Distretto, almeno 4 Case della comunità a bassa complessità, in cui viene garantito l'accesso alle seguenti funzioni 6 giorni su 7 con orario non inferiore a 5 ore/die:

- accoglienza e orientamento (punto informativo);*
- amministrativa (Centro Unico di Prenotazione);*
- valutazione del bisogno;*
- assistenza del medico di medicina generale;*
- assistenza del pediatra di libera scelta;*
- assistenza infermieristica (ambulatorio continuità dell'assistenza e ambulatorio infermieristico per la gestione integrata della cronicità);*
- assistenza specialistica a supporto dei percorsi;*
- assistenza sociale.*

Nella nuova riorganizzazione e riqualificazione dell'area di assistenza territoriale distrettuale è pertanto prevista:

- Nel Distretto 1:*

Casa della Comunità di Morgex (H12) a media complessità (Spoke)

Casa della Comunità di Aosta (H24) ad alta complessità (Hub)

- Nel Distretto 2:

Casa della Comunità di Donnas (H24) ad alta complessità (Hub)

Casa della Comunità di Chatillon (H12) a bassa complessità (Spoke)

Case della comunità a bassa complessità di Nus, di Verres, di Valtournenche, di Brusson e di Gaby.

Il modello organizzativo individuato, nel rispettare l'indicazione di 1 Casa della Comunità Hub ogni 40.000-50.000 abitanti prevista dal DM 77/2022, è articolato su tre livelli di complessità al fine di garantire una più capillare diffusione delle strutture sul territorio."

A fronte di tali indirizzi sono stati realizzati gli interventi delle quattro case di Comunità della Valle d'Aosta.

Nei paragrafi che seguono, per ciascuna Casa di Comunità, verrà illustrato il relativo stato di attuazione così come verificato, alla data del 21 luglio 2025, dai dati estratti dalla Banca dati Re.GIS e dall'aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi comunicato dall'Azienda USL, a questa Sezione in sede di istruttoria²³, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto²⁴.

La Banca dati Re.GIS è in continuo aggiornamento, pertanto, per rendere plausibile un confronto con i dati dell'Azienda USL è stata necessaria l'individuazione di una data precisa.

²³ Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nota 15 luglio 2025, prot. n. 847.

²⁴ Azienda USL della Valle d'Aosta, Relazione Responsabile Unico del Procedimento, nota 22 luglio 2025, ns. prot. n. 979.

2.2 Casa di Comunità di Aosta

Soggetto titolare: Ministero della salute

Soggetto attuatore: Assessorato sanità, salute e politiche sociali

Dipartimento: Sanità e salute

Struttura: Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari

Soggetto attuatore delegato: Azienda USL Valle d'Aosta

Piano: PNRR M6 Salute, C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale

Investimento: 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

CUP: B67H22001650006

Importo finanziamento: euro 516.176,00


Data inizio: 21 febbraio 2022

Data fine: 31 marzo 2026 Case della comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche

Dettaglio intervento: L'intervento riguarda la ristrutturazione di due edifici di proprietà dell'Azienda USL Valle d'Aosta, ad Aosta, in Via Guido Rey, nn. 1 e 3.

Avanzamento economico e finanziario dell'intervento:

Grafico n. 1 – Avanzamento economico e finanziario Casa di Comunità Aosta

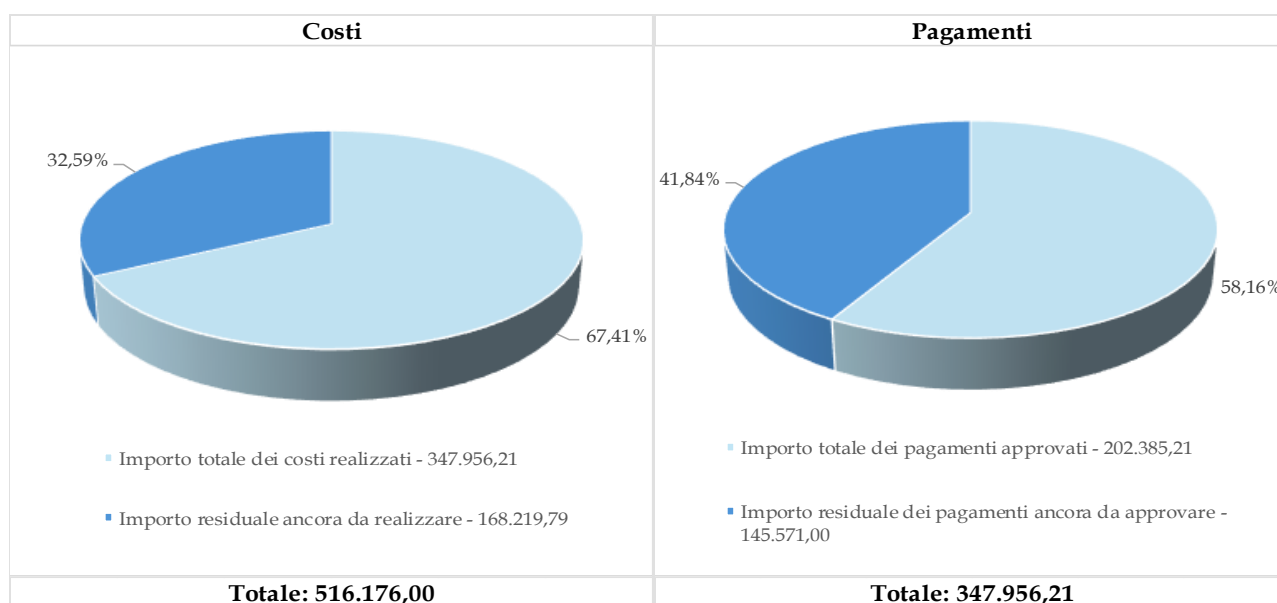

Fonte: Rielaborazione Corte dei Conti su Banca dati Re.GIS

Importo tot. dei costi realizzati: euro **347.956,21**, pari al 67,41 per cento
 Importo res. dei costi ancora da realizzare euro 168.219,79, pari al 32,59 per cento
 Totale euro 516.176,00

Importo tot. dei pagamenti approvati: euro 202.385,21, pari al 58,16 per cento
 Importo res. dei pagamenti da approvare: euro 145.571,00, pari al 41,84 per cento
 Totale euro **347.956,21**

Fase in realizzazione: Collaudo

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizi...	Data Fine ...	Data Inizi...	Data Fine ...
00301 STUDIO DI FATTIBILITÀ			09/01/2023	23/02/2023	09/01/2023	23/02/2023
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA			31/03/2023	29/06/2023	31/03/2023	29/06/2023
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			01/07/2023	31/08/2023	01/07/2023	31/08/2023
00311 AGGIUDICAZIONE	➤		31/08/2023	19/09/2023	31/08/2023	19/09/2023
00312 STIPULA CONTRATTO	➤		01/08/2023	31/12/2023	01/09/2023	19/09/2023
00313 ESECUZIONE LAVORI	➤		30/10/2023	31/01/2026	30/10/2023	16/05/2025
00314 COLLAUDO	➤		01/02/2026	28/02/2026		

Fonte: Estrazione fasi procedurali in Banca dati Re.GIS

Nel dettaglio, risulta che in data 24 novembre 2022, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 989²⁵, veniva indetta la gara per lo Studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'opera.

²⁵ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 24 novembre 2022, n. 989 "PNRR – Missione 6 Salute – M6.C1. 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Indizione di gara per lo studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della Casa di Comunità di Aosta – CUP B67H2200165006".

Successivamente, in data 14 dicembre 2022, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 1055²⁶, veniva aggiudicato l'affidamento del servizio per lo Studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'opera, per l'importo di euro 45.872,99, oneri compresi, IVA esente.

In data 29 giugno 2023, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 618²⁷, veniva approvato il Progetto esecutivo e indetta la gara con il sistema della procedura negoziata per la realizzazione dei lavori.

Seguiva, in data 11 settembre 2023, determinazione dirigenziale n. 837²⁸, con la quale veniva approvato l'affidamento dei lavori per l'importo di euro 318.587,28, oneri inclusi, IVA esclusa, secondo il Quadro economico aggiornato per effetto del ribasso d'asta, che è il seguente:

Tabella n. 2 – Quadro economico Casa di Comunità Aosta

CASA DI COMUNITA' DI AOSTA		
Importo lavori		282.641,56
Oneri sicurezza		31.945,72
Oneri di scarica		4.000,00
Imponibile		318.587,28
Iva 22%		70.089,20
Totale		388.676,48
Imprevisti 5%		19.433,82
Somme a disposizione		59.717,78
Incentivi Funzioni Tecniche		6.582,24
Totale		474.410,33
Incentivi funzioni tecniche		
Quota incentivo funzioni tecniche	2,0%	6.582,24
Destinazione a fondo art. 3 80 %	5.265,80	
RUP	37%	1.948,34
Redattore CSA e disciplinare parte amministrativa	6%	315,95
Supporto RUP	4%	210,63
Incentivo effettivamente disponibile		2.474,92
Totale quadro economico		470.303,01

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati Azienda USL Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

²⁶ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta n. 1055 del 14 dicembre 2022 "PNRR – Missione 6 Salute – M6.C1. 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Aggiudicazione dell'affidamento del servizio per lo studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della Casa di Comunità di Aosta – CUP B67H2200165006 – CIG 95110438F8".

²⁷ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 29 giugno 2023, n. 618 "PNRR - Missione 6 salute - M6.C1. 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione dei progetti esecutivi e indizione di gara per la realizzazione della Casa di comunità di Chatillon - Morgex - Donnas e Aosta (CUP: B57H22000970006 - B27H22000740006 - B87H22001270006 - B64H22001650006)".

²⁸ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 11 settembre 2023, n. 837 "PNRR- Missione 6 Salute - M6.C1. 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione dell'affidamento dei lavori per la realizzazione delle Case di comunità di - Morgex - Donnas e Aosta (CUP: B27H22000740006 - B87H22001270006 - B64H22001650006)".

In data 19 settembre 2023 l'Azienda USL sottoscriveva il contratto per l'esecuzione dei lavori²⁹.

In data 30 ottobre 2023 venivano consegnati i lavori alla ditta affidataria³⁰, con termine di conclusione stabilito in 320 giorni e ultimazione lavori al 14 settembre 2024.

L'Azienda USL ha poi riferito, nella propria comunicazione precedentemente menzionata³¹, che i lavori si sono conclusi in data 16 maggio 2025.

Da quanto illustrato consegue che, dell'importo complessivo finanziato di euro 516.176,00, risulta, dalla Banca dati Re.GIS, un avanzamento economico e finanziario come dal grafico n. 1.

In particolare, rispetto al totale dei costi, quelli sino ad ora realizzati, sono di euro 347.956,21, pari al 67,41 per cento, e l'importo residuo dei costi ancora da realizzare è di euro 168.219,79, pari al 32,59 per cento. In tale residuo sono ricomprese le economie conseguenti ai ribassi d'asta.

Rispetto al totale dei costi realizzati, risultano pagamenti approvati dal Ministero di euro 202.385,21, pari al 58,16 per cento, ed un residuo di pagamenti da approvare di euro 145.571,00, pari al 41,84 per cento.

Nello specifico, dei 347.956,21 euro di costi realizzati, euro 30.820,46 riguardano la progettazione, euro 12.572,30 la Direzione lavori ed euro 304.563,45 i lavori di realizzazione dell'opera.

L'Azienda USL nella propria nota del luglio 2025 aggiornata ad agosto 2025 (v. prospetto che segue), in merito alla rendicontazione, ha riferito un totale pagamenti di euro 433.168,82, di cui euro 347.956,21 già liquidati dal Ministero ed euro 85.212,61 da rendicontare.

²⁹ Regione Valle d'Aosta, Presidenza della Regione, nota 12 febbraio 2024, ns. prot. n. 214.

³⁰ Processo verbale di consegna dei lavori del 30 ottobre 2023.

³¹ Azienda USL della Valle d'Aosta, Relazione Responsabile Unico del Procedimento, nota 22 luglio 2025, ns. prot. n. 979.

Importo	Stato	Riferimento spese inserite
94.837,07 €	Liquidati dal Ministero	Lavori
30.820,46€	Liquidati dal Ministero	Progettazione
76.727,68€	Liquidati dal Ministero	Lavori
12.572,30	Liquidati dal Ministero	Spese tecniche
79.065,44€	Liquidati dal Ministero	Lavori
53.933,26€	Liquidati dal Ministero	Lavori
85.212,61€	Da Rendicontare	Lavori
Totale pagamenti		433.168,82 €

Fonte: Azienda USL Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

Raffrontando i dati estratti da Re.GIS con quelli riferiti dall'USL risulta una sostanziale coincidenza. In merito alla progettazione e alla direzione lavori, i costi e i pagamenti liquidati dal Ministero coincidono. Riguardo ai lavori che l'USL indica come "Liquidati dal Ministero" (euro 304.563,45) coincidono con i pagamenti approvati e ancora da approvare secondo i dati estratti da Re.GIS. In ogni caso, dalla banca dati risultano documentati i pagamenti a cui si riferisce l'USL, mancando, invece, quelli da rendicontare. Nel complesso, relativamente ai lavori, a fronte di un totale appaltato di euro 474.410,33 (v. tabella n. 2), sono stati riferiti pagamenti per euro 389.776,06, in parte liquidati dal Ministero, in parte ancora da liquidare ed in parte ancora da rendicontare.

Quanto alle fasi di realizzazione, da quanto reperito con le estrazioni e i dati inseriti in Re.GIS e dall'informativa dell'Azienda USL, si evince un avanzamento, allo stato, individuato nel Collaudo. In ogni caso, considerata la tempistica di completamento dell'opera al 28 febbraio 2026, le scadenze previste sono rispettate (Fine collaudo al 28 febbraio 2026 - v. Prospetto "Fase in realizzazione").

In sede di contraddittorio, l'Azienda USL ha riferito di non avere osservazioni in merito ai contenuti e all'esito del controllo³², mentre la Regione³³ ha puntualizzato:

"Casa della Comunità di Aosta – CUP B67H22001650006

- a) pagina 25: la data inizio effettiva, come da fase procedurale caricata sul sistema ReGis, risulta essere il 9 gennaio 2023".

In merito si osserva che a pagina 25 della Relazione non si parla di "data inizio effettiva".

³² Azienda USL della Valle d'Aosta, Direttore Generale, nota 19 settembre 2025, ns. prot. n. 1139.

³³ Regione Valle d'Aosta, Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, nota 25 settembre 2025, ns. prot. n. 1144.

2.3 Casa di Comunità di Chatillon

Soggetto titolare: Ministero della salute

Soggetto attuatore: Assessorato sanità, salute e politiche sociali

Dipartimento: Sanità e salute

Struttura: Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari

Soggetto attuatore delegato: Azienda USL Valle d'Aosta

Piano: PNRR M6 Salute, C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale

Investimento: 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

CUP: B57H22000970006

Importo finanziamento: euro 820.572,00


Data inizio: 21 febbraio 2022

Data fine: 31 marzo 2026 Case della comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche

Dettaglio Intervento: L'intervento riguarda la **ristrutturazione Poliambulatorio di Châtillon**, in via Pellissier 19, di proprietà dell'Azienda USL Valle d'Aosta.

Avanzamento economico e finanziario dell'intervento:

Grafico n. 2 – Avanzamento economico e finanziario Casa di Comunità Chatillon

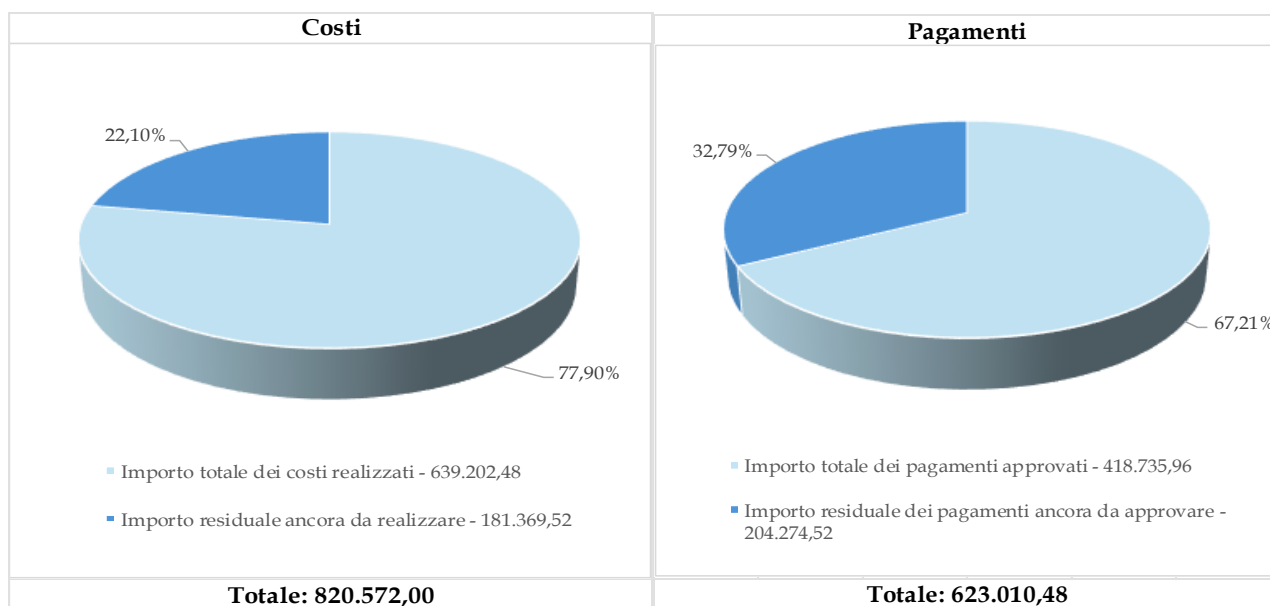

Fonte: Rielaborazione Corte dei Conti su Banca dati Re.GIS

Importo tot. dei costi realizzati: euro **639.202,48**, pari al 77,90 per cento
 Importo res. dei costi ancora da realizzare euro 181.369,52, pari al 22,10 per cento
 Totale euro 820.572,00

Importo tot. dei pagamenti approvati: euro 418.735,96, pari al 67,21 per cento
 Importo res. dei pagamenti da approvare: euro 204.274,52, pari al 32,79 per cento
 Totale euro **623.010,48**

Fase in realizzazione: Aggiudicazione

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizi...	Data Fine ...	Data Inizi...	Data Fine ...
00301 STUDIO DI FATTIBILITÀ			27/01/2023	26/02/2023	27/01/2023	28/02/2023
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA			31/03/2023	29/06/2023	31/03/2023	29/06/2023
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			01/07/2023	31/08/2023	01/07/2023	31/08/2023
00311 AGGIUDICAZIONE	➔		12/12/2022	31/01/2026	12/12/2022	
00312 STIPULA CONTRATTO	➔		12/09/2023	31/12/2023	22/09/2023	29/09/2023
00313 ESECUZIONE LAVORI	➔		10/01/2024	31/01/2026	05/02/2024	
00314 COLLAUDO	➔		01/02/2026	28/02/2026		

Fonte: Estrazione fasi procedurali in Banca dati Re.GIS

Nel dettaglio, risulta che in data 5 dicembre 2022, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 1021³⁴, veniva indetta la gara per lo Studio di fattibilità, progettazione esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'opera.

Successivamente, in data 5 gennaio 2023, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 29³⁵, veniva aggiudicato l'affidamento del servizio per lo Studio di fattibilità, progettazione esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase

³⁴ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta n. 1021 del 5 dicembre 2022 "PNRR – Missione 6 Salute – M6.C1. 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Indizione di gara per lo studio di fattibilità, progettazione esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della Casa di Comunità di Chatillon – CUP B57H22000970006".

³⁵ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta n. 29 del 5 gennaio 2023 "PNRR – Missione 6 Salute – M6.C1. 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Aggiudicazione dell'affidamento del servizio per lo studio di fattibilità, progettazione esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della Casa di Comunità di Chatillon – CUP B57H22000970006 – CIG 9539838B5A".

di esecuzione per la realizzazione dell'opera per l'importo di euro 35.954,12, oneri ed IVA compresi.

In data 29 giugno 2023, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 618³⁶, veniva approvato il Progetto esecutivo e indetta la gara con il sistema della procedura negoziata per la realizzazione dei lavori.

Seguiva, in data 22 settembre 2023 determinazione dirigenziale n. 865³⁷, con la quale veniva approvato l'affidamento dei lavori per l'importo di euro 549.733,04, oneri inclusi, IVA esclusa, secondo il Quadro economico aggiornato per effetto del ribasso d'asta, che è il seguente:

Tabella n. 3 - Quadro economico Casa di Comunità Chatillon

CASA DI COMUNITA' DI CHATILLON		
Importo lavori		525.056,26
Oneri sicurezza		5.000,00
Opere in economia		15.000,00
Oneri di discarica		4.676,78
Imponibile		549.733,04
Iva 22%		120.941,27
Totale		670.674,31
Imprevisti 5%		33.533,72
Somme a disposizione		29.416,56
DIREZIONE LAVORI		46.664,78
Incentivi Funzioni Tecniche		11.509,34
Totale		791.798,71
Incentivi funzioni tecniche		
Quota incentivo funzioni tecniche	2,0%	11.509,34
Destinazione a fondo art. 3		
80%	9.207,48	
RUP	37%	3.406,77
Redattore CSA e disciplinare parte amministrativa	6%	552,45
Supporto RUP	4%	368,30
Incentivo effettivamente disponibile		4.327,51
Totale quadro economico		784.616,88

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati Azienda USL Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

³⁶ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 29 giugno 2023, n. 618 "PNRR - Missione 6 salute - M6.C1. 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione dei progetti esecutivi e indizione di gara per la realizzazione della Casa di comunità di Chatillon - Morgex - Donnas e Aosta (CUP: B57H22000970006 - B27H22000740006 - B87H22001270006 - B64H22001650006)".

³⁷ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 22 settembre 2023, n. 865 "PNRR- Missione 6 Salute - M6.C1. 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione dell'affidamento dei lavori per la realizzazione della Casa di comunità di Chatillon (CUP: B57H22000970006)".

In data 27 settembre 2023, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 879³⁸, veniva aggiudicato l'affidamento della Direzione lavori per la realizzazione dell'opera, per l'importo di euro 36.778,68, oneri e IVA esclusi.

In data 29 settembre 2023 l'Azienda USL sottoscriveva il contratto per l'esecuzione dei lavori³⁹.

In data 5 febbraio 2024 venivano consegnati i lavori alla ditta affidataria⁴⁰, con termine di conclusione stabilito in 290 giorni e ultimazione lavori al 21 novembre 2024

L'Azienda USL ha poi riferito, nella propria comunicazione precedentemente menzionata⁴¹, che i lavori si sono conclusi in data 11 luglio 2025.

Da quanto illustrato consegue che, dell'importo complessivo finanziato di euro 820.572,00, risulta, dalla Banca dati Re.GIS, un avanzamento economico e finanziario come dal grafico n. 2.

In particolare, rispetto al totale dei costi, quelli sino ad ora realizzati, sono di euro 639.202,48, pari al 77,90 per cento, e l'importo residuo dei costi ancora da realizzare è di euro 181.369,52, pari al 22,10 per cento. In tale residuo sono ricomprese le economie dovute ai ribassi d'asta.

Quanto all'avanzamento finanziario, risultano pagamenti approvati dal Ministero di euro 418.735,96, pari al 67,21 per cento, ed un residuo di pagamenti da approvare di euro 204.274,52, pari al 32,79 per cento.

Rispetto al totale di costi realizzati di euro 639.202,48, il totale dei pagamenti approvati e da approvare è di euro 623.010,48, con una differenza di euro 16.192,00.

Nello specifico, dei 623.010,48 euro di pagamenti approvati, euro 20.503,67 riguardano la progettazione, euro 26.398,52 la Direzione lavori ed euro 576.108,29 i lavori di realizzazione dell'opera.

L'Azienda USL, nella propria nota del luglio 2025 (v. il prospetto che segue), in merito alla rendicontazione, ha riferito un totale pagamenti liquidati dal Ministero di euro 623.010,48.

³⁸ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta n. 879 del 27 settembre 2023 "PNRR – Missione 6 Salute – M6.C1. 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Aggiudicazione della direzione lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Chatillon – CUP B57H22000970006 – CIG A00CE6641E".

³⁹ Regione Valle d'Aosta, Presidenza della Regione, nota 12 febbraio 2024, ns. prot. n. 214.

⁴⁰ Processo verbale di consegna dei lavori del 5 febbraio 2024.

⁴¹ Azienda USL della Valle d'Aosta, Relazione Responsabile Unico del Procedimento, nota 22 luglio 2025, ns. prot. n. 979.

Importo	Stato	Riferimento spese inserite
20.503,67 €	Liquidati dal Ministero	Progettazione
201.202,29 €	Liquidati dal Ministero	Lavori
109.190,00 €	Liquidati dal Ministero	Lavori
26.398,52 €	Liquidati dal Ministero	DL
87.840,00 €	Liquidati dal Ministero	Lavori
89.792,00 €	Liquidati dal Ministero	Lavori
88.084,00 €	Liquidati dal Ministero	Lavori
Totale pagamenti		623.010,48 €

Fonte: Azienda USL Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

Raffrontando i dati estratti da Re.GIS con quelli riferiti dall'USL risulta una sostanziale coincidenza, con la precisazione che parte degli importi liquidati dal Ministero secondo l'USL risultano in Re.GIS come pagamenti ancora da approvare (euro 204.274,52).

Nel complesso, relativamente ai lavori, a fronte di un totale appaltato di euro 791.798,71 (v. tabella n. 3), sono stati riferiti pagamenti per euro 623.010,48, in parte liquidati dal Ministero e in parte ancora da liquidare.

Quanto alle fasi di realizzazione, da quanto reperito con le estrazioni e i dati inseriti in Re.GIS, si evince un avanzamento, allo stato, individuato nell'aggiudicazione e, quindi, nel completamento dei lavori che, a dire dell'USL, sono stati ultimati l'11 luglio 2025. In ogni caso, considerata la tempistica di completamento dell'opera al 28 febbraio 2026, le scadenze previste sono rispettate (Fine esecuzione lavori al 31 gennaio 2026; Fine collaudo al 28 febbraio 2026 - v. Prospetto "Fase in realizzazione").

In sede di contraddittorio, l'Azienda USL ha riferito di non avere osservazioni in merito ai contenuti e all'esito del controllo⁴², mentre la Regione⁴³ ha puntualizzato:

"Casa della Comunità di Chatillon – CUP B57H22000970006

- a) pagina 30: la data inizio effettiva, come da fase procedurale caricata sul sistema ReGis, risulta essere il 12 dicembre 2022;
- b) pagine 30 e 33: l'importo complessivo del progetto risulta essere pari ad euro 820.571,00;
- c) pagina 45: il verbale di accertamento effettivo di fine lavori è stato implementato sul sistema ReGis in data 26 agosto 2025".

Al riguardo si osserva che nelle pagine menzionate non si parla di quanto indicato dalla Regione che vorrà, nel merito, confrontarsi con l'Azienda USL che, diversamente, ha confermato i dati.

⁴² Azienda USL della Valle d'Aosta, Direttore Generale, nota 19 settembre 2025, ns. prot. n. 1139.

⁴³ Regione Valle d'Aosta, Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, nota 25 settembre 2025, ns. prot. n. 1144.

2.4 Casa di Comunità di Donnas

Soggetto titolare: Ministero della salute

Soggetto attuatore: Assessorato sanità, salute e politiche sociali

Dipartimento: Sanità e salute

Struttura: Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari

Soggetto attuatore delegato: Azienda USL Valle d'Aosta

Piano: PNRR M6 Salute, C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale

Investimento: 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

CUP: B87H22001270006

Importo finanziamento: euro 1.303.118,00


Data inizio: 21 febbraio 2022

Data fine: 31 marzo 2026 Case della comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche

Dettaglio Intervento: L'intervento riguarda la **ristrutturazione del Poliambulatorio di Donnas**, in via Roma 105, di proprietà dell'Azienda USL Valle d'Aosta.

Avanzamento economico e finanziario dell'intervento:

Grafico n. 3 - Avanzamento economico e finanziario Casa di Comunità Donnas

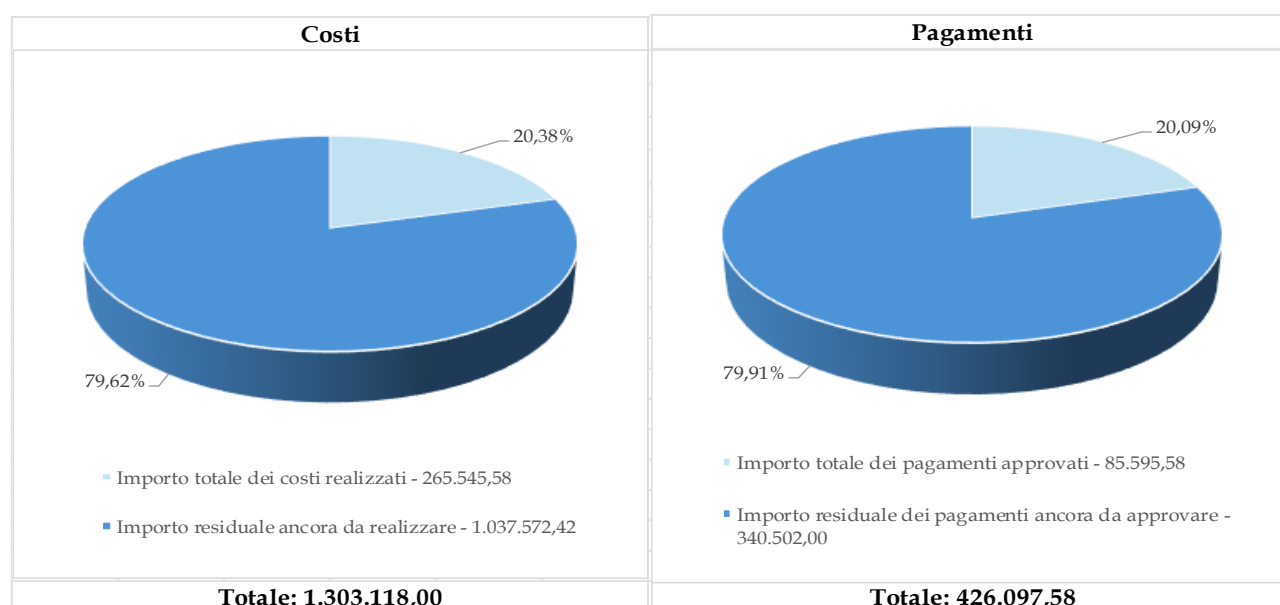

Fonte: Rielaborazione Corte dei Conti su Banca dati Re.GIS

Importo tot. dei costi realizzati:	euro 265.545,58 , pari al 20,38 per cento
Importo res. dei costi ancora da realizzare	<u>euro 1.037.572,42</u> , pari al 79,62 per cento
Totale	euro 1.303.118,00

Importo tot. dei pagamenti approvati:	euro 85.595,58, pari al 20,09 per cento
Importo res. dei pagamenti da approvare:	<u>euro 340.502,00</u> , pari al 79,91 per cento
Totale	euro 426.097,58

Fase in realizzazione: Aggiudicazione

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizi...	Data Fine ...	Data Inizi...	Data Fine ...
00301 STUDIO DI FATTIBILITÀ			27/02/2023	13/04/2023	27/02/2023	13/04/2023
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA			28/04/2023	29/06/2023	28/04/2023	29/06/2023
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			01/07/2023	31/08/2023	01/07/2023	31/08/2023
00311 AGGIUDICAZIONE	➔		08/02/2023	31/01/2026	08/02/2023	
00312 STIPULA CONTRATTO	➔		01/08/2023	31/12/2023	01/09/2023	19/09/2023
00313 ESECUZIONE LAVORI	➔		10/01/2024	31/01/2026	05/02/2024	
00314 COLLAUDO	➔		01/02/2026	28/02/2026		

Fonte: Estrazione fasi procedurali in Banca dati Re.GIS

Nel dettaglio, in data 9 giugno 2022, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 539⁴⁴, l'Azienda USL aderiva alla Centrale di committenza INVITALIA per l'affidamento di servizi tecnici per alcuni interventi ricadenti nella Missione 6 Salute del P.N.R.R., tra i quali la Casa di Comunità di Donnas.

In data 4 gennaio 2023 Invitalia comunicava alla SC Tecnico dell'Azienda USL Valle d'Aosta l'affidamento dell'accordo quadro e, conseguentemente, la Struttura aziendale provvedeva a contattare i progettisti per l'emissione dell'ODA (ordine diretto di acquisto⁴⁵);

In data 10 febbraio 2023 con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 137⁴⁶ veniva affidato il servizio per lo Studio di fattibilità,

⁴⁴ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta n. 539 del 9 giugno 2022 "Determina e autorizzazione a contrarre tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione 6 Salute del PNRR, cofinanziata dal PNC, di propria competenza - CUP B87H2200127006 - CUP B61B21006690006".

⁴⁵ Azienda USL della Valle d'Aosta, nota 6 giugno 2023, ns. prot. n. 736.

⁴⁶ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta n. 137 del 10 febbraio 2023 "PNRR - Missione 6 Salute - M6.C1. 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Affidamento del servizio per lo studio di fattibilità,

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'opera, per l'importo di euro 130.009,92, oltre oneri ed IVA.

In data 29 giugno 2023, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 618⁴⁷, veniva approvato il Progetto esecutivo e indetta la gara con il sistema della procedura negoziata per la realizzazione dei lavori.

Seguiva, in data 11 settembre 2023 determinazione dirigenziale n. 837⁴⁸, con la quale veniva approvato l'affidamento dei lavori per l'importo di euro 655.907,14, oneri inclusi, IVA esclusa, secondo il Quadro economico aggiornato per effetto del ribasso d'asta, che è il seguente:

Tabella n. 4 – Quadro economico Casa di Comunità Donnas

CASA DI COMUNITA' DI DONNAS		
Importo lavori		634.667,70
Oneri sicurezza		16.239,44
Oneri di scarica		5.000,00
Imponibile		655.907,14
Iva 22%		144.299,57
Totale		800.206,72
Imprevisti 5%		40.010,34
Somme a disposizione		292.335,67
Incentivi Funzioni Tecniche		14.914,06
Totale		1.147.466,78
Incentivi funzioni tecniche		
Quota incentivo funzioni tecniche	2,0%	14.914,06
Destinazione a fondo art. 3		
80%	11.931,25	
RUP	37%	4.414,56
Redattore CSA e disciplinare parte amministrativa	6%	715,87
Supporto RUP	4%	477,25
Incentivo effettivamente disponibile		5.607,69
Totale quadro economico		1.138.160,41

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati Azienda USL Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della Casa di Comunità di Donnas – CUP B87H2200127006 – CIG 932620215C”.

⁴⁷ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 29 giugno 2023, n. 618 “PNRR - Missione 6 salute - M6.C1. 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione dei progetti esecutivi e indizione di gara per la realizzazione della Casa di comunità di Chatillon - Morgex - Donnas e Aosta (CUP: B57H22000970006 - B27H22000740006 - B87H22001270006 - B64H22001650006)”.

⁴⁸ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 11 settembre 2023, n. 837 “PNRR- Missione 6 Salute - M6.C1. 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione dell'affidamento dei lavori per la realizzazione delle Case di comunità di - Morgex - Donnas e Aosta (CUP: B27H22000740006 - B87H22001270006 - B64H22001650006)”.

In data 19 settembre 2023 l'Azienda USL sottoscriveva il contratto per l'esecuzione dei lavori⁴⁹.

In data 5 febbraio 2024 venivano consegnati i lavori alla ditta affidataria⁵⁰, con termine di conclusione stabilito in 300 giorni e ultimazione lavori al 1° dicembre 2024.

L'Azienda USL ha poi riferito, nella propria comunicazione precedentemente menzionata⁵¹, che i lavori si sono conclusi in data 3 giugno 2025.

Da quanto illustrato risulta che, dell'importo complessivo finanziato di euro 1.303.118,00, c'è stato un avanzamento economico e finanziario come dal grafico n. 3.

In particolare, rispetto al totale dei costi, quelli sino ad ora realizzati, sono di euro 265.545,58, pari al 20,38 per cento, e l'importo residuo dei costi ancora da realizzare è di euro 1.037.572,42, pari al 79,62 per cento. In tale residuo sono ricomprese le economie dovute ai ribassi d'asta.

Quanto all'avanzamento finanziario, risultano pagamenti approvati dal Ministero di euro 85.595,58, pari al 20,09 per cento, ed un residuo di pagamenti da approvare di euro 340.502,00, pari al 79,91 per cento.

Nello specifico, dei 426.097,58 euro di pagamenti approvati e da approvare, euro 85.595,58 riguardano la progettazione ed euro 340.502,00 i lavori di realizzazione dell'opera.

L'Azienda USL nella propria nota del luglio 2025 (v. il prospetto che segue), in merito alla rendicontazione, ha riferito un totale pagamenti di euro 656.921,58, di cui euro 426.097,58 in parte già liquidati dal Ministero e in parte al controllo dello stesso, ed euro 230.824,00 ancora da rendicontare.

Importo	Stato	Riferimento spese inserite
85.595,58	Liquidati dal Ministero	Progettazione
179.950,00	Liquidati dal Ministero	Lavori
160.552,00	Al controllo del Ministero	Lavori
230.824,00	Da rendicontare	Lavori

Totale pagamenti	656.921,58€
------------------	-------------

Fonte: Azienda USL Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

⁴⁹ Regione Valle d'Aosta, Presidenza della Regione, nota 12 febbraio 2024, ns. prot. n. 214.

⁵⁰ Processo verbale di consegna dei lavori del 5 febbraio 2024.

⁵¹ Azienda USL della Valle d'Aosta, Relazione Responsabile Unico del Procedimento, nota 22 luglio 2025, ns. prot. n. 979.

Raffrontando i dati estratti da Re.GIS con quelli referiti dall'USL risulta una sostanziale coincidenza. In merito alla progettazione costi e pagamenti liquidati dal Ministero coincidono. Riguardo ai lavori che l'USL indica come liquidati e al controllo del Ministero (euro 179.950,00 + 160.552,00 = 340.502,00) coincidono con i pagamenti ancora da approvare secondo i dati estratti da Re.GIS. In ogni caso dalla banca dati risultano documentati i pagamenti a cui si riferisce l'USL, mancando, invece, quelli da rendicontare. Nel complesso, relativamente ai lavori, a fronte di un totale appaltato di euro 1.147.466,78 (v. tabella n. 4), sono stati riferiti pagamenti per euro 571.326,00, in parte liquidati dal Ministero, in parte ancora da liquidare ed in parte ancora da rendicontare.

Quanto alle fasi di realizzazione, da quanto reperito con le estrazioni e i dati inseriti in Re.GIS, si evince un avanzamento, allo stato, individuato nell'aggiudicazione e, quindi, nella realizzazione dei lavori che, a dire dell'USL, sono stati terminati il 3 giugno 2025. In ogni caso, considerata la tempistica di completamento dell'opera al 28 febbraio 2026, le scadenze previste sono rispettate (Fine esecuzione lavori al 31 gennaio 2026; Fine collaudo al 28 febbraio 2026 - v. Prospetto "Fase in realizzazione").

In sede di contraddittorio, l'Azienda USL ha riferito di non avere osservazioni in merito ai contenuti e all'esito del controllo⁵², mentre la Regione⁵³ ha puntualizzato:

"Casa della Comunità di Donnas – CUP B87H22001270006

- a) pagina 35: la data inizio effettiva, come da fase procedurale caricata sul sistema ReGis, risulta essere l'8 febbraio 2023;
- b) pagine 35 e 38: l'importo complessivo del progetto risulta essere pari ad euro 1.303.117,00;
- c) pagine 35 e 39: si specifica che risultano complessivi euro 179.950,00 quale rendiconto avanzato all'Unità di Missione per la gestione dei progetti del PNRR-Missione 6 "Salute", in fase di istruttoria da parte del Ministero medesimo e ancora da approvare, e complessivi euro 160.552,00 quale rendiconto in stato "bozza" ancora da avanzare all'anzì menzionata Unità di Missione".

Al riguardo si osserva che nelle pagine menzionate non si parla di quanto indicato dalla Regione che vorrà, nel merito, confrontarsi con l'Azienda USL che, diversamente, ha confermato i dati.

⁵² Azienda USL della Valle d'Aosta, Direttore Generale, nota 19 settembre 2025, ns. prot. n. 1139.

⁵³ Regione Valle d'Aosta, Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, nota 25 settembre 2025, ns. prot. n. 1144.

2.5 Casa di Comunità di Morgex

Soggetto titolare: Ministero della salute

Soggetto attuatore: Assessorato sanità, salute e politiche sociali

Dipartimento: Sanità e salute

Struttura: Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari

Soggetto attuatore delegato: Azienda USL Valle d'Aosta

Piano: PNRR M6 Salute, C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale

Investimento: 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

CUP: B27H22000740006

Importo finanziamento: euro 850.166,00


Data inizio: 21 febbraio 2022

Data fine: 31 marzo 2026 Case della comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche

Dettaglio Intervento: L'intervento riguarda la **ristrutturazione del Poliambulatorio di Morgex**, in viale Lo Convento 5, di proprietà dell'Azienda USL Valle d'Aosta

Avanzamento economico e finanziario dell'intervento:

Grafico n. 4 – Avanzamento economico e finanziario Casa di Comunità Morgex

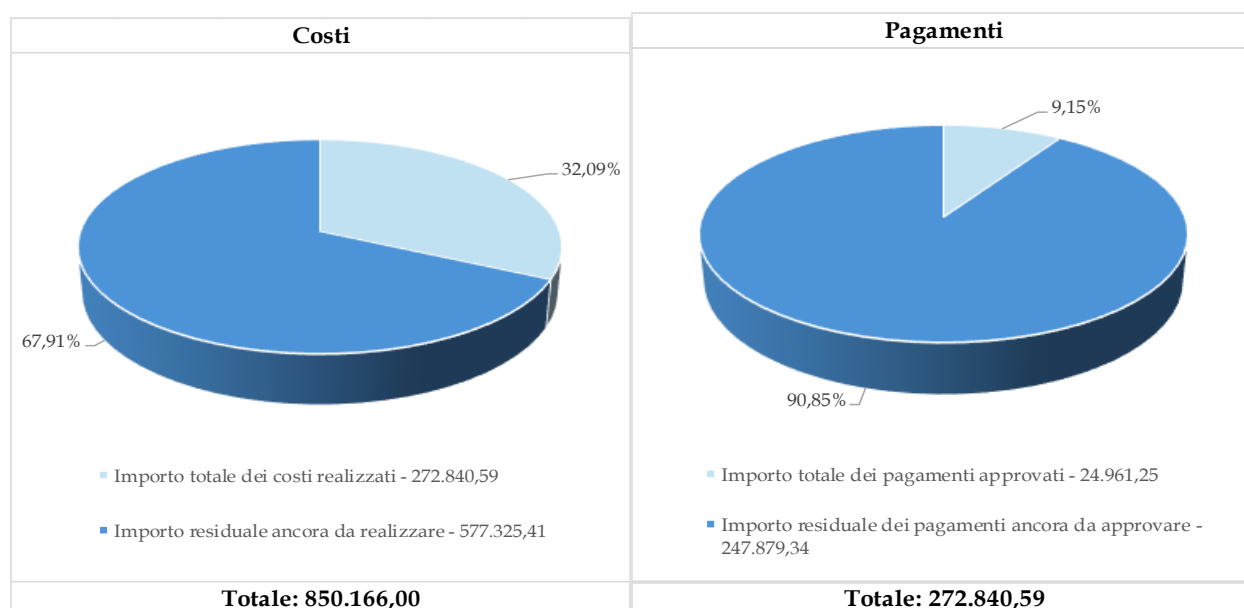

Fonte: Rielaborazione Corte dei Conti su Banca dati Re.GIS

Importo tot. dei costi realizzati: euro **272.840,59**, pari al 32,09 per cento
 Importo res. dei costi ancora da realizzare euro 577.325,41, pari al 67,91 per cento
 Totale euro 850.166,00

Importo tot. dei pagamenti approvati: euro 24.961,25, pari al 9,15 per cento
 Importo res. dei pagamenti da approvare: euro 247.879,34, pari al 90,85 per cento
 Totale euro **272.840,59**

Fase in realizzazione: Esecuzione lavori

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizi...	Data Fine ...	Data Inizi...	Data Fine ...
00301 STUDIO DI FATTIBILITÀ			14/02/2023	16/03/2023	14/02/2023	16/03/2023
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA			10/04/2023	29/06/2023	10/04/2023	29/06/2023
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA			01/07/2023	31/08/2023	01/07/2023	31/08/2023
00311 AGGIUDICAZIONE	➔		29/12/2022	31/01/2026	29/12/2022	12/09/2023
00312 STIPULA CONTRATTO	➔		13/09/2023	31/12/2023	13/09/2023	26/09/2023
00313 ESECUZIONE LAVORI	➔		01/08/2024	31/01/2026	29/08/2024	
00314 COLLAUDO	➔		01/02/2026	28/02/2026		

Fonte: Estrazione fasi procedurali in Banca dati Re.GIS

Nel dettaglio risulta che, in data 5 dicembre 2022, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 1020⁵⁴, veniva indetta la gara per lo Studio di fattibilità, progettazione esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'opera.

Successivamente, in data 19 gennaio 2023, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 80⁵⁵, veniva aggiudicato l'affidamento del servizio

⁵⁴ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 5 dicembre 2022, n. 1020 "PNRR – Missione 6 Salute – M6.C1. 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Indizione di gara per lo studio di fattibilità, progettazione esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della Casa di Comunità di Morgex – CUP B27H22000740006".

⁵⁵ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 19 gennaio 2023, n. 80 "PNRR – Missione 6 Salute – M6.C1. 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Aggiudicazione dell'affidamento del servizio per lo studio di fattibilità, progettazione esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della Casa di Comunità di Morgex – CUP B27H22000740006 – CIG 95786686E3".

per lo Studio di fattibilità, progettazione esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'opera, per l'importo di euro 38.403,75, oneri ed IVA compresi.

In data 29 giugno 2023, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 618⁵⁶, veniva approvato il Progetto esecutivo e indetta la gara con il sistema della procedura negoziata per la realizzazione dei lavori.

Seguiva, in data 11 settembre 2023 determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 837⁵⁷, con la quale veniva approvato l'affidamento dei lavori per l'importo di euro 453.273,20, oneri inclusi, IVA esclusa, secondo il Quadro economico aggiornato per effetto dei ribassi d'asta, che è il seguente:

Tabella n. 5 – Quadro economico Casa di Comunità Morgex

CASA DI COMUNITA' DI MORGEX		
Importo lavori		423.774,16
Oneri sicurezza		12.189,86
Oneri di scarica		8.531,00
Opere in economia		8.778,18
Imponibile		453.273,20
Iva 22%		99.720,10
Totale		552.993,31
Imprevisti 5%		27.649,67
Somme a disposizione		227.355,51
Incentivi Funzioni Tecniche		10.010,02
Totale		818.008,50
Incentivi funzioni tecniche		
Quota incentivo funzioni tecniche	2,0%	10.010,02
Destinazione a fondo art. 3		
80%	8.008,02	
RUP	37%	2.962,97
Redattore CSA e disciplinare parte amministrativa	6%	480,48
Supporto RUP	4%	320,32
Incentivo effettivamente disponibile		3.763,77
Totale quadro economico		811.762,25

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati Azienda USL Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

⁵⁶ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 29 giugno 2023, n. 618 "PNRR - Missione 6 salute - M6.C1. 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione dei progetti esecutivi e indizione di gara per la realizzazione della Casa di comunità di Chatillon - Morgex - Donnas e Aosta (CUP: B57H22000970006 - B27H22000740006 - B87H22001270006 - B64H22001650006)" - **non pubblica, da richiedere;**

⁵⁷ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 11 settembre 2023, n. 837 "PNRR - Missione 6 Salute - M6.C1. 1.1 case della comunità e presa in carico della persona - approvazione dell'affidamento dei lavori per la realizzazione delle case di comunità di - Morgex - Donnas e Aosta (CUP: B27H22000740006 - B87H22001270006 - B64H22001650006)".

In data 26 settembre 2023 l'Azienda USL sottoscriveva il contratto per l'esecuzione dei lavori⁵⁸.

In data 27 settembre 2023, con determinazione dirigenziale dell'Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 881⁵⁹, veniva aggiudicato l'affidamento della Direzione lavori per la realizzazione dell'opera, per l'importo di euro 32.753,04, oneri e IVA esclusi.

In data 29 agosto 2024 venivano consegnati i lavori alla ditta affidataria⁶⁰, con termine di conclusione stabilito in 400 giorni e ultimazione lavori al 2 ottobre 2025.

Da quanto illustrato consegne che, dell'importo complessivo finanziato di euro 850.166,00, risulta un avanzamento economico finanziario come dal grafico n. 4.

In particolare, rispetto al totale dei costi, quelli sino ad ora realizzati sono di euro 272.840,59, pari al 32,09 per cento, e l'importo residuo dei costi ancora da realizzare è di euro 577.325,41, pari al 67,91 per cento. In tale residuo sono ricomprese le economie dovute ai ribassi d'asta.

Quanto all'avanzamento finanziario, risultano pagamenti approvati dal Ministero di euro 24.961,25, pari al 9,15 per cento, ed un residuo di pagamenti da approvare di euro 247.879,34, pari al 90,85 per cento.

Nello specifico, dei 272.840,59 euro di costi realizzati, euro 24.961,25 riguardano la progettazione ed euro 247.879,34 i lavori di realizzazione dell'opera.

L'Azienda USL, nella propria nota del luglio 2025 (v. prospetto che segue), in merito alla rendicontazione, ha riferito un totale pagamenti di euro 363.684,30, di cui euro 272.840,59 già liquidati dal Ministero ed euro 90.843,71 da rendicontare.

Importo	Stato	Riferimento spese inserite
24.961,25 €	Liquidati dal Ministero	Progettazione
165.897,99 €	Liquidati dal Ministero	Lavori
81.981,35 €	Liquidati dal Ministero	Lavori
90.843,71 €	Da rendicontare	Lavori
Totale pagamenti		363.684,30€

Fonte: Azienda USL Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

⁵⁸ Regione Valle d'Aosta, Presidenza della Regione, nota 12 febbraio 2024, ns. prot. n. 214.

⁵⁹ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta n. 881 del 27 settembre 2023 "PNRR – Missione 6 Salute – M6.C1. 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Aggiudicazione della direzione lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Morgex – CUP B27H22000740006 – CIG A00D5A1B9A".

⁶⁰ Processo verbale di consegna dei lavori del 5 febbraio 2024.

Raffrontando i dati estratti da Re.GIS con quelli riferiti dall'USL risulta una sostanziale coincidenza. In merito alla progettazione costi e pagamenti liquidati dal Ministero coincidono. Riguardo ai lavori che l'USL indica come "Liquidati dal Ministero" (euro $165.897,99 + 81.981,35 = 247.879,34$) coincidono con i pagamenti ancora da approvare secondo i dati estratti da Re.GIS. In ogni caso, dalla banca dati risultano documentati i pagamenti a cui si riferisce l'USL, mancando, invece, quelle da rendicontare.

Nel complesso, relativamente ai lavori, a fronte di un totale appaltato di euro 818.008,50 (v. tabella n. 5), sono stati riferiti pagamenti per euro 338.723,05, in parte liquidati dal Ministero, in parte ancora da liquidare ed in parte ancora da rendicontare.

Quanto alle fasi di realizzazione, da quanto reperito con le estrazioni e i dati inseriti in Re.GIS e dall'informativa dell'Azienda USL i lavori sono in fase di esecuzione e non sono ancora terminati. In ogni caso, considerata la tempistica di completamento dell'opera al 28 febbraio 2026, le scadenze previste sono rispettate (Fine esecuzione lavori al 31 gennaio 2026; Fine collaudo al 28 febbraio 2026 - v. Prospetto "Fase in realizzazione").

In sede di contraddittorio, l'Azienda USL ha riferito di non avere osservazioni in merito ai contenuti e all'esito del controllo⁶¹, mentre la Regione⁶² ha puntualizzato:

"Casa della Comunità di Morgex – CUP B27H22000740006

- a) pagina 40: la data inizio effettiva, come da fase procedurale caricata sul sistema ReGis, risulta essere il 29 dicembre 2022;
- b) pagine 43: la data di fine prevista, in conoscenza del Dipartimento scrivente, risulta essere il 30 novembre 2025".

Al riguardo si osserva che nelle pagine menzionate non si parla di quanto indicato dalla Regione che vorrà, nel merito, confrontarsi con l'Azienda USL che, diversamente, ha confermato i dati.

⁶¹ Azienda USL della Valle d'Aosta, Direttore Generale, nota 19 settembre 2025, ns. prot. n. 1139.

⁶² Regione Valle d'Aosta, Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, nota 25 settembre 2025, ns. prot. n. 1144.

3. Osservazioni

In linea con quanto illustrato, all'esito delle attività istruttorie sino ad ora compiute⁶³, si è potuto verificare, innanzitutto, che i rilievi delineati nella precedente ricognizione e contenuti nella Relazione approvata da questa Sezione con deliberazione del 21 giugno 2023 n. 22⁶⁴, sono stati positivamente superati e le misure consequenziali adottate dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda USL, volte al recupero del ritardo accumulato, sono risultate efficaci a superare le criticità.

Infatti, per tutte e quattro le Case di comunità sono state approvate le progettazioni entro il 30 giugno 2023⁶⁵; sono state aggiudicate le gare relative all'esecuzione dei lavori⁶⁶ entro il 30 settembre 2023 e stipulati i contratti per la realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre 2023⁶⁷.

Rispetto alle attuali "Fasi in realizzazione":

- la Casa di comunità di Aosta ha completato la realizzazione dei lavori il 16 maggio 2025 ed è in fase di collaudo, da terminare entro il 28 febbraio 2026;
- la Casa di comunità di Chatillon ha completato la realizzazione dei lavori l'11 luglio 2025 (come riferito dall'Azienda USL ma non ancora risultante dai caricamenti in Re.GIS) ed è in fase di collaudo, da terminare entro il 28 febbraio 2026

⁶³ Azienda USL della Valle d'Aosta, Relazione Responsabile Unico del Procedimento, nota 4 luglio 2023, ns. prot. n. 837. Regione Valle d'Aosta, Presidenza della Regione, nota 12 febbraio 2024, ns. prot. n. 214.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nota 13 marzo 2024, prot. n. 349.

Azienda USL della Valle d'Aosta, Relazione Responsabile Unico del Procedimento, nota 29 aprile 2024, ns. prot. n. 443.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nota 2 luglio 2025, prot. n. 687.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nota 15 luglio 2025, prot. n. 847.

Azienda USL della Valle d'Aosta, Relazione Responsabile Unico del Procedimento, nota 22 luglio 2025, ns. prot. n. 979.

⁶⁴ Corte di conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, "Relazione sull'attività svolta nell'ambito del controllo sulla gestione in corso di esercizio - Intervento M6-C1-I1.1 - Case della Comunità e presa in carico delle persona - P.N.R.R. della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" (Deliberazione 21 giugno 2023, n. 22).

⁶⁵ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 29 giugno 2023, n. 618 "PNRR - Missione 6 salute - M6.C1. 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione dei progetti esecutivi e indizione di gara per la realizzazione della Casa di comunità di Chatillon - Morgex - Donnas e Aosta (CUP: B57H22000970006 - B27H22000740006 - B87H22001270006 - B64H22001650006)".

⁶⁶ Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 11 settembre 2023, n. 837 "PNRR- Missione 6 Salute - M6.C1. 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione dell'affidamento dei lavori per la realizzazione delle Case di comunità di - Morgex - Donnas e Aosta (CUP: B27H22000740006 - B87H22001270006 - B64H22001650006)".

Determinazione dirigenziale Azienda USL Valle d'Aosta 22 settembre 2023, n. 865 "PNRR- Missione 6 Salute - M6.C1. 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione dell'affidamento dei lavori per la realizzazione della Casa di comunità di Chatillon (CUP: B57H22000970006)".

⁶⁷ Regione Valle d'Aosta, Presidenza della Regione, nota 12 febbraio 2024, ns. prot. n. 214.

- la Casa di comunità di Donnas ha completato la realizzazione dei lavori il 3 giugno 2025 (come riferito dall'Azienda USL ma non ancora risultante dai caricamenti in Re.GIS) ed è in fase di collaudo, da terminare entro il 28 febbraio 2026;
- la Casa di comunità di Morgex è in fase di esecuzione lavori da completarsi entro il 31 gennaio 2026.

Rispetto agli avanzamenti economico finanziari degli interventi, nella presente relazione si dà atto dell'avanzamento per ciascuna Casa di comunità, attraverso il confronto con le risultanze estratte dalla Banca dati Re.GIS e quelle comunicate dall'Azienda USL.

In merito ai pagamenti approvati che risultano da Re.GIS, per tutte e quattro le Case di comunità, vi è una coincidenza con le liquidazioni del Ministero riferite dall'Azienda USL. Per i restanti pagamenti che l'Azienda USL, in parte inquadra come "liquidazioni del Ministero" e in parte definisce "ancora da rendicontare", risultano in Re.GIS tra quelle ancora da approvare, ad esclusione di quelle ancora da rendicontare. Per quanto riguarda quelle "ancora da approvare" si è, però, verificato il caricamento documentale dei relativi pagamenti nella Banca dati, in attesa della liquidazione del Ministero.

All'esito della verifica non risultano, pertanto allo stato, criticità da evidenziare.

Risulta, infine, che dal mese di luglio 2025 per le Case di comunità di Chatillon, Donnas e Morgex, a cui successivamente nel mese di settembre 2025 si è aggiunta quella di Aosta, è stato attivato il servizio di Ambulatori ad accesso diretto, con un calendario specifico per ciascuna sede. L'attivazione del servizio, affiancato ai servizi già presenti nei predetti Poliambulatori, segna il primo passaggio degli stessi a Case di comunità. I cittadini, al di fuori dell'orario in cui il proprio medico di famiglia può essere contattato o perché temporaneamente sprovvisti, possono accedere in questi ambulatori senza appuntamento, per ricevere visite mediche e prescrizione di farmaci. La nuova organizzazione è garantita dai medici di famiglia che integra l'attività di medicina generale con quella di continuità assistenziale. Il servizio nelle Case di comunità è accessibile anche ai turisti.

4. Considerazioni di sintesi

Il presente referto si colloca nell'ambito della programmazione delle attività della Sezione di cui alla deliberazione n. 2 del 10 marzo 2025⁶⁸ ed è stato preordinato ad illustrare l'indagine svolta in prosecuzione del controllo sulla gestione in corso d'esercizio sull'Intervento M6-C1-I1.1 P.N.R.R. Case di comunità e presa in carico della persona, successivamente all'esito della deliberazione di questa Sezione n. 22 del 21 giugno 2023⁶⁹.

Come illustrato nella relazione, i rilievi delineati nella precedente ricognizione sono stati positivamente superati e le misure adottate dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda USL, volte al recupero del ritardo accumulato, sono state efficaci a superare le criticità.

Nel richiamare le osservazioni precedentemente formulate, all'esito della presente verifica e secondo la metodologia dell'indagine, allo stato, non risultano criticità da evidenziare.

Trattandosi, però, di quattro interventi il cui iter non è ancora concluso si invita la Regione a comunicare, entro sei mesi dal ricevimento della presente Relazione, un aggiornamento sullo stato di attuazione degli stessi, in linea con la nota del Presidente di questa Sezione prot. n. 549 del 12 luglio 2022.

La Sezione precisa, da ultimo, che l'assenza di specifici rilievi su elementi non esaminati nella presente relazione non costituisce di per sé valutazione positiva e che quanto valutato in questa sede, per i connotati propri del presente controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti, i quali potranno essere oggetto di valutazione in altre sedi competenti. Si richiama, in proposito, quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della l. 30 dicembre 2020, n. 178⁷⁰: *“Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la*

⁶⁸ Corte dei conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, “Programma delle attività della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2025” (Deliberazione 10 marzo 2025, n. 2).

⁶⁹ Corte di conti, Sezione di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, “Relazione sull'attività svolta nell'ambito del controllo sulla gestione in corso di esercizio - Intervento M6-C1-I1.1 - Case della Comunità e presa in carico delle persona - P.N.R.R. della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste” (Deliberazione 21 giugno 2023, n. 22).

⁷⁰ L. 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali”.

