



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI BERGAMO
CONTROLLO SULLA GESTIONE**
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2024 n. 38/2024/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: ANTONIO BUCCARELLI

MAGISTRATO RELATORE: MAURA CARTA

Hanno collaborato

Giulia Milani

Giuseppe Pro

DELIBERAZIONE





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTA la deliberazione SRCLOM/252/2022/GEST sulla ricognizione dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Bergamo;

VISTA la deliberazione SRCLOM/40/2023/INPR con cui la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione SRCLOM/173/2023/INPR di rimodulazione dell'attività di controllo programmata per il 2023;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.16/2023/FRG del 27 ottobre 2023 "Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite SSRRCO/34/2023/REF "Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel primo semestre 2023, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77";

VISTA la nota del 14 aprile 2023, Prot. Cdc n. 5253, con la quale il Comune di Bergamo ha risposto alla richiesta istruttoria inviata dalla Sezione in data 21 marzo 2023, Prot. n. 4095;

VISTA l'ulteriore nota del 14 novembre 2023, Prot. Cdc n. 25065, con la quale il Comune di Bergamo ha risposto alla richiesta istruttoria inviata dalla Sezione in data 3 novembre 2023, Prot. Cdc n. 24213;

VISTA l'ordinanza n. 22 del 15 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'adunanza del 18 gennaio 2024;

VISTO il rinvio disposto dal Collegio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno all'adunanza dell'8 febbraio 2024;

VISTA l'integrazione istruttoria del 19 gennaio 2024 prot. 842 cui il Comune di Bergamo ha fornito riscontro in data 29 gennaio, acquisito al prot. 1349;

UDITO il relatore, dott.ssa Maura Carta

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di Bergamo, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune del Comune di Bergamo.

La presente deliberazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il Comune dovrà dare riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
16 febbraio 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI BERGAMO
CONTROLLO SULLA GESTIONE
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

INDICE

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	11
2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	13
2.1 Avanzamento procedurale.....	17
2.2 Avanzamento finanziario.....	20
2.3 Effetti della rimodulazione	23
3. GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR	27
4. SITUAZIONE DEL PERSONALE.....	28
4.1 Esperti della Regione	28
4.2. Assunzioni di personale a tempo determinato	29
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE	30

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1-Progetti PNRR suddivisi per missione	15
Tabella 2 - Finanziamento dei Progetti PNRR per missione	15
Tabella 3 - Avanzamento procedurale.....	18
Tabella 4 - Risorse accertate in bilancio e pagamenti	21
Tabella 5 - Anticipazioni per missioni:.....	22
Tabella 6 - Progetti oggetto di possibile definanziamento	24
Tabella 7 - Stato di attuazione dei progetti oggetto di possibile definanziamento	25
Tabella 8: Elenco dettagliato dei progetti del Comune di Bergamo	34

INDICE GRAFICI

Grafico 1 - Finanziamenti per i progetti PNRR nelle missioni	16
Grafico 2 - Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR	17
Grafico 3 - Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase)	18
Grafico 4- Stato di attuazione finanziaria (Pagamenti su fondi accertati in bilancio)	22
Grafico 5- Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento	25

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Sezione regionale di controllo della Lombardia proseguendo la ricognizione avviata nel corso del 2022 sui progetti del PNRR di cui il Comune di Bergamo è “soggetto attuatore” – delibera n. 252/2022/GEST - ne limita l’attività al solo controllo sulla gestione in ragione della sopravvenuta normativa.

La Sezione ha rimodulato la programmazione dell’attività di controllo dopo l’entrata in vigore dall’art. 1, comma 12 quinquies, del d. l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito nella legge 21 giugno 2023 n. 74, che ha modificato l’art. 22 del d.l. n. 76/2020 sul controllo concomitante, escludendone l’applicazione per piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Stante la sopravvenuta modifica normativa è stato previsto, con riferimento ai progetti che avevano formato oggetto di ricognizione nel 2022, che sarebbe stato effettuato il solo “controllo sulla gestione” ai sensi dall’art. 7 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 (cfr. SRC Lombardia n.173/2023/INPR).

La deliberazione di rimodulazione richiama il criterio elaborato dalla Sezione delle Autonomie, *“la quale, nel ritenere che ‘i controlli sulla gestione non possono attendere l’esito conclusivo delle attività che, nella maggior parte dei casi, è molto protratto nel tempo’ si è espressa nel senso che detti controlli devono ‘focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione degli obiettivi intermedi’ (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR)”* (così del. 173 cit.).

In siffatto contesto normativo e giurisprudenziale la valutazione gestionale della Corte, a fronte di interventi che nella maggior parte dei casi dovrebbero giungere a completamento entro il 2026, si concentra sul raggiungimento dei *“risultati intermedi e sulla progressione dei relativi procedimenti amministrativi”* dei progetti finanziati dal PNRR.

Il controllo sulla gestione, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del d.l. n. 77/2021 e s.m.i. e dall’art. 3 della l. n. 20/1994, viene svolto *“anche in corso di esercizio”*, effettuando *“valutazioni di economicità efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego”* delle relative risorse, verificando *“la legittimità e la regolarità”* del loro utilizzo ed accertando *“la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge”*.

Si ritiene utile rammentare in questo sintetico inquadramento normativo, che la Sezione delle Autonomie nel fornire indicazioni sul “Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77” (II semestre 2023) si è soffermata sulle finalità del controllo di gestione sui progetti del PNRR e PNC (Piano Nazionale degli investimenti Complementari), evidenziando che *“nella legislazione dedicata al PNRR e in particolare, all’art 1, co. 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene fatto riferimento alla responsabilità delle Amministrazioni e degli organismi titolari dei progetti finanziati per l’attuazione del programma Next Generation EU «conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali».* Inoltre, il Documento della Commissione Europea “Commission Staff Working Document Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans” (SWD-2020 205 final) fa esplicito riferimento a tale profilo, individuando con la locuzione “sound financial management”, il concetto di “sana gestione finanziaria”, che ricade nel perimetro di controllo che la Corte dei conti è chiamata a garantire. L’esigenza di un’oculata programmazione e gestione della spesa è fondamentale nell’ottica di preservare la sana gestione finanziaria dell’Ente” (cfr. Sez. Aut. deliberazione n.16/2023/FRG).

In tale contesto si inserisce la presente deliberazione circoscritta al controllo sulla gestione nella fase di attuazione, finanziaria e procedurale degli interventi di cui il Comune di Bergamo è soggetto attuatore e/o beneficiario.

2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Sezione nel mese di marzo 2023 ha avviato un'attività istruttoria nei confronti del Comune di Bergamo, integrata nel mese di novembre 2023, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti del PNRR.

Sono stati presi in esame tutti gli interventi gestiti direttamente dal Comune di Bergamo in qualità di “soggetto attuatore”, ovvero gli interventi con una ricaduta finanziaria effettiva sul bilancio del Comune, quale Ente direttamente beneficiario dei finanziamenti stanziati dal PNRR e la cui gestione è sotto il diretto controllo del Comune o di enti strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei progetti e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente (es. in materia di appalti pubblici).

Giova ricordare che gli enti locali sono soggetti attuatori qualora provvedano direttamente alla realizzazione degli interventi, oppure soggetti beneficiari quando si avvalgono di enti strumentali o di altri soggetti, anche privati, per l'esecuzione del progetto.¹

Il citato d.l. n. 77/2021 all'art. 10, comma 1, consente, infatti, agli enti locali titolari di fondi del PNRR di affidare le risorse di cui sono beneficiari ad altri soggetti che attuino materialmente gli interventi, tra cui società partecipate in-house qualificate ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti (ora art. 63 d.lgs. 36/2023). In questo caso l'amministrazione è tenuta a stipulare una convenzione con l'Ente strumentale, che ne specifichi il ruolo, la responsabilità e la remunerazione.²

¹ L'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 stabilisce che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.

² Il beneficiario, anche laddove non figuri come soggetto attuatore, è tenuto a monitorare lo stato di attuazione e la rendicontazione delle risorse che transitano dal bilancio dell'Ente. Nel momento del riparto delle risorse, viene infatti siglata una convenzione tra ministero e beneficiario, che stabilisce in dettaglio gli obblighi, tra cui quello di garantire l'attuazione del progetto nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e la conservazione di tutta la documentazione contabile allo scopo di garantire la corretta rendicontazione.

Sono esclusi dalla presente analisi gli interventi che, pur avendo una ricaduta sul territorio del Comune, esulano dal perimetro di bilancio dell'Ente.

La verifica dello stato di avanzamento degli interventi di cui è titolare il Comune di Bergamo è stata condotta sulla base degli esiti dell'attività istruttoria effettuata nel corso del 2023 integrata dagli elementi conoscitivi della piattaforma ReGiS sulla quale gli stessi soggetti attuatori devono inserire i dati relativi ai progetti PNRR.³

Poiché le informazioni del ReGiS talvolta non sono del tutto soddisfattive per la verifica, sia pure complessiva, della gestione PNRR, i seguenti CUP (Codice Unico di Progetto) non sono stati considerati ai fini della presente relazione, rinviandone l'eventuale esame al prossimo monitoraggio:

- CUP H19J21012250004 (Missione 2 *“Via Zambonate”* per 193.246,71 euro) presente sulla piattaforma ReGiS, ma indicato dall'Ente come progetto non finanziato da fondi PNRR, ma da contributo statale ai sensi dell'art. 1, comma 407 legge n. 234/2021;
- CUP H11B21002630004 (Missione 5 *“Realizzazione di un collegamento ciclopedonale della GAMeC con il Parco Suardi”* per 100.000 euro), seppur ancora presente nella piattaforma ReGiS, è stato indicato dall'ente nella nota di risposta come progetto per cui è stata chiesta la revoca del contributo. Nella sezione PNRR del sito istituzionale lo stesso è indicato come *“Non Realizzabile”*;
- CUP H18H22000050006 (Missione 4 *“Demolizione e ricostruzione porzione di edificio per realizzazione nuova mensa presso scuola secondaria di primo grado Camozzi”* per 456.000 euro) risulta cancellato nella piattaforma ReGiS e indicato dall'ente

³ La circolare del MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 chiarisce che *“I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.”* Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

nella nota di risposta come progetto per cui “è stata chiesta la revoca del contributo”.

- CUP H18H22000050006 (Missione 5 “Progetto 1.2 - Comune di Bergamo” per 714.391,00 euro) presente nella piattaforma ReGiS ma non incluso nell’istruttoria.

È invece oggetto di esame il CUP H11C22000400006 (Missione 1 “Migrazione al cloud” per 1.031.574,00 euro) che, sebbene in stato “cancellato” nella piattaforma ReGiS, è indicato dall’Ente come in fase di “progettazione”.

Gli interventi esaminati nella presente relazione sono rappresentati nella seguente tabella, aggregati per missione.

Tabella 1-Progetti PNRR suddivisi per missione

Missione	n. CUP	% CUP sul totale
M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	6	11,32%
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	16	30,19%
M4 Istruzione e ricerca	6	11,32%
M5 Coesione e inclusione	25	47,17%
Totale complessivo	53	100,00%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Il Comune di Bergamo risulta, dunque, soggetto attuatore/beneficiario di cinquantatré progetti identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP): tra questi, sei si trovano nell’ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA), sedici si trovano nella Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) e sei nella Missione 4 (Istruzione e ricerca). La Missione 5 (Coesione e inclusione) raccoglie il maggior numero di progetti, per un totale di venticinque.

Nella tabella che segue si rappresentano le fonti del finanziamento, considerando l’insieme dei progetti aggregati per missione.

Tabella 2 - Finanziamento dei Progetti PNRR per missione

Missione	RRF (PNRR)	Fondi Propri dei Comuni	FOI	Altro Pubblico	Totale progetto	PNRR/ TOT PROG	Missione/ totale PNRR
M1	1.843.610,00 €	- €	- €	- €	1.843.610,00 €	100,00%	0,86%
M2	153.769.576,00 €	12.626.828,00 €	31.302.479,84 €	118.713.199,00 €	316.412.082,84 €	48,60%	71,91%
M4	9.169.296,00 €	250.000,00 €	916.929,60 €	- €	10.336.225,60 €	88,71%	4,29%

Missione	RRF (PNRR)	Fondi Propri dei Comuni	FOI	Altro Pubblico	Totale progetto	PNRR/ TOT PROG	Missione/ totale PNRR
M5	49.064.841,53 €	19.185.300,79 €	4.217.922,50 €	2.219.875,81 €	74.687.940,63 €	65,69%	22,94%
Totale	213.847.323,53 €	32.062.128,79 €	36.437.331,94 €	120.933.074,81 €	403.279.859,07 €	-	100,00%
Totale %	53,03%	7,95%	9,04%	29,99%	100,00%		

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.


Il Comune risulta essere soggetto attuatore per un ammontare complessivo di fondi del PNRR pari a 213 milioni.

Il valore complessivo, considerati i significativi ulteriori fondi previsti, è di 403,27 milioni di euro.

La Missione 1 risulta interamente finanziata da fondi PNRR, la Missione 2 per il 48,60 per cento, la Missione 4 per l'88,71 per cento, mentre la Missione 5 per il 65,69 per cento.

Il numero maggiore di progetti, pari al 47,17 per cento dei CUP (venticinque di cinquantatré), si concentra nella Missione 5 (Coesione e inclusione), mentre i tre quarti circa dei fondi PNRR insistono sulla Missione 2.

Grafico 1 - Finanziamenti per i progetti PNRR nelle missioni

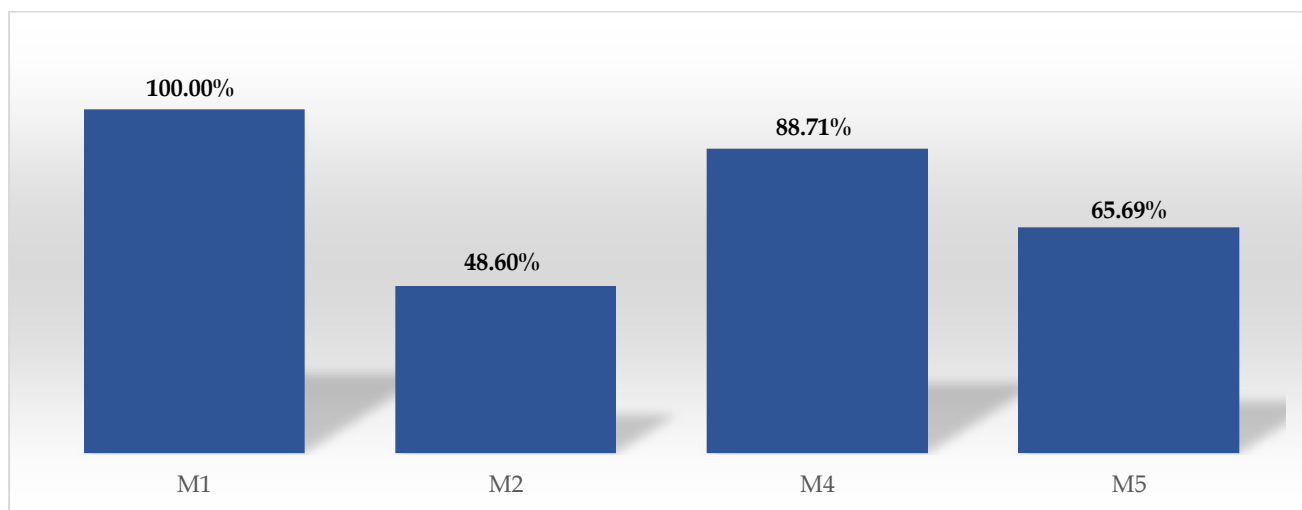


Per il dettaglio dei singoli progetti identificati mediante il Codice Unico di Progetto si rimanda alla tabella in calce alla relazione.

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 53 per cento del totale; il 29,99 per cento dei progetti risulta finanziato da altre risorse pubbliche (statali e regionali) mentre per il 9,04

per cento sono a carico del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI). Infine, i fondi propri del Comune contribuiscono per il 7,95 per cento.

Grafico 2 - Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR

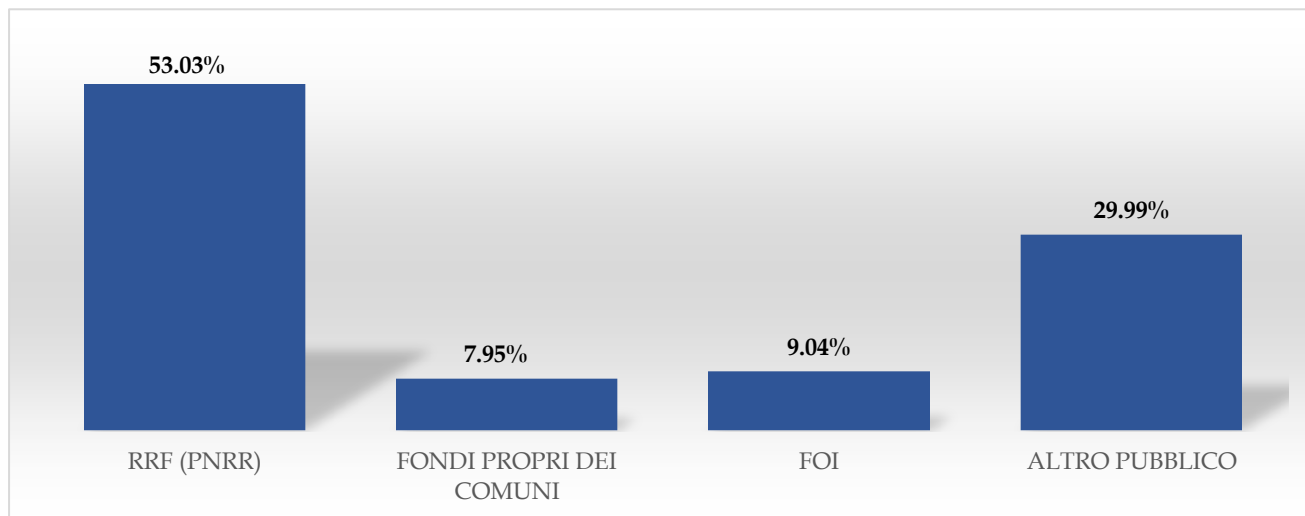

Di seguito lo stato di attuazione dei progetti finanziati coi fondi del PNRR, sia per quanto riguarda l'avanzamento procedurale, sia per l'avanzamento finanziario.

2.1 Avanzamento procedurale

Gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma predefinito a livello nazionale.

Questo implica che i diversi progetti si sviluppino nel rispetto della sequenza temporale all'interno della quale ciascuna fase dell'intervento deve essere completata.

A tale proposito si osserva che, mentre il decreto del MEF del 6 agosto 2021 (*"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per il PNRR – DM ripartizione traguardi e obiettivi"*) definisce la data con cui gli interventi devono essere conclusi, gli accordi operativi (*"Operational Arrangements"*)⁴ stabiliscono le scadenze delle fasi di ciascun intervento del piano.

Fatta questa premessa di ordine generale, con riguardo al Comune in esame va precisato che, dopo aver estratto i dati da ReGiS, è stata formulata una richiesta istruttoria, a cui


⁴ Si tratta degli accordi che l'Italia ha condiviso con la Commissione Europea (firmati dal Ministro Franco il 23-12-2021): https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf.

l'Ente ha dato riscontro in data 23 novembre 2023, per acquisire aggiornamenti ed elementi di raffronto rispetto alle informazioni contenute sulla piattaforma.

La Sezione sulla base del riscontro ha così potuto accertare la fase procedurale di ogni singolo progetto del PNRR del Comune di Bergamo.

Il grafico seguente ne fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale.

Grafico 3 – Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase)

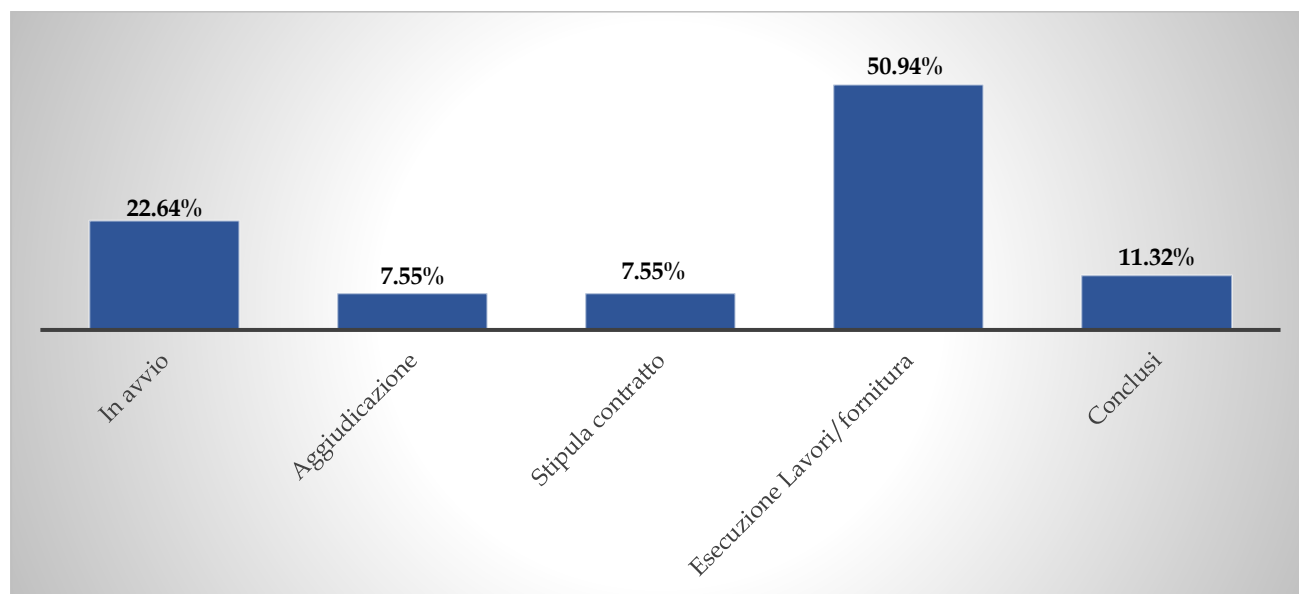

Una quota pari 22,64 per cento dei progetti è in fase di avvio; il 7,55 per cento è nella fase di aggiudicazione della gara; un ulteriore 7,55 per cento risulta già contrattualizzato.

Mette conto di evidenziare che tra i progetti finanziati sono compresi sei appalti integrati evidenziati nella tabella 8 (quattro della Missione 4 e due della Missione 2): essendo avviata la progettazione esecutiva sono stati considerati in corso di esecuzione.

Per la maggior parte dei CUP, ovvero per il 50,94 per cento, i lavori sono in esecuzione o i servizi in erogazione. Infine, l'11,32 degli interventi è completato.

La tabella che segue riporta lo stato di avanzamento delle procedure per le diverse missioni evidenziando una situazione eterogenea.

Tabella 3 – Avanzamento procedurale

Missione	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuzione Lavori/fornitura	Conclusi	Totale complessivo
M1	2	1		2	1	6
M2	2	1		10	3	16

Missione	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuzione Lavori/fornitura	Conclusi	Totale complessivo
M4			1	5		6
M5	8	2	3	10	2	25
Totale complessivo	12	4	4	27	6	53

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Si osserva come metà dei CUP della Missione 1 siano in fase di avvio o aggiudicazione, mentre l'altra metà è in fase di esecuzione o conclusa.

I CUP della Missione 2, invece, sono in gran parte in esecuzione o conclusi, mentre nella Missione 4 nessun CUP è stato completato, risultandone in esecuzione cinque su sei.

Infine, dei venticinque progetti della Missione 5 risultano otto in avvio, due aggiudicati e tre per i quali sia è conclusa la stipula del contratto; per altri dieci è in atto l'esecuzione e due risultano conclusi.

*

Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma (al 30 giugno 2023) i revisori dell'Ente hanno reso la Tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2023-2025 (cfr. Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

Per le iniziative di cui il Comune di Bergamo è soggetto attuatore, nel prospetto di monitoraggio PNRR allegato al preventivo 2023-2025 compiuto dai Revisori non sono presenti n. 5 Cup (H10J20000000008, H12B22003420004, H15F21000990004, H18H22000470004, H51F22011170006), pur oggetto di richiesta istruttoria.

Dei restanti quarantotto progetti monitorati, per quattordici CUP (pari al 29,16 per cento) risultano rispettati i tempi del cronoprogramma (seppur nel prospetto siano genericamente indicati i quadrimestri con il riferimento annuale), mentre per trentaquattro non sono state indicate né la data fine prevista, né la data di fine effettiva delle attività.

Quanto agli interventi non considerati, si fa riserva di verifica dell'effettivo rispetto dei tempi al successivo approfondimento, segnalando, allo stato, che in sede di riscontro istruttorio (prot. 25107 del 24 novembre 2023) l'Ente ha assicurato che *“le azioni PNRR procedono nel rispetto dei Milestone e Target previsti, anche a seguito, ove necessario e possibile, della concessione di termini di proroga da parte dei Ministeri di riferimento”*.

Va dato atto che l'Ente ha comunicato che non si registrano allo stato situazioni di contenzioso o di pre-contenzioso correlate a iscrizioni di riserve, né risultano richieste di

revisione prezzi; per alcuni interventi (Restauro e recupero funzionale di casa Suardi da destinare ad archivio storico, Intervento di valorizzazione del centro Piacentiniano – lotto 3, Ristrutturazione e ampliamento del centro civico della Malpensata in via Furietti, Riqualificazione e ristrutturazione spazi esterni scuola d’arte G. Carrara), previa autorizzazione del competente Ministero, sono già state approvate perizie di variante in aumento.

2.2 Avanzamento finanziario

La Sezione in sede istruttoria (nota prot. 24201 del 3 novembre 2023) ha chiesto al Comune di Bergamo *“di indicare l’importo accertato in bilancio, a seguito del trasferimento di risorse da Regione o Amministrazione centrale, specificando il totale dei pagamenti effettuati dall’Ente”* per ciascun progetto identificato mediante CUP.

L’Ente ha fornito informazioni relative allo stato di avanzamento finanziario di ciascun progetto, in particolare relativamente alle risorse complessive accertate in bilancio per l’avvio dei progetti, come provenienti dai trasferimenti statali o regionali.

Si rammenta che l’art. 15 del d.l. 77/2021 ha previsto che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie che sono loro attribuite dal PNRR su specifici capitoli di spesa, già dalla data del decreto o atto di riparto *“senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti”*. Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l’accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa.

Inoltre, poiché nel PNRR l’avvio dei progetti precede il finanziamento, per gli enti che non abbiano capienza finanziaria sufficiente per avviare gli investimenti, il decreto-legge n. 152 del 2021 *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, prevede all’art. 9, commi 6 e 7, la possibilità di disporre di anticipi di liquidità (nella misura del 10 per cento delle risorse complessive assegnate) su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale da destinare ai soggetti attuatori dei

progetti, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR.⁵

Le informazioni sull'avanzamento finanziario vengono riassunte in forma aggregata per Missione nella seguente tabella.

Tabella 4 – Risorse accertate in bilancio e pagamenti

Missioni	CUP	Importo finanziato dal PNRR	Accertamenti	Pagamenti	Pagamenti su accertamenti (%)
M1	6	1.843.610,00 €	69.000,00 €	- €	0,00%
M2	16	153.769.576,00 €	79.658.454,78 €	9.405.869,87 €	11,81%
M4	6	9.169.296,00 €	10.041.225,60 €	412.249,32 €	4,11%
M5	25	49.064.841,53 €	53.483.566,31 €	9.147.008,63 €	17,10%
Totale complessivo	53	213.847.323,53 €	143.252.246,69 €	19.117.982,11 €	13,35%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Si precisa, quanto alla Missione 1, che l'Ente riferisce pagamenti complessivi per 152.854,29 euro, integralmente riferiti al progetto identificato mediante CUP H11C22000400006⁶ "Migrazione al cloud" di 1.031.574,00 euro.

A tale progetto non corrispondono, tuttavia, accertamenti in ragione della "specifica struttura dei bandi relativi alla digitalizzazione, che prevedono la totale anticipazione di risorse da parte dell'Ente con erogazione forfettaria finale (cosiddetta rendicontazione lump sum) al raggiungimento di prefissati obiettivi".

Di tale pagamento, pertanto, non si tiene conto (né nella tabella che precede, né nel grafico che segue) ai fini della verifica del rapporto tra accertamenti e pagamenti in quanto effettuato a valere su anticipazioni di risorse proprie dell'Ente.


Si registra, quindi, una percentuale di risorse accertate pari a 143 milioni che corrispondono al 66,99 per cento dei fondi PNRR (213,84 milioni di euro) e il 35,52 per cento dell'importo totale degli interventi (403,27 milioni di euro).

I pagamenti, pari a 19 milioni, costituiscono il 13,35 per cento delle risorse accertate.

⁵ La contabilizzazione delle anticipazioni è disciplinata dall'art. 9, comma 6, dello stesso decreto, "per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR".

⁶ Trattasi, peraltro, di progetto che in ReGiS risulta cancellato.

Grafico 4- Stato di attuazione finanziaria (Pagamenti su fondi accertati in bilancio)

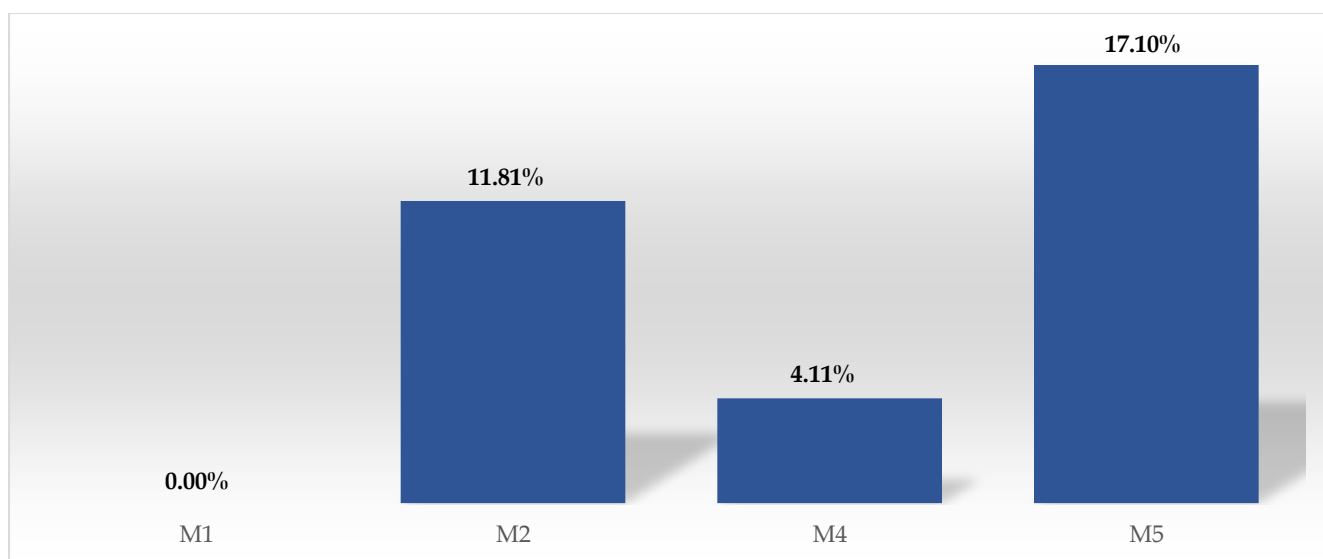

La Missione 5 registra la percentuale maggiore di pagamenti in rapporto agli accertamenti (pari al 17,10 per cento), seguita dalla Missione 2 per l'11,81 per cento; infine, la Missione 4 registra un rapporto pari al 4,11 per cento.

La Sezione rileva, inoltre, come il livello dei pagamenti complessivi, pari al 13,35 per cento dei fondi accertati in bilancio (con una certa eterogeneità tra i CUP), sembri indicare che la rendicontazione delle spese, allineata alla tempistica della certificazione dei vari stati di avanzamento dei lavori, sia ancora in fase iniziale.

*

Per quanto riguarda i fondi richiesti e ottenuti dall'Ente in forma di anticipazione, ci si è basati sulle informazioni fornite dai revisori dei conti nella relazione sul PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025, precisando che il numero dei progetti proveniente da detto monitoraggio non coincide con quanto emerso dall'attività istruttoria e dai dati di ReGiS e dunque, per tale ragione, vengono riportati nella tabella che segue i dati aggregati per missioni delle erogazioni ricevute.

Tabella 5 - Anticipazioni per missioni:

Missione	Importo anticipazione erogata
M1	- €
M2	10.131.748,40 €
M4	450.000,00 €
M5	4.131.964,93 €
Totale complessivo	14.713.713,33 €

Fonte: Tabella PNRR revisori

La somma delle anticipazioni ottenute dal Comune di Bergamo è pari a 14.713.713,33 di euro e costituisce il 6,6 per cento (14,72 mln/213,84 mln) delle risorse finanziate.

2.3 Effetti della rimodulazione

Nel giugno 2023 è stata resa pubblica la notizia di una proposta governativa di rimodulazione⁷ di alcune misure del PNRR presentata dalla cabina di regia alla Commissione Europea, approvata dal Consiglio dell'Unione Europea l'8 dicembre 2023 modificando la precedente decisione del 13 luglio 2021 (cfr. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16051-2023-ADD-1/it/pdf>).

Dal preambolo della decisione risulta che diverse misure non sono più realizzabili, con indicazione delle ragioni ("considerando" sub nn. 12, 13, 14, 15, 16 e 17), così liberando l'importo di euro 8.421.000.000,00 per includere cinque misure, con diciassette investimenti, nella nuova Missione 7.

Non vi è, allo stato, una indicazione analitica dei progetti interessati da definanziamento, ma solo una individuazione potenziale per categoria di interventi. Le informazioni rese in merito dal Comune, quindi, non si basano su specifiche comunicazioni dell'Amministrazione erogante, ma sono ricavate dall'Ente sulla base di quanto riportato nel Dossier del 31 luglio 2023 n.28/R/1 redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

La proposta di rimodulazione è stata già comunque analizzata per il suo possibile impatto sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 16/2023/FRG) che ha rilevato che *"Tra le principali misure di competenza di Comuni e Città metropolitane espunte dal PNRR si annoverano interventi quali quelli relativi alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei centri abitati, iniziative di manutenzione e riuso di aree pubbliche ed edifici, nonché di rigenerazione e valorizzazione di aree urbane per le quali sono stati avviati progetti. Ne potrebbe derivare un rallentamento che amplia le difficoltà di realizzare l'ampio parco progetti presentati ed emerge, inoltre, la necessità che le coperture alternative intervengano tempestivamente per evitare l'interruzione dei lavori e il rischio di oneri aggiuntivi"*.

⁷ I cui dettagli si trovano nel Dossier "Monitoraggio dell'attuazione del PNRR - Le Proposte del governo per la revisione del PNRR e il capitolo RepowerEU" pubblicato il 31 luglio 2023, a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.

La seguente tabella indica in forma aggregata l'ambito di intervento ed i contributi PNRR interessati da un possibile definanziamento, che insistono nell'ambito della Missione 2 (M2C4 I.2.2 "interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni") e della Missione 5 (M5C2 I.2.1. "investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale").

Tabella 6 – Progetti oggetto di possibile definanziamento

Missione	n. CUP	Fondi PNRR interessati dal possibile definanziamento	Importo totale progetto
M2	7	5.150.000,00 €	6.460.000,00 €
M5	15	19.832.000,00 €	36.692.514,07 €
Totale complessivo	22	24.982.000,00 €	43.152.514,07 €

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio (Prot. 25107 del 24/11/2023).

Non è considerato tra i progetti coinvolti da un possibile definanziamento il CUP H11B21002630004 Missione 5 *"Realizzazione di un collegamento ciclopedonale della GAMeC con il Parco Suardi"*, per il quale, come detto in premessa, è stata richiesta la revoca del contributo.

L'importo complessivo dei ventidue progetti interessati da un possibile definanziamento dei fondi PNRR è pari a 24,98 milioni corrispondente all'11,68 per cento dell'intero ammontare dello stanziamento ad essi destinato (43,15 milioni).

L'Ente riferisce che gli interventi in questione sono *"in avanzato stato di progettazione e/o esecuzione e, in alcuni casi, risultano addirittura ultimati. Un loro eventuale definanziamento, non supportato da fondi alternativi, porrebbe evidentemente il Comune di Bergamo in grave difficoltà finanziaria, atteso che le azioni ad oggi operate sono state eseguite e supportate da provvedimenti ufficiali di concessione dei relativi contributi, regolarmente accertati come da specifica disciplina relativa al PNRR. Nel suddetto caso di eventuale definanziamento non assistito dalla previsione di fonti alternative di provenienza statale, l'Ente ..., al di là della rappresentazione contabile dell'evento, si troverebbe nelle condizioni di dover reperire fonti di finanziamento alternative proprie, con particolare riferimento all'alienazione del proprio patrimonio finanziario e immobiliare, con conseguente depauperamento di tale patrimonio."*

Si fornisce di seguito la rappresentazione dello stato di attuazione dei progetti interessati da possibili misure di definanziamento.

Tabella 7 - Stato di attuazione dei progetti oggetto di possibile definanziamento

Intervento	In Avvio	Aggiudicazione	Stipulato Contratto	Esecuzione Lavori/ Fornitura	Conclusi	Totale Complessivo
M2	2			2	3	7
M5		2	3	8	2	15
Totale complessivo	2	2	3	10	5	22


Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio (Prot. 25107 del 24/11/2023).

Più nel dettaglio, in base alla tabella 7 che integra i dati ReGiS con le informazioni rese dal Comune di Bergamo, risulta che vi sono due progetti in fase di avvio, due di aggiudicazione e tre per i quali è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi.

La maggior parte dei CUP è in fase di esecuzione (dieci su ventidue totali), mentre cinque sono già conclusi.

È possibile confrontare lo stato di attuazione dei progetti coinvolti dal definanziamento rispetto ai cinquantatré progetti complessivi nel seguente grafico.

Grafico 5- Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento

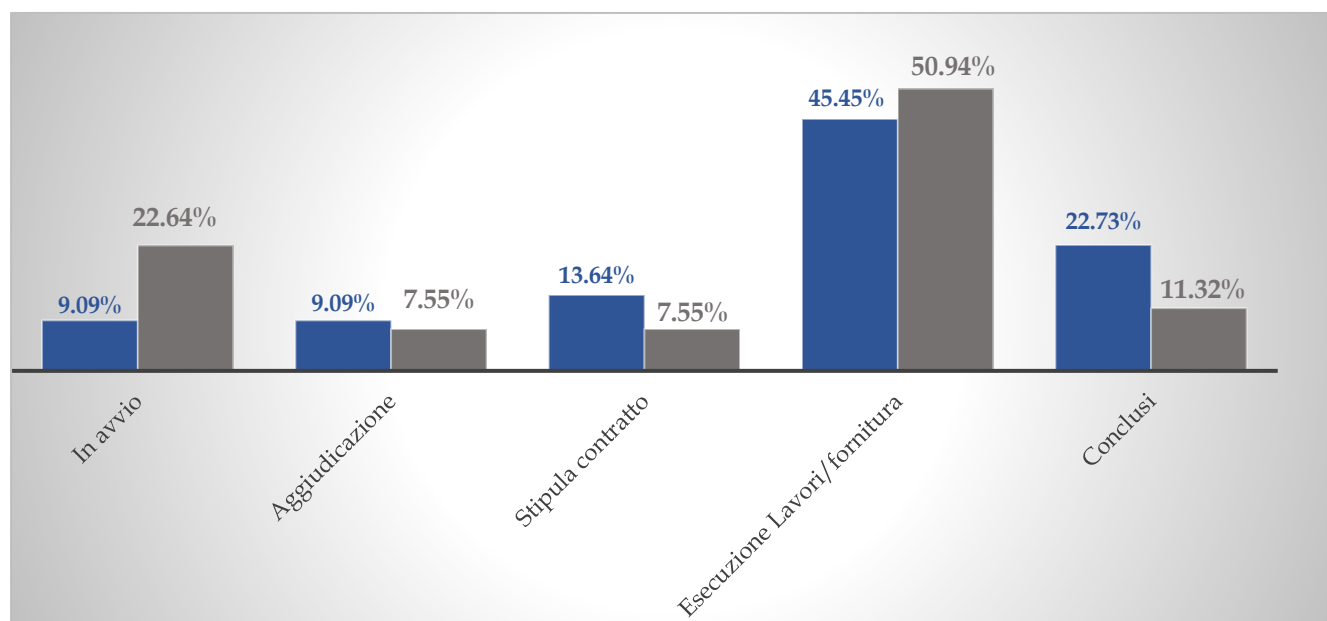

Legenda: con il blu si indica la percentuale dei progetti a seconda della fase di attuazione coinvolti dal definanziamento, mentre in grigio la percentuale sul totale dei 53 progetti.

I progetti risultano, pertanto, nella maggior parte dei casi in fase di realizzazione o già conclusi.

Risulta, inoltre, che i progetti coinvolti dal definanziamento, che sono in fase di stipula dei relativi contratti o già conclusi, superano la media dell'insieme degli interventi nella stessa fase di attuazione (rispettivamente diciotto su ventidue contro trentasette su cinquantatré).

La quota di stanziamento PNRR che potrebbe venire a mancare è pari a circa l'11,68 per cento se rapportato all'importo complessivo dei soli fondi PNRR determinato in 213,84 milioni.

Qualora le obbligazioni giuridicamente vincolanti perdessero la fonte del trasferimento statale, si porrebbe un problema di copertura che richiederebbe di essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio dell'Ente.

L'eventuale definanziamento o posticipo della disponibilità delle risorse già assegnate, potrebbe comportare a seconda dei casi nuovi costi per i servizi di architettura e ingegneria, possibili contenziosi con gli operatori economici contrattualizzati, interruzione o sospensione delle opere e delle forniture con inevitabili oneri aggiuntivi di varia natura.

A ciò vanno ad aggiungersi i riflessi sociali sulle comunità interessate e i rischi di una perdita di credibilità dell'Amministrazione pubblica.

3. GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Il Comune di Bergamo ha costituito una cabina di regia preordinata al coordinamento e al controllo dei programmi, progetti e interventi del PNRR e PNC con disposizione di servizio del Direttore Generale n. 20 del 30 settembre 2022.

Tale struttura è stata successivamente integrata, nella sua composizione, con disposizione di servizio del Direttore Generale n. 10 del 17 gennaio 2023.

4. SITUAZIONE DEL PERSONALE

4.1 Esperti della Regione

La Sezione con nota istruttoria prot. 24201 del 3 marzo 2023 ha chiesto informazioni circa l'eventuale utilizzo del personale esperto assunto dalla Regione, nell'ambito della misura del PNRR M1C1-2.2 *"Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance"* per la semplificazione delle procedure amministrative degli enti locali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2021 col quale veniva stanziata la relativa spesa aveva definito il perimetro dei compiti degli esperti e professionisti assunti dalle Regioni per l'Assistenza Tecnica (TA): *"La TA è finalizzata a supportare le amministrazioni territoriali con l'obiettivo di velocizzare le procedure complesse, con particolare riferimento quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR ..."*.⁸ Per questa misura, finanziata con 38,6 milioni in bilancio dal 2021, Regione Lombardia è chiamata, quindi, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi complessi in particolare delle procedure propedeutiche all'implementazione dei progetti del PNRR.

Il Comune di Bergamo ha comunicato di non essersi avvalso degli esperti della Regione.

⁸ Il DPCM del 12 novembre 2021 all'art.1 stabiliva che *"il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse, è erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del PNRR, a favore delle regioni e province autonome"*. All'art. 2 che *"il contributo di cui all'art. 1 è finalizzato al conferimento, da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR"*. All'art.3 che *"ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono in via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento."* Infine, all'art. 5 è specificato che i Piani territoriali *"sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti ad approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza"*. Con DPCM 29 novembre 2021, attuativo dell'art. 9 del d.l. n. 80/2021, di ripartizione delle risorse tra le Regioni, alla Regione Lombardia sono stati assegnati 38.632.000,00 euro per la contrattualizzazione di 123 esperti.

4.2. Assunzioni di personale a tempo determinato

La Sezione ha chiesto informazioni circa le procedure di rinforzo dell'organico a supporto ai progetti del PNRR.

L'Ente ha dichiarato che *“all'interno del piano del fabbisogno del personale, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 2 marzo 2023 e successivamente ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 6 aprile 2023, è stata dettagliatamente prevista, nel triennio 2023-2025, l'assunzione a tempo determinato di n. 9 figure professionali a valere sui finanziamenti PNRR relativi a n. 8 interventi in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e di quanto disciplinato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4 del 18 gennaio 2022”*.

Peraltro, bandito ed espletato il concorso *“per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 “istruttore direttivo tecnico” settori: opere di riqualificazione, gestione impianti, verde pubblico categoria d – C.C.N.L. comparto funzioni locali”*, con il candidato vincitore è stato invece stipulato un contratto a tempo parziale (50 per cento) e determinato (35 mesi), con immissione in servizio a valere sul progetto CUP H13D21000200005 dal 5 giugno 2023 e, tuttavia, conclusosi per cessazione volontaria il 31 agosto 2023 .

A seguito della chiamata per l'“*interpello sulla “lista di idonei con il profilo di ingegnere e/o architetto (cat. d1) – prot n. u0006136 dell'11.01.2023” ed approvazione del relativo avviso di selezione, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale al 50%, con profilo professionale di “istruttore direttivo tecnico” – area dei “funzionari” – da impiegare nell'attuazione dei progetti afferenti al PNRR”*”, è stato assunto un Istruttore Direttivo Tecnico a tempo parziale (50 per cento) e determinato (34 mesi), in servizio dal 7 settembre 2023 con termine previsto il 30 giugno 2026 (CUP H13D21000190005).

Alla data odierna non vi sono altre procedure attive in corso.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione avviata nel marzo 2023, aggiornata al 24 novembre 2023, nonché dei dati estrapolati da ReGiS si espone il seguente quadro di sintesi.

➤ **PNRR**

il Comune di Bergamo risulta soggetto attuatore di cinquantatré progetti (ciascuno identificato da un Codice Unico di Progetto, detto CUP) per un ammontare complessivo di fondi del PNRR pari a 213 milioni di euro. La Missione 2 accentra il 71,91 per cento dei fondi complessivi mentre il numero maggiore di progetti sono presenti nella Missione 5 (25 su 53). I progetti sono alimentati anche da risorse FOI per euro 36,43 milioni, da fondi propri del Comune per 32,06 milioni di euro e da altre fonti pubbliche per euro 120,93 milioni, per un importo complessivo pari a 403,27 milioni di euro.

➤ **Attuazione procedurale**

- il 22,64 per cento dei CUP è in fase di avvio;
- il 7,55 per cento in fase di aggiudicazione;
- il 7,55 per cento è in fase di stipula del contratto;
- il 50,94 per cento in corso di esecuzione;
- l'11,32 per cento è concluso.

➤ **Cronoprogramma**

In base alla Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025, al 30 giugno 2023, il 29,16 per cento dei progetti (quattordici su quarantotto) risulta allineato con i tempi rispetto al cronoprogramma. Va segnalato, tuttavia, che per trentaquattro interventi (dei 48 progetti documentati su 53 complessivi) non risulta indicata la data prevista di conclusione, né, ove terminati, quella finale effettiva.

➤ **Avanzamento finanziario**

Le risorse accertate indicate dall'Ente sono pari a 143,25 milioni di euro che corrispondono al 66,99 per cento dei fondi PNRR (213,84 milioni di euro) e al 35,52 per cento dell'importo totale degli interventi (403,27 milioni di euro).

I pagamenti, pari a 19,11 milioni di euro, costituiscono il 13,35 per cento delle risorse accertate nel bilancio.

➤ **Anticipazioni ricevute**

Sono 4,27 milioni di euro e costituiscono il 6,88 per cento (14,71 mln/ 213,84 mln) delle risorse finanziate da PNRR.

➤ **Ipotesi rimodulazione**

Sulla proposta di definanziamento, approvata dalla Commissione Europea e dal Consiglio UE, il Comune non ha ricevuto formali comunicazioni. Sulla base di quanto riportato nel Dossier della Camera dei Deputati del 31 luglio 2023 n. 28/R/1, l'Ente dichiara che potrebbero essere coinvolti 22 progetti distribuiti su due interventi, nell'ambito degli interventi M2C4 I.2.2 *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”* e M5C2 I.2.1 *“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”*.

L'importo che potrebbe essere oggetto di definanziamento è di 24,98 milioni pari a circa l'11,68 per cento se rapportato all'importo complessivo di fondi PNRR determinato in 213,84 milioni.

Inoltre, l'Ente dichiara che tali progetti sono *“in avanzato stato di progettazione e/o esecuzione e, in alcuni casi, risultano addirittura ultimati. Un loro eventuale definanziamento, non supportato da fondi alternativi, porrebbe evidentemente il Comune di Bergamo in grave difficoltà finanziaria, atteso che le azioni ad oggi operate sono state eseguite e supportate da provvedimenti ufficiali di concessione dei relativi contributi, regolarmente accertati come da specifica disciplina relativa al PNRR. Nel suddetto caso di eventuale definanziamento non assistito dalla previsione di fonti alternative di provenienza statale, l'Ente scrivente, al di là della rappresentazione contabile dell'evento, si troverebbe nelle condizioni di dover reperire fonti di finanziamento alternative proprie, con particolare riferimento all'alienazione del proprio*

patrimonio finanziario e immobiliare, con conseguente depauperamento di tale patrimonio". La Sezione rileva che la quota degli importi interessati sul complesso dei finanziamenti PNRR appare di rilievo e che, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti venisse a mancare la certezza di un trasferimento statale compensativo delle risorse distratte, si porrebbe un problema di copertura che richiederebbe di essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio dell'Ente. D'altra parte, va evidenziato come i progetti che potrebbero essere coinvolti dall'ipotesi di definanziamento si trovino in avanzata esecuzione e, in taluni casi, già completati; vanno, quindi, sottolineate le possibili gravose conseguenze correlate al sorgere di contenziosi ed ai costi generali di gestione nell'eventualità di interruzione o sospensione degli interventi. Nelle successive verifiche sull'attuazione del PNRR si valuteranno gli effetti del definanziamento sugli specifici progetti e le misure messe in campo dal Comune a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

➤ **Misure organizzative**

Il Comune ha riferito di aver istituito costituito una specifica struttura Cabina di regia preordinata al coordinamento e al controllo dei programmi, progetti e interventi del PNRR e PNC con disposizione di servizio del Direttore Generale n. 20 del 30 settembre 2022.

Tale struttura è stata successivamente integrata, nella sua composizione, con disposizione di servizio del Direttore Generale n. 10 del 17 gennaio 2023.

➤ **Personale di supporto PNRR**

L'Ente non si è avvalso dei professionisti messi a disposizione dalla Regione Lombardia.

È stato bandito ed espletato il concorso *"per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 "istruttore direttivo tecnico" settori: opere di riqualificazione, gestione impianti, verde pubblico categoria d – c.c.n.l. comparto funzioni locali"*, stipulato un contratto a tempo parziale (50%) e determinato (35 mesi) dal 5 giugno 2023 ma il rapporto contrattuale si è concluso per cessazione volontaria il 31 agosto 2023. A seguito della chiamata per l'"interpello sulla "lista di idonei con

il profilo di ingegnere e/o architetto (cat. d1) è stato assunto un Istruttore Direttivo Tecnico a tempo parziale (50%) e determinato (33,66 mesi), in servizio dal 7 settembre 2023 con termine previsto il 30 giugno 2026 (CUP H13D21000190005).

Tabella 8: Elenco dettagliato dei progetti del Comune di Bergamo

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
1	M1.C1.I 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	H11C22000400006	Migrazione al cloud	1.031.574,00 €	1.031.574,00 €	- €	152.854,29 €	PROGETTAZIONE
2	M1.C1.I 1.4.1 Citizen experience Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	H11F22004180006	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	398.397,00 €	398.397,00 €	- €	- €	AGGIUDICAZIONE
3	M1.C1.I 1.4.3 Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA e App "IO"	H11F22002210006	PagoPA	96.145,00 €	96.145,00 €	- €	- €	IN CORSO DI ESECUZIONE
4	M1.C1.I 1.4.3 Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA e App "IO"	H11F22002220006	AppIO	45.059,00 €	45.059,00 €	- €	- €	IN CORSO DI ESECUZIONE
5	M1.C1.I 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	H11F22003380006	Adozione Piattaforma Notifica Digitale	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	- €	COLLAUDO IN DATA 28/09/2023
6	M1.C1.I 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	H51F22011170006	1.3.1c_a794 Comune di Bergamo	203.435,00 €	203.435,00 €	-	- €	PROGETTAZIONE
7	M2.C2.I 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica	H11B22001930006	Rafforzamento mobilità ciclistica - ciclovie urbane	1.567.463,70 €	1.424.967,00 €	1.424.967,00 €	275.425,34 €	IN CORSO DI ESECUZIONE
8	M2.C2.I 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa	H11B21006730001	E-BRT Bergamo-Dalmine	84.096.048,22 €	80.000.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	IN CORSO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI APPALTO INTEGRATO
9	M2.C2.I 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa	H21D18000120001	Linea Tramviaria T2 della Valle Brembana	205.045.536,92 €	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €	- €	IN CORSO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA A

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
								SEGUITO APPALTO INTEGRATO
10	M2.C2.I 4.4.1 Bus	C19J21048760001	Contributo PNRR per rinnovo flotte bus	458.806,22 €	458.806,22 €	45.880,62 €	45.880,62 €	IN CORSO FORNITURA
11	M2.C2.I 4.4.1 Bus	C19J21048770001	Contributo PNRR per rinnovo flotte bus	312.456,57 €	312.456,57 €	31.245,66 €	31.245,66 €	IN CORSO FORNITURA
12	M2.C2.I 4.4.1 Bus	H19J22001050008	Contributo PNRR per rinnovo flotte bus	5.729.590,00 €	5.729.590,00 €	572.959,00 €	572.959,00 €	IN CORSO FORNITURA
13	M2.C2.I 4.4.1 Bus	J19J22001980008	Contributo PNRR per rinnovo flotte bus	816.631,21 €	816.631,21 €	81.663,12 €	81.663,12 €	IN CORSO FORNITURA
14	M2.C3.I 1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	H11B22000640006	Interventi di demolizione e ricostruzione scuola "Scuri" via dei Galliari	8.522.625,00 €	6.475.000,00 €	7.122.500,00 €	- €	IN VIA DI ATTIVAZIONE AD ACCORDO QUADRO INVITALIA
15	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H12B22003420004	NUOVA VASCA DI LAMINAZIONE*BAROZZI*REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE PRESSO ZONA EX OSPEDALE MAGGIORE DI LARGO BAROZZI	3.900.000,00 €	3.900.000,00 €	3.900.000,00 €	- €	AVVENUTO ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA
16	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H14E21000490004	Manutenzione straordinaria per adeguamento edifici comunali alla normativa sulla sicurezza (2021)	250.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	182.288,52 €	INTERVENTO TERMINATO
17	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H15F21000990004	STRADE CITTADINE*VIA VARIE*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE, SPAZI APERTI, PERCORSI CICLOPEDONALI E ZONE 30 SCUOLE E QUARTIERI - ANNO 2021	700.000,00 €	210.000,00 €	105.000,00 €	- €	IN CORSO DI ESECUZIONE
18	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del	H15I19000130004	Manutenzione straordinaria Chiesa Cimitero di Viale Pirovano (2021)	300.000,00 €	210.000,00 €	124.674,09 €	124.674,09 €	INTERVENTO TERMINATO

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
	territorio e l'efficienza energetica dei Comuni							
19	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H17H20001040001	Realizzazione di segnaletica stradale per la messa in sicurezza delle Zone 30 dei quartieri cittadini	210.000,00 €	210.000,00 €	109.059,29 €	91.733,52 €	IN CORSO DI ESECUZIONE
20	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H17H21005550004	Manutenzione straordinaria con adeguamento funzionale e superamento barriere architettoniche di edifici scolastici e strutture per l'infanzia - anno 2021	800.000,00 €	210.000,00 €	105.000,00 €	- €	INTERVENTO TERMINATO
21	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H18H22000470004	RETICOLO IDRICO*VIA VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA COMUNALE	300.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	IN CORSO PROGETTAZIONE
22	M2C2I4.4.1 Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	H10J20000000008	COMUNE DI BERGAMO - BUS L.V.	3.402.925,00 €	3.402.125,00 €	7.625.506,00 €	- €	IN CORSO DI ESECUZIONE
23	M4.C1.I 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	H11B22001630006	Demolizione e ricostruzione asilo nido "i coriandoli" in via Mozart	1.979.131,00 €	1.799.210,00 €	1.979.131,00 €	- €	IN CORSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA A SEGUITO APPALTO INTEGRATO
24	M4.C1.I 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	H11B22001640006	Demolizione e ricostruzione asilo nido Villaggio sposi, via Don Bepo Vavassori	1.674.701,60 €	1.522.456,00 €	1.674.701,60 €	376.840,26 €	CONSEGNA LAVORI IL 24/07/2023
25	M4.C1.I 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di	H15E22000180006	Demolizione e ricostruzione asilo nido L'erba Voglio di Longuelo	1.979.131,00 €	1.799.210,00 €	1.979.131,00 €	- €	IN CORSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA A

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
	educazione e cura per la prima infanzia							SEGUITO APPALTO INTEGRATO
26	M4.C1.I 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	H15E22000190006	Demolizione e ricostruzione asilo nido Bruco Verde di Valtesse	1.979.131,00 €	1.799.210,00 €	1.979.131,00 €	- €	IN CORSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA A SEGUITO APPALTO INTEGRATO
27	M4.C1.I 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	H15E22000200006	Demolizione e ricostruzione asilo nido il Ciliegio di Boccaleone	1.979.131,00 €	1.799.210,00 €	1.979.131,00 €	- €	IN CORSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA A SEGUITO APPALTO INTEGRATO
28	M4.C1.I 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense	H15E22000300001	Realizzazione nuova mensa presso scuola recondaria di primo grado "Corridoni" in via Flores e scuola primaria "de Amicis" in via Tofane	745.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	35.409,06 €	STIPULATO CONTRATTO IL 24/10/2023
29	M5.C2.I 1.1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione Intervento 1)Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	H14H22000210006	Sostegno alle capacità genitoriali	211.500,00 €	211.500,00 €	204.500,00 €	- €	IN CORSO DI ESECUZIONE
30	M5.C2.I 1.1.2 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione Intervento 2)Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani	H14H22000220006	Autonomia anziani non autosufficienti	2.458.987,41 €	2.458.987,41 €	2.323.987,41 €	- €	IN CORSO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER
31	M5.C2.I 1.1.3 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione	H14H22000230006	Domiciliarità anziani	330.000,00 €	330.000,00 €	297.000,00 €	- €	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
	dell'istituzionalizzazione Intervento 3)Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale							MEDIANTE PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
32	M5.C2.I 1.1.4 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione Intervento 4)Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali	H14H22000240006	Prevenzione Burn Out	209.710,80 €	209.710,80 €	209.710,00 €	- €	IN CORSO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
33	M5.C2.I 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità	H14H22000250006	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	714.994,00 €	714.994,00 €	689.993,40 €	- €	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
34	M5.C2.I 1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di posta	H14H22000260006	Housing First	710.000,00 €	710.000,00 €	500.000,00 €	- €	IN CORSO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
35	M5.C2.I 1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di posta	H14H22000270006	Stazione di posta	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	981.000,00 €	- €	IN CORSO PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO STRUTTURALE
36	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H11B21002590004	Realizzazione nuovo polo scolastico Mazzi-Calvi in via Calvi - LOTTO 1	4.607.000,00 €	3.200.000,00 €	3.520.000,00 €	- €	DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI STIPULA DEL CONTRATTO AL 28/02/2024 A SEGUITO

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
								AUTORIZZAZIONE MINISTERO
37	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H11B21002610004	Realizzazione nuova piazza nel quartiere Colognola tra la SS42 e via San Sisto	700.000,00 €	665.000,00 €	665.000,00 €	208.629,30 €	IN CORSO DI ESECUZIONE
38	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H11B21002620002	Progettazione intervento di realizzazione Galleria Arte Moderna e Contemporanea GAMeC presso il Palazzetto dello Sport)	18.700.014,07 €	6.400.000,00 €	7.040.000,00 €	3.486.911,19 €	CONTRATTO STIPULATO IN DATA 21/09/2023
39	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H13D21000650004	Recupero e riqualificazione ex casello ferroviario in via Bianzana per spazi a servizio pista ciclabile	274.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	106.784,19 €	IN CORSO DI ESECUZIONE - EMESSE SAL 1
40	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H13D21000660004	Riqualificazione spazi ex Casello ferroviario in via Negrisola	424.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	7.256,90 €	IN CORSO DI ESECUZIONE
41	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H13D21000670004	Riqualificazione complessiva impianto sportivo di via Baioni / Campo Utili - LOTTO 1 (spesa oneri professionali + lavori)	1.822.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	123.007,80 €	DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI STIPULA DEL CONTRATTO AL 28/02/2024 A SEGUITO AUTORIZZAZIONE MINISTERO

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
42	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H14E21000520004	Ristrutturazione e ampliamento Centro Civico del quartiere Malpensata in via Furietti	850.000,00 €	567.000,00 €	567.000,00 €	357.503,66 €	IN CORSO DI ESECUZIONE - APPROVATO SAL 2
43	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H15F21000370004	Restauro e recupero funzionale di Casa Suardi da destinare ad archivio storico	2.768.000,00 €	1.830.000,00 €	1.830.000,00 €	1.830.000,00 €	IN CORSO DI ESECUZIONE - APPROVATO SAL 5
44	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H16G20000210004	Riqualificazione e ristrutturazione spazi esterni scuola d'arte G. Carrara	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	241.400,73 €	LAVORI ULTIMATI
45	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H17H21001440004	Impianto sportivo di via Meucci: rifacimento campo di calcio in erba sintetica	954.500,00 €	745.000,00 €	745.000,00 €	- €	IN CORSO DI ESECUZIONE
46	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H17H21001460004	Rifacimento campo di calcio in erba sintetica in via Pizzo Scais	827.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €	139.606,32 €	CONSEGNA LAVORI IL 31/07/2023 - IN CORSO DI ESECUZIONE - EMESSE SAL 1
47	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H17H21001470004	Rifacimento campo di calcio in erba sintetica in via Acquaderni	827.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €	148.500,07 €	CONSEGNA LAVORI 31/07/2023 - IN CORSO DI ESECUZIONE

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
	di emarginazione e degrado sociale							
48	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H19E20000010004	Ristrutturazione Scuola media Donadoni in via Tasso	550.000,00 €	465.000,00 €	511.500,00 €	- €	PREVISIONE INIZIO LAVORI GIUGNO 2024 IN RELAZIONE DISPONIBILITA' LOCALI
49	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H19J21001160004	Intervento di valorizzazione del Centro Piacentiniano - Lotto 3	2.600.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.469.816,16 €	COLLAUDO IN DATA 18/09/2023
50	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	H19J21002270004	Sistemazione e arredo urbano tratto in via Borgo Palazzo tra viale Pirovano e via Gritti	539.000,00 €	390.000,00 €	429.000,00 €	- €	CONTRATTO STIPULATO IN DATA 08/11/2023
51	M5.C2.I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare	H13D21000190005	Restauro e riconversione del compendio ex carcere di Sant'Agata (PINQUA)	9.773.500,00 €	7.728.036,80 €	8.500.840,48 €	- €	SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA
52	M5.C2.I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare	H13D21000200005	Riqualificazione alloggi sap in piazzale Visconti (PINQUA)	18.833.234,35 €	12.929.612,52 €	15.515.535,02 €	- €	DA ATTIVARE PROCEDURA DI ADESIONE ACCORDO QUADRO INVITALIA
53	M5.C2.I 3.1 Sport e inclusione sociale	H18B19000000004	Realizzazione nuova palestra nel quartiere S.Tomaso de Calvi in via W. Tobagi	3.663.500,00 €	2.850.000,00 €	3.383.500,00 €	27.592,31 €	IN CORSO DI ESECUZIONE - IN CORSO ISTRUTTORIA PER EMISSIONE SAL 1

Fonte: Riscontro istruttorio e dati estratti da ReGis

