



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI LECCO
CONTROLLO SULLA GESTIONE**
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE n. 64 /2025/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: SUSANNA LOI

RELATORE: MAURA CARTA

I funzionari

GIULIA MILANI

GIUSEPPE PRO



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidenti
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 12 marzo 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la deliberazione SRCLOM/45/2024/INPR con la quale sono stati definiti gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la nota del 16 dicembre 2024, Prot. Cdc n. 23601, con la quale il Comune di Lecco ha trasmesso i dati sullo stato di attuazione del PNRR in riscontro alla nota istruttoria inviata dalla Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 53 del 27 febbraio 2025 con la quale il Presidente ha fissato l'adunanza pubblica;

VISTA la nota istruttoria e gli allegati trasmessi in data 10 marzo 2025, prot. C.d.c. n. 3177;

SENTITI per il Comune di Lecco la Dott.ssa Nadia Crippa Dirigente Servizi Finanziari e il Dott. Alessandro Crippa Dirigente Lavori Pubblici;

UDITO il relatore Maura Carta

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto “Attuazione del PNRR del Comune di LECCO - controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”.

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Lecco, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il

2 aprile 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

**ATTUAZIONE DEL PNRR DEL
COMUNE DI LECCO
CONTROLLO SULLA GESTIONE**
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

INDICE

1	STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
1.1	<i>Avanzamento procedurale.....</i>	<i>11</i>
1.2	<i>Avanzamento finanziario.....</i>	<i>14</i>
1.3	<i>Progetti definanziati.....</i>	<i>17</i>
2	TEMPI DI RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTERI	19
3	CRITICITA' NELL'ATTUAZIONE	20
3.1	<i>Aumento dei costi.....</i>	<i>20</i>
4	APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI	23
5	SISTEMA DI MONITORAGGIO.....	24
6	VALUTAZIONI CONCLUSIVE	25

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione	9
Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC	10
Tabella 3 - Avanzamento procedurale al 30 giugno 2024	11
Tabella 4 - Avanzamento procedurale al 30 gennaio 2025	12
Tabella 5 - Rispetto del cronoprogramma	13
Tabella 6 - Avanzamento finanziario.....	15
Tabella 7- Anticipazioni PNRR.....	17
Tabella 8 - Elenco dei CUP dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Lecco	28

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1- Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC	10
Grafico 2 - Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase).....	12
Grafico 3 - Avanzamento finanziario	16

1 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La presente relazione, in continuità con le deliberazioni della Sezione n. 255/2022/GEST e n. 36/2024/GEST, espone l'esito del monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (di seguito PNC) di pertinenza del Comune di Lecco, nell'ambito del controllo di gestione previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

La verifica dello stato di avanzamento degli interventi di cui il Comune è soggetto attuatore è stata compiuta avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria, dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS¹ e delle informazioni trasmesse dall'Organo di Revisione nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026.

Quest'ultima fonte informativa è frutto dell'adempimento² richiesto ai Revisori dei conti dell'Ente locale dalla Sezione delle Autonomie attraverso una griglia di rilevazione somministrata agli enti che contiene informazioni aggiornate al **30 giugno 2024** per quanto riguarda l'avanzamento procedurale e fisico e al **31 dicembre 2023** per l'avanzamento finanziario. Sono stati presi in considerazione anche i progetti interamente o parzialmente finanziati con risorse PNC.

In riscontro alla nota istruttoria della Sezione, il 16 dicembre 2024 il Comune ha trasmesso una dettagliata risposta.

In data **30 gennaio 2025** è stata effettuata una verifica su ReGiS, per acquisire ulteriori

¹ Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che *"I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza."* Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

² La Sezione delle Autonomie in allegato alle Linee Guida sul bilancio di previsione 2024-2026 (Deliberazione n. 6/SEZAUT/2024/INPR) ha richiesto ai revisori dei conti degli enti locali di compilare una tabella precompilata con i dati relativi ai progetti attivati, fornendo informazioni circa lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei singoli CUP. I revisori hanno dovuto trasmettere la "Tabella PNRR" non oltre il termine del 30 settembre 2024. È bene chiarire che mentre lo stato di avanzamento procedurale si riferisce al 30 settembre 2024, lo stato dell'avanzamento finanziario è quello accertato dai dati di bilancio al 31.12.2023. Per rappresentare lo stato degli impegni e dei pagamenti si è attinto alle informazioni aggiornate alla data del 30 gennaio 2025 dalla piattaforma ReGiS.

elementi informativi e il **10 marzo 2025**³ l'Ente ha depositato una nota di aggiornamento e documenti.

Il precedente monitoraggio, oggetto della deliberazione della Sezione n. 36/2024/GEST, indicava come attivi n. **30 CUP**.

Nel corso del 2024 si sono registrate variazioni e n. **5 CUP** sono stati **totalmente definanziati**.

Inoltre, nella deliberazione n. 36/2024/GEST era considerato un progetto per il quale è stata fatta formale rinuncia al finanziamento nel settembre 2024⁴, escluso dall'attuale perimetro istruttorio, mentre è stato aggiunto un progetto finanziato dal PNC non presente nel precedente monitoraggio.

All'esito dell'istruttoria i CUP dei quali il comune di Lecco è soggetto attuatore risultano **25** e il finanziamento con fondi PNRR, pari a euro **27.735.009,58** è diminuito di euro 1.021.530,08, rispetto al precedente monitoraggio (euro **28.756.539,66**).

Gli interventi sono rappresentati nella seguente tabella aggregati per Missione.

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione

	n. CUP
M1 - Digitalizzazione della PA	7
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	6
M4 - Istruzione e ricerca	1
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	10
Piano Nazionale Complementare	1
Totale	25

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dei dati estratti da ReGiS.

Tra questi CUP 7 si trovano nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA), 6 nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), 1 nella Missione 4 (Istruzione e ricerca) e 10 nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità) e l'ultimo finanziato dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nella tabella che segue sono rappresentate le fonti di finanziamento per le distinte Missioni.

³ prot. C.d.c. n. 3177

⁴ Il progetto rinunciato in data 24 settembre 2024 era ricompreso nella Missione 1 - CUP D11C22000050006 di 241.530,00 euro che nella delibera n. 35/2024/GEST era stato aggiudicato.


Tabella 2 -Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC

FONTI	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale finanziamento	% Fonte/Tot.
Fondi PNRR	1.012.863,00 €	8.741.838,66 €	960.000,00 €	17.020.307,92 €	- €	27.735.009,58 €	77,42%
Fondi FOI	- €	- €	96.000,00 €	1.723.571,00 €	- €	1.819.571,00 €	5,08%
PNC	- €	- €	- €	- €	6.173,20 €	6.173,20 €	0,01%
Fondi Stato	- €	450.000,00 €	- €	- €	- €	450.000,00 €	1,26%
Risorse proprie	- €	591.513,53 €	373.779,65 €	4.589.069,73 €	- €	5.554.362,91 €	15,50%
Altro Pubblico	- €	- €	260.220,35 €	- €	- €	260.220,35 €	0,73%
Totale Missione	1.012.863,00 €	9.783.352,19 €	1.690.000,00 €	23.332.948,65 €	6.173,20 €	35.825.337,04 €	100,00%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 30 gennaio 2025

Nel dettaglio, il Comune di Lecco risulta soggetto attuatore di interventi di fondi PNRR pari 27.735.009,58 euro; a questi vanno aggiunte le risorse del Comune di 5.554.362,91 euro, i fondi FOI di 1.819.571,00 euro, fondi statali di 450.000,00 euro ed altri fondi pubblici di 260.220,35 euro: il valore complessivo dei progetti è di 35.825.337,04 euro, comprensivo del CUP finanziato dal PNC per 6.173,20 euro.

Grafico 1- Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC

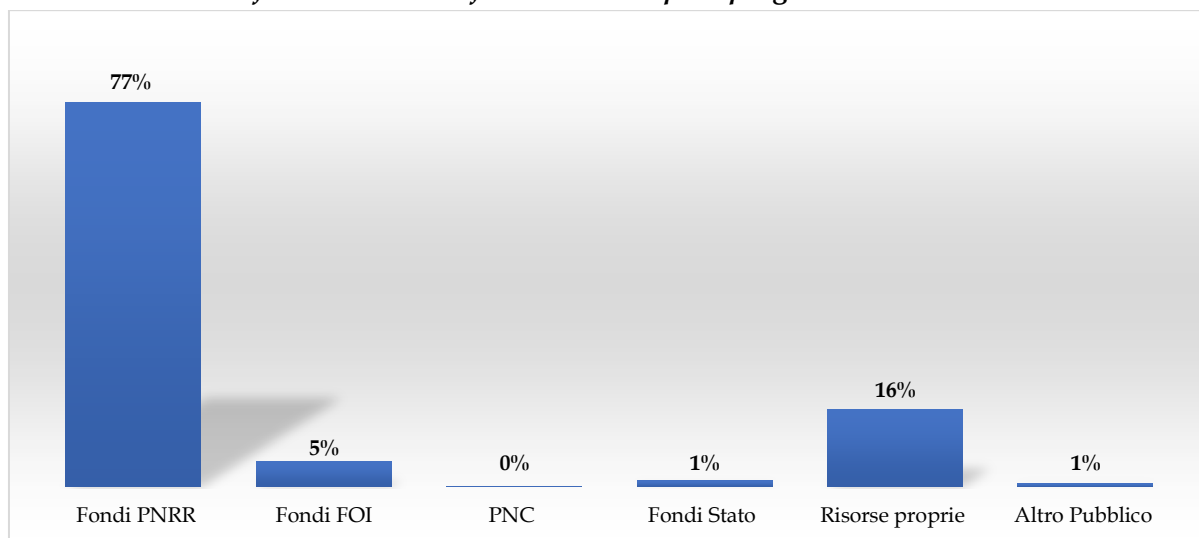

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 30 gennaio 2025.

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 77,42 per cento del totale, mentre quelle del Piano Nazionale Complementare (PNC) sono pari allo 0,02 per cento del totale. Il resto delle risorse proviene da fondi propri dell'Ente, dalle assegnazioni del Fondo per

le Opere Indifferibili (FOI)⁵, da risorse statali e da altri finanziamenti pubblici, che insieme contribuiscono con il 22,56% per cento dei fondi complessivi.

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla tabella in calce alla relazione).

*

1.1 Avanzamento procedurale

L'avanzamento procedurale di ogni singolo progetto è stato rilevato al **30 giugno 2024** sulla base di quanto dichiarato dai Revisori dell'Ente nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026.

Tabella 3 - Avanzamento procedurale al 30 giugno 2024


FASI	MISSIONE				PNC	Totale complessivo	% sul totale
	M1	M2	M4	M5			
In avvio	-	2	-	1	-	3	12%
Conferenza di servizi	-	1	-	-	-	1	4%
Aggiudicazione	-	1	-	-	-	1	4%
Stipula contratto	2	1	1	3	-	7	28%
Esecuzione lavori / fornitura	-	-	-	5	-	5	20%
Collaudo/certificato di regolare esecuzione	-	-	-	1	-	1	4%
Conclusi	4	-	-	-	-	4	16%
N.D.	1	1	-	-	1	3	12%
Totale complessivo	7	6	1	10	1	25	100%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base della Tabella PNRR.

Il grafico seguente fornisce in termini aggregati la percentuale dello stato di attuazione procedurale.

⁵ Per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il c.d. DL Aiuti - decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta. Nello specifico, l'articolo 26, comma 7, del predetto DL n. 50/2022 ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, finalizzato a consentire l'avvio entro il 31/12/2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. Allo stanziamento iniziale di complessivi 7.500 milioni di euro, sono stati aggiunti ulteriori 1.300 milioni, previsti dall'articolo 34 del DL n. 115/2022, per complessivi 8,8 miliardi di euro dal 2022 al 2027.
(https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili).

Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase)

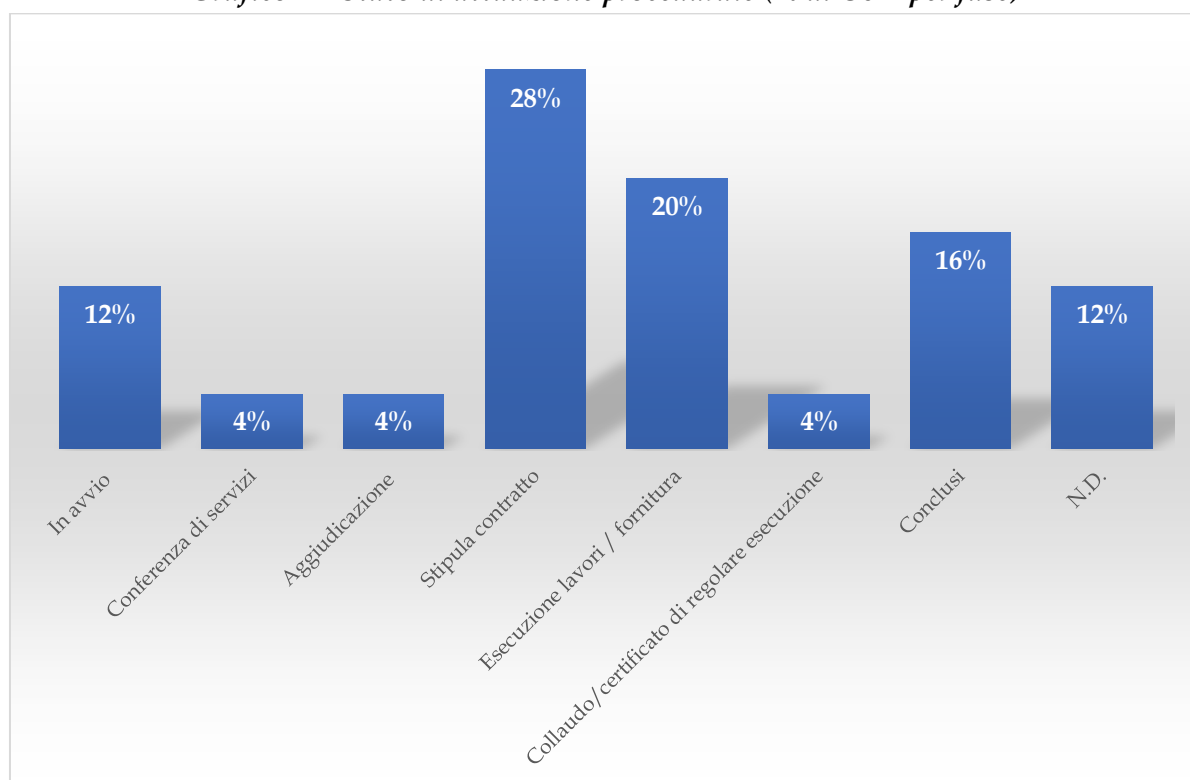

Fonte: Elaborazioni Corte dei Conti sulla base della tabella PNRR al 30 giugno 2024

La verifica su ReGiS alla data del 30 gennaio 2025 offre il quadro aggiornato per Missione e non distingue tra le diverse fasi: n. 18 progetti risultano *in corso di esecuzione* e n. 7 *conclusi*.

Tabella 4 - Avanzamento procedurale al 30 gennaio 2025

MISSIONI	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	% sul totale
In Corso	2	5	1	10	-	18	72%
Concluso	5	1	-	-	1	7	28%
Totale complessivo	7	6	1	10	1	25	100%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati Regis al 30 gennaio 2025.

Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un **cronoprogramma** predefinito dal PNRR a livello nazionale, per consentire l'accertamento degli obiettivi qualitativi e quantitativi (milestone e target) e favorire la tempestiva individuazione di eventuali ritardi (art. 8, co.5 D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021).

Con riguardo al rispetto da parte del Comune di Lecco del cronoprogramma, la Sezione ha esaminato le informazioni dei Revisori dell'Ente così come riportate nella Tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2024-2026.

Tabella 5 – Rispetto del cronoprogramma

Missione	Dato Mancante	CUP non in linea con il cronoprogramma	CUP in linea con il cronoprogramma	Totale complessivo	% CUP in linea con il cronoprogramma
M1	1	1	5	7	71%
M2	1	1	4	6	67%
M4	-	-	1	1	100%
M5	2	1	7	10	70%
PNC	1	-	-	1	0%
Totale complessivo	5	3	17	25	68%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base della Tabella PNRR al 30 giugno 2024

Dalla tabella si ricava che 17 CUP su 25 rispettano puntualmente il cronoprogramma, mentre l'informazione non è stata resa per 5 progetti.

In data 10 marzo 2025 l'Amministrazione ha trasmesso l'elenco aggiornato dei progetti attivi, corredato da una dettagliata relazione dalla quale si ricava, per i tre progetti per i quali emergeva un disallineamento rispetto al cronoprogramma, la situazione aggiornata e le criticità superate:

1. *M2-C2-4.4 rinnovo flotte bus e treni verdi 4.4.1 "10 bus"- la data di stipula del contratto era prevista entro il 31.01.2024 ma è avvenuta il 22.02.2024. Il contratto è in fase di esecuzione ed in linea con le successive due milestone di fornitura e collaudo previste rispettivamente il 30.03.2026 ed il 30.06.2026;*
2. *M5C2-I2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – **adeguamento e recupero Villa Manzoni** che hanno presentato ritardi nell'aggiudicazione e nei pagamenti. È stata chiesta e ottenuta la proroga ministeriale e la milestone è stata raggiunta. Ora i lavori procedono secondo cronoprogramma;*
3. *M1C3I1.2 **biblioteca no limite** - in data 12.08.2024 la ditta aggiudicataria ha comunicato di non poter procedere alla stipula del contratto e si è provveduto ad aggiudicare l'appalto al secondo in graduatoria. A causa di questo ritardo è stata*

chiesta al Ministero della Cultura la proroga al 30.09.2025 del termine dei lavori. La proroga è stata concessa e il contratto si trova in fase di esecuzione.

Per **cinque progetti** per i quali la Tabella dei Revisori non aveva indicato il cronoprogramma la memoria ha documentato che i termini sono rispettati:

1. M2C4I2.1.B -CUP D13H19000960004 Razionalizzazione del deflusso superficiale di versante e convogliamento a valle evitando dispersioni. In piattaforma REGIS l'intervento è interamente rendicontato come concluso e per tale ragione non era stato inserito nella Tabella PNRR trasmessa alla Sezione delle Autonomie;
2. PNC -A-1.1- CUP D11F23001250001 – Servizi digitali ed esperienza dei cittadini – integrazione Anpr-liste elettorali - è stata trasmessa richiesta di contributo a rimborso in data 14.11.2023 ed in data 19.12.2024 è stata validata e liquidato l'importo di euro 6.173,20;
3. M5C2-L.1.3.1- CUP D34H22000360006 -Povertà estrema - housing temporaneo – stazioni di posta. I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 233/2025. Si conferma la previsione di collaudo entro il 31.03.2026;
4. Interventi in ambito sociale: gli interventi sono in corso nel rispetto della tempistica prevista.
5. Misura 1.3.1. CUP D51F22008160006- Piattaforma digitale nazionale dati "PDND" il progetto risulta concluso, asseverato e liquidato in data 16.05.2024.

*

1.2 Avanzamento finanziario

L'art.15 del d.l. 77/2021 ha accelerato l'avvio degli interventi PNRR ammessi al finanziamento, stabilendo che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie che sono loro attribuite su specifici capitoli di spesa sin dalla data del decreto o atto di riparto, ovvero, ancora prima che le risorse risultino impegnate dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento.

Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l'accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa.

Lo stato di avanzamento finanziario di cui qui si riferisce riguarda le risorse impegnate in bilancio e lo stato dei pagamenti effettuati come risultano al 30 gennaio 2025 da ReGiS.

Le informazioni vengono riassunte in forma aggregata per Missione nella seguente tabella.

Tabella 6 - Avanzamento finanziario

Missione	n. CUP	Totale dei finanziamenti (€)	Impegni (€)	% impegni su totale dei finanziamenti	Pagamenti (€)	% pagamenti su totale degli impegni
M1	7	1.012.863,00 €	652.368,36 €	64%	450.185,53 €	69%
M2	6	9.783.352,19 €	9.142.605,86 €	93%	4.056.285,98 €	44%
M4	1	1.690.000,00 €	1.452.152,22 €	86%	220.326,44 €	15%
M5	10	23.332.948,65 €	16.284.052,53 €	70%	4.826.585,55 €	30%
PNC	1	6.173,20 €	6.173,20 €	100%	6.173,20 €	100%
Totale complessivo	25	35.825.337,04 €	27.537.352,17 €	77%	9.559.556,70 €	69%


Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati REGIS al 30 gennaio 2025.

Per i progetti della Missione 1 è stato impegnato l'importo di 652.368,36 euro, pari al 64 per cento dei finanziamenti e pagato l'importo 450.185,53 euro (69 per cento sul totale degli impegni), mentre per il progetto PNC è stato impegnato e pagato l'importo di 6.173,20 euro; per la Missione 2 risultano impegnati 9.142.605,86 euro (93 per cento dei finanziamenti) e pagati 4.056.285,98 euro (il 44 per cento); per la Missione 4 risultano impegnati 1.452.605,86 euro (86 per cento dei finanziamenti) e pagati 220.326,44 euro (il 15 per cento); per la Missione 5 risultano impegnati 16.284.052,53 euro (70 per cento dei finanziamenti) e pagati 4.826.585,55 euro (il 30 per cento).

Gli impegni complessivi sono pari a 27.537.352,17 euro, il 77 per cento sul totale dei finanziamenti; i pagamenti sono stati pari a 9.559.556,70 il 69 per cento sul totale degli impegni.

Per una migliore lettura si forniscono, anche in forma grafica, i dati aggiornati.

Grafico 3 - Avanzamento finanziario

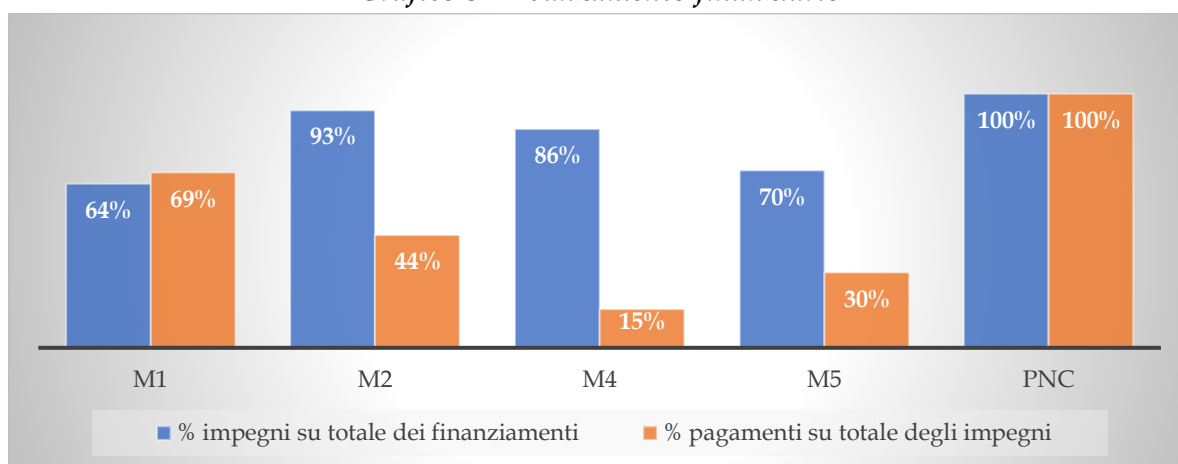

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024 e dei dati REGIS al 30 gennaio 2025.

Per quanto concerne le **anticipazioni**, il PNRR ha previsto che l'avvio dei progetti precede il finanziamento ma, per gli enti privi di capienza finanziaria e di risorse insufficienti, l'art. 9, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 152 del 2021 *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*, aveva previsto la possibilità di disporre di anticipi di liquidità, nella misura del **10 per cento** delle risorse complessive assegnate, su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale⁶.

Nel tempo sono intervenute modifiche del quadro normativo finalizzate a velocizzare i flussi finanziari del PNRR e, da ultimo, l'art. 18-quinquies *"disposizioni finanziarie in materia di PNRR"* del d.l. n. 113/2024 (conv. con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) ha previsto che *"le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento"*. Per l'attuazione di questa previsione è stato adottato il decreto MEF del 6 dicembre 2024 recante *"Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2025, i cui effetti potranno essere apprezzati nel successivo monitoraggio.

⁶ La contabilizzazione di questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso decreto, *"per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR"*.

Di seguito si espone lo stato delle anticipazioni erogate al Comune di Lecco, con le seguenti precisazioni.

I dati riportati nella tabella 7 sono riferiti a diverse soglie temporali: per l’anticipazione i dati sui pagamenti sono riferiti al 31 dicembre 2023, mentre le informazioni sull’importo complessivo del finanziamento PNRR, sugli impegni iscritti a bilancio e sul fondo pluriennale vincolato di spesa sono aggiornate al 30 giugno 2024.

Tabella 7- Anticipazioni PNRR

MISSIONE	CUP	Finanziamento PNRR al 30.6.2024	Anticipazione PNRR al 31.12.2023	% anticipazione su PNRR al 31 dicembre 2023	Impegni a valere su risorse PNRR e/o PNC al 30.6.2024	FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR al 30.6.2024	Pagamenti PNRR e/o PNC al 31.12.2023
M1	7	1.012.863,00 €	50.000,00 €	5%	318.821,95 €	- €	60.004,05 €
M2	6	8.741.838,66 €	871.683,86 €	10%	130.011,06 €	- €	13.829,92 €
M4	1	960.000,00 €	96.000,00 €	10%	96.175,51 €	- €	96.000,00 €
M5	10	17.020.307,92 €	4.002.792,37 €	24%	407.255,83 €	866.984,33 €	733.639,99 €
PNC	1	- €	- €	-	- €	- €	- €
Totale complessivo	25	27.735.009,58 €	5.020.476,23 €	18%	952.264,35 €	866.984,33 €	903.473,96 €

Fonte: elaborazione Corte dei Conti sulla base della Tabella PNRR dei Revisori

Per le Missioni 2 e 4 sono state concesse anticipazioni pari al 10 per cento del totale del PNRR, entro i limiti previsti, mentre per la Missione 5 è stato erogato il 24 per cento del contributo; infine, si registra un 5 per cento di anticipazioni anche sulla Missione 1 che, di regola, non beneficia di anticipazioni.

*

1.3 Progetti definanziati

La versione iniziale del PNRR (approvata dal Consiglio della UE del 13 luglio 2021) è stata oggetto finora di quattro modifiche⁷.

La più rilevante è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 ed è stata approvata dal Consiglio della UE l’8 dicembre 2023 con una rimodulazione e un incremento di 2,9 miliardi dei fondi UE a favore dell’Italia (attualmente pari a 194,4 miliardi) con l’inserimento della nuova Missione 7 (RePowerEU) ed altre modifiche alle misure originariamente previste. Queste ultime sono divenute necessarie per criticità di natura

⁷ la prima modifica, nel luglio 2023 è stata approvata dal Consiglio UE del 19 settembre 2023, ha riguardato milestones e targets (M&T). La seconda è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 e approvata dal Consiglio della UE l’8 dicembre 2023. La terza modifica, richiesta dal Governo il 4 marzo 2024 è stata approvata dal Consiglio della UE il 14 maggio 2024 (correzione di 55 errori materiali). La quarta modifica è stata richiesta dal Governo il 10 ottobre 2024 e approvata dal Consiglio della UE il 12 novembre 2024

oggettiva dovute principalmente all'aumento dei costi, alla scarsità di materiali, ai limiti del sistema produttivo⁸.

Dopo la revisione del PNRR, approvata con decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, alcune misure sono state de-finanziate totalmente o parzialmente ovvero sono state sostituite le fonti del finanziamento con fondi statali o di altra fonte europea.

Il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, ha riconosciuto l'esigenza di recuperare le necessarie risorse finanziarie per coprire il fabbisogno necessario per assicurare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano e al comma 8 ha riportato il quadro generale degli stanziamenti. La predetta normativa ha *salvaguardato i progetti con obbligazioni giuridicamente vincolanti*, vale a dire quelli per i quali vi sia stata l'assunzione dell'impegno contabile ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 oppure nei casi di stipula del contratto.

La norma ha, inoltre, previsto che, dopo l'individuazione degli interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento, nell'ipotesi di mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano rese indisponibili le relative risorse.

Sullo sfondo di tale inquadramento normativo si riferisce dei progetti che i Revisori del Comune di Lecco hanno elencato come definanziati: dall'istruttoria è emerso che sono stati totalmente definanziati **5 CUP**, tutti ricompresi nella Missione 2, per l'importo complessivo di **780.000,00 euro**.

Detti interventi, tutti conclusi, tranne uno in corso di esecuzione, sono stati rifinanziati con fondi provenienti dal bilancio statale.

⁸ La problematica è diffusamente esaminata nella nota di lavoro 2/2024 – la riforma del codice dei contratti e la rimodulazione del PNRR – Ufficio parlamentare del bilancio dicembre 2024

2. TEMPI DI RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTERI

Il PNRR è un piano di performance, essendo le erogazioni di risorse europee condizionate al soddisfacente raggiungimento di obiettivi (milestone e target) specificamente definiti nelle *Council Implementing Decision* del 6 luglio 2021, dell'8 dicembre 2023 e del 14 maggio 2024.

L'avanzamento delle iniziative di investimento e di riforma, cui sono ricollegate dotazioni finanziarie, richiede che i soggetti attuatori sostengano le spese necessarie per il pagamento dei fornitori di beni e servizi e degli esecutori di lavori, ovvero per i trasferimenti delle somme ai beneficiari delle misure. I conseguenti oneri, rilevati inizialmente a carico di proprie risorse dagli attuatori/gestori o finanziati con le **anticipazioni di liquidità** messe a disposizione dal quadro regolamentare, sono poi oggetto di rimborso da parte delle Amministrazioni centrali titolari delle misure (cfr. n. 59//SSRRCO/REF/2024).

Il rimborso degli oneri sostenuti è subordinato all'espletamento degli adempimenti di rendicontazione da parte dei soggetti attuatori, cui segue una fase di controllo da parte delle Amministrazioni titolari della misura sia formale che sostanziale, anche a campione, sulla regolarità delle spese e delle procedure rendicontate dagli attuatori. L'ultimo step della rendicontazione della spesa, gestito dall'Ispettorato generale PNRR, è quello dell'erogazione delle somme a rimborso.

Il Comune di Lecco nel riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024 ha dichiarato di aver inoltrato la rendicontazione per n. **15** progetti.

I tempi di rimborso di 13 progetti rendicontati vanno da **44 a 212 giorni**, mentre per 2 sono state richieste integrazioni istruttorie.

3. CRITICITA' NELL'ATTUAZIONE

Il Comune di Lecco nella risposta istruttoria del 16 dicembre 2024 ha segnalato alcune difficoltà - poi risolte - nella realizzazione dei seguenti interventi:

- D11F22002850006 - Piattaforma notifiche digitali – fondi PNRR 59.966,00 euro. Vi sono stati ritardi per l'accesso alla piattaforma regionale e alla gestione intersettoriale comunale e difficoltà nella compilazione. La criticità è stata risolta e il finanziamento liquidato;
- D17G22000210001 - Biblioteca Uberto Pozzoli e giardini – fondi PNRR 500.000,00 euro. Sono state chieste integrazioni progettuali dalla Soprintendenza in sede di acquisizione del relativo parere. L' integrazione è stata completata e la Soprintendenza ha espresso parere favorevole condizionato;
- D10J22000010001 - Fornitura di autobus – fondi PNRR di 5.613.159,00 euro. Il Comune ha incontrato difficoltà per il notevole quantitativo di documentazione da inserire (la nota non specifica se nella piattaforma ministeriale ovvero in ReGiS).

Per 4 progetti sarà necessaria la rimodulazione dell'intervento per l'esigenza, insorta in corso d'opera, di modifiche progettuali.

*

a. Aumento dei costi

Tra le criticità rilevate in sede di attuazione del PNRR vi è stato il significativo e progressivo incremento dei prezzi.

Il contesto geopolitico ed economico internazionale ha, da tempo, intensificato tensioni nei prezzi dei beni energetici e determinato spinte inflazionistiche i cui effetti si sono riverberati significativamente sulla dinamica delle spese nei diversi settori produttivi.

Poco tempo dopo l'approvazione del PNRR, nella consapevolezza del costante incremento dei prezzi, il Governo ha introdotto il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - FOI, con il DL 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022.

Successivamente, per fronteggiare l'aumento dei costi e favorire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, nel secondo semestre 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto 11 luglio 2023 per l'assegnazione di ulteriori risorse al fine di consentire l'affidamento dei lavori con prezzi adeguati ai rincari.

Il primo monitoraggio sull'aumento dei prezzi per i progetti finanziati dal PNRR è stato effettuato dalla Banca d'Italia nella relazione del maggio 2023 evidenziando che *"In relazione all'aumento dei prezzi di materie prime e materiali da costruzione, si stima che alla fine del 2022 il costo dei progetti inclusi nel Piano era cresciuto in media di circa il 10 per cento rispetto a quanto inizialmente preventivato."*⁹.

Dati e documenti più dettagliati sono stati elaborati dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, che nella Relazione del novembre 2023 ha affermato che *"...Guardando il dato aggregato, ponderato in base al peso della spesa associata agli interventi, si può stimare che con l'attuale livello dei prezzi l'aumento di prezzo ponderato per la produzione dei beni e servizi nell'ambito del PNRR sia nell'ordine del 10,7 per cento..."*¹⁰.

La successiva Relazione sul PNRR al Parlamento del maggio 2024 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti sottolinea come *"..In circa un terzo dei casi, le scelte di rifinanziamento riguardano iniziative di investimento per le quali le modifiche hanno trovato giustificazione nell'aumento dei costi stimati a causa dell'inflazione; in altrettante ipotesi le ragioni alla base dei rifinanziamenti sono riscontrabili nell'esigenza di attuare alternative migliori per conseguire il medesimo livello di ambizione originariamente fissato ovvero in cambiamenti nella domanda di mercato.." (cfr. (n. 41/ SSRRCO/REF/2024).*

⁹ Lo stato di attuazione del PNRR in Banca d'Italia, Relazione annuale sul 2022

¹⁰ Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo – novembre 2023 - Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108- cfr. n. 34/ SSRRCO/REF/2023

Il Comune nel riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024 ha segnalato un significativo aumento dei costi per alcuni progetti, senza specificare quali risorse saranno utilizzate.

Nella nota istruttoria del 10 marzo 2025 l'Amministrazione ha evidenziato l'incremento dei costi per i seguenti progetti:

- b. M5C2-I2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – adeguamento e recupero Villa Manzoni: CUP D15F20004690004: si è resa necessaria una modifica contrattuale per adeguare il progetto esecutivo dell'opera con incremento del quadro economico (determinazione n. 1212 del 27.08.2024). Per far fronte all'aumento dei prezzi, il Comune di Lecco ha finanziato l'incremento del progetto da euro 3.885.000,00 ad euro 4.335.100 con avanzo di amministrazione pari a euro 470.100,00.*
- c. M5C2-L1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità – riqualificazione ex alloggio custode scuola S. Stefano CUP D34H22000340006: con determinazione n. 922/2024, il quadro economico è stato rivisto in aumento di euro 100.000,00. Tale somma è stata finanziata con la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione. I lavori sono stati aggiudicati, il contratto è stato stipulato e i lavori sono prossimi all'avvio. È stata confermata la previsione di collaudo prevista entro il 31.03.2026.*

4. APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI

Il Comune nel riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024 ha dichiarato di aver proceduto alla contabilizzazione dei singoli interventi e alla costituzione di avanzo vincolato e/o fondo pluriennale vincolato.

Per ogni intervento è stato creato un apposito capitolo di entrata e spesa con l'indicazione della misura, la descrizione del progetto ed il CUP di riferimento; è stato attivato un sistema informatico che traccia il flusso dall'assunzione della determinazione dirigenziale all'emissione del mandato di pagamento e della reversale di incasso.

Questo sistema consente in qualsiasi momento di verificare impegni/accertamenti e mandati/reversali collegati, ognuno dei quali riporta tutte le indicazioni dell'intervento e della misura PNRR collegata.

5. SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il Comune di Lecco in occasione del primo monitoraggio aveva dichiarato di aver individuato un Dirigente referente per l'attuazione dei piani e progetti del PNRR (delibera n. 255/2022/GEST).

Nel riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024 ha rappresentato che non sono stati apportati correttivi al sistema dei controlli interni e/o della governance.

La Sezione, visti gli esiti dell'istruttoria dalla quale risulta la conclusione di 7 progetti e un buon livello di esecuzione degli altri 18, nonché l'elevata percentuale di conformità al cronoprogramma, rileva come la struttura organizzativa abbia assicurato un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

La Sezione ha verificato la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di una sezione dedicata ai progetti PNRR, aggiornata con regolarità.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione, sulla base delle informazioni contenute nella Tabella PNRR compilata dai revisori dell'Ente allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 (che contiene informazioni circa dati di bilancio al 31 dicembre 2023 e sullo stato di avanzamento dei progetti al 30 giugno 2024), della piattaforma ReGiS consultata in data 30 gennaio 2025 e degli aggiornamenti contenuti nelle memorie e documenti del 16 dicembre 2024 e del 10 marzo 2025, si possono formulare le seguenti conclusioni:

- I. il Comune di Lecco risulta soggetto attuatore di **n. 25 progetti** identificati attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP);
- II. le **fonti del finanziamento** sono costituite da fondi del PNRR pari a **27.735.009,58 euro**; a questi vanno aggiunte le risorse proprie del Comune di euro 5.554.362,91, fondi FOI per euro 1.819.571,00, fondi dello Stato per euro 450.000,00 ed altri fondi pubblici per euro 260.220,30. Il valore complessivo dei progetti è di **euro 35.825.337,04** comprensivo della quota di PNC pari ad euro 6.173,20.
- III. **l'avanzamento procedurale**: secondo quanto certificato dai Revisori nella Tabella PNRR al 30 giugno 2024, n. 12 progetti sono nella fase iniziale (avviati, conferenza di servizi, aggiudicazione e stipula del contratto), n. 5 in corso di esecuzione, n. 5 ultimati mentre per n. 3 non sono state trasmesse e/o acquisite informazioni;
- IV. **l'avanzamento procedurale**: il riscontro su ReGiS aggiornato al 30 gennaio 2025 evidenzia n. 18 progetti in corso di esecuzione e n. 7 conclusi;
- V. **il cronoprogramma**: la Tabella PNRR al 30 giugno 2024 attesta che 17 CUP su 25 rispettano puntualmente il cronoprogramma, 3 CUP non sono in linea con il cronoprogramma. Dalla nota istruttoria del 10 marzo 2025 emerge che tutti gli interventi sono in linea con il cronoprogramma;
- VI. **l'avanzamento finanziario** risultante da ReGiS evidenzia, al 30 gennaio 2025, risorse complessivamente impegnate pari a euro **27.537.352,17**.

Risultano effettuati pagamenti per euro **9.559.556,70**. Per i progetti della Missione 1 è stato impegnato l'importo di 652.368,36 euro, pari al 64 per cento dei finanziamenti e pagati 450.185,53 (69 per cento sul totale degli impegni), mentre per il progetto PNC è stato impegnato e pagato l'importo di 6.173,20 euro; per la Missione 2 risultano impegnati 9.142.605,86 euro, il 93 per cento dei finanziamenti e pagati 4.056.285,98 euro (il 44 per cento); per la Missione 4 risultano impegnati 1.452.605,86 euro l' 86 per cento dei finanziamenti e pagati 220.326,44 euro (il 15 per cento); per la Missione 5 risultano impegnati 16.284.052,53 euro il 70 per cento dei finanziamenti e pagati 4.826.585,55 euro (il 30 per cento). Gli impegni complessivi sono pari a 27.537.352,17 euro, il 77 per cento sul totale dei finanziamenti; i pagamenti assommano a 9.559.556,70 euro;

- VII. le **anticipazioni** corrisposte al 31 dicembre 2023 sono pari a **5.020.476,23** euro, il 18% dei progetti finanziati dal PNRR;
- VIII. sono stati **definanziati 5 CUP** ricompresi nella M2, inizialmente finanziati con fondi PNRR/PNC per un importo di 780.000,00 euro. Tra i progetti definanziati 4 sono ultimati e 1 in corso di esecuzione e la relativa copertura è stata assicurata da risorse statali;
- IX. alla data del 16 dicembre 2024 l'Ente ha trasmesso alle Amministrazioni titolari il **rendiconto** per n. 15 interventi. I tempi di rimborso di n. 13 progetti sono compresi tra 44 a 212 giorni, mentre per gli altri 2 sono state richieste integrazioni istruttorie;
- X. sono state rilevate **criticità** nella realizzazione per problematiche tecniche e giuridiche. È stato riscontrato l'incremento dei prezzi per due progetti per far fronte al quale l'Ente ha utilizzato l'avanzo di amministrazione;
- XI. sono state regolarmente **applicate le norme contabili**, procedendo alla contabilizzazione dei singoli interventi e alla costituzione di avanzo vincolato e/o fondo pluriennale vincolato. Risulta disciplinata la modalità di tracciamento del flusso finanziario delle singole transazioni e creato un capitolo di spesa per ciascun CUP;

- XII. non sono stati apportati correttivi al pregresso sistema dei controlli interni e/o della governance ma la Sezione, visti gli esiti dell'istruttoria che ha evidenziato la conclusione di 7 progetti e un buon livello di esecuzione degli altri 18 e le attività previste in linea con il cronoprogramma, rileva come la struttura organizzativa predisposta nel 2022 abbia assicurato un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.
- XIII. sul **sito istituzionale** dell'Ente si provvede al regolare aggiornamento della sezione dedicata al PNRR.

Tabella 8 – Elenco dei CUP dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Lecco

N.	MISSIONE	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
1	M1	D11F22000080006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	CONCLUSI	Termini rispettati	Concluso
2	M1	D11F22000090006	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	CONCLUSI	Termini rispettati	Concluso
3	M1	D11F22000100006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	CONCLUSI	Termini rispettati	Concluso
4	M1	D11F22000320006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA DIAZ 1*SERVIZIO SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
5	M1	D11F22002850006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*"NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA""NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA"	CONCLUSI	Termini rispettati	Concluso
6	M1	D17G22000210001	BIBLIOTECA CIVICA UBERTO POZZOLI E GIARDINI - LECCO*VIA GIUSEPPE BOVARA, 58*LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSIBILITÀ AI GIARDINI DELLA BIBLIOTECA UBERTO POZZOLI DI LECCO	STIPULA CONTRATTO	Termini NON rispettati	In Corso
7	M1	D51F22008160006	1.3.1C_E507COMUNE DI LECCO	N.D.	N.D.	Concluso
8	M2	D10J22000010001	FORNITURA DI AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA E RELATIVE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALL'ALIMENTAZIONE PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*COMUNE DI LECCO*AUTOBUS VARIE TIPOLOGIE	STIPULA CONTRATTO	Termini NON rispettati	In Corso
9	M2	D11E22000220001	DIGITALIZZAZIONE SEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, IN OTTICA SMART CITY (ISOLE INTERRATE)	AVVIO	Termini rispettati	In Corso

N.	MISSIONE	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
10	M2	D11E22000230001	DIGITALIZZAZIONE SEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, IN OTTICA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE (SMART BIN)	AVVIO	Termini rispettati	In Corso
11	M2	D12F22001050005	REALIZZAZIONE NUOVO "CENTRO DEL RIUSO 4,0"IN AREA OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	CONFERENZA SERVIZI	Termini rispettati	In Corso
12	M2	D12F23000120004	REALIZZAZIONE NUOVO "CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 4.0" IN AREA OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	AGGIUDICAZIONE	Termini rispettati	In Corso
13	M2	D13H19000960004	RAZIONALIZZAZIONE DEL DEFLUSSO SUPERFICIALE DI VERSANTE E CONVOGLIAMENTO A VALLE EVITANDO DISPERSIONI. EVENTUALE NECESSIT DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CONDIZIONI DI EQUILIBRIO PRECARIO O GI CROLLATI PER UN EFFICACE RIPRISTINO DEL DRENAGGIO	N.D.	N.D	Concluso
14	M4	D15E22000160006	NUOVO ASILO VIA TIMAVO*VIA TIMAVO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA STRUTTURA SU UN'UNICA PIANTA DEL NUOVO ASILO NIDO DI VIA TIMAVO	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
15	M5	D13D21001770004	RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT CITTA' DI LECCO*VIA LUNGO LAGO (VIE DIVERSE)*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT (LUNGO LAGO) CITTA' DI LECCO	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
16	M5	D14H20001270004	IMMOBILI PRESENTI NELL'AREA "EX PICCOLA VELOCITÀ"*VIA GIOVANNI AMENDOLA*LAVORI DI RECUPERO IMMOBILI PRESSO L'AREA EX PICCOLA VELOCITÀ	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
17	M5	D15F20004690004	MUSEO VILLA MANZONI*VIA DON GUANELLA 1*LAVORI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO DI VILLA MANZONI	STIPULA CONTRATTO	Termini NON rispettati	In Corso
18	M5	D15H20000160004	RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DEGLI ISITUTI BERTACCHI E BOVARA*VIA XI EBBRAIO*REALIZZAZIONE DI ATREZZATURE SPORTIVE E DI NUOVI ACCESSI PEDONALI IN	COLLAUDO/C.R.E.	Termini rispettati	In Corso

N.	MISSIONE	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
			COLLEGAMENTO CON LE AREE PUBBLICHE DI CORSO MATTEOTTI E DEL COMPARTO 'BROLETTO SUD'			
19	M5	D34H22000310006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO*RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI. POTENZIAMENTO DELLE RETE INTEGRATA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DOMICILIARITÀ.	ESECUZIONE	Termini rispettati	In Corso
20	M5	D34H22000330006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO*RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE.	AVVIO	N.D.	In Corso
21	M5	D34H22000340006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE E LAVORO.	ESECUZIONE	Termini rispettati	In Corso
22	M5	D34H22000360006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALI DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO*HOUSING TEMPORANEO	ESECUZIONE	N.D.	In Corso
23	M5	D34H22000410006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO*STAZIONI DI POSTA	ESECUZIONE	Termini rispettati	In Corso
24	M5	D54H22000330006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO*SERVIZI PER IL SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	ESECUZIONE	Termini rispettati	In Corso
25	PNC	D11F23001250001	ANPR097042LECCO	N.D.	N.D.	Concluso

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base della tabella PNRR e di ReGiS al 30.01.2025

