



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI MILANO
CONTROLLO SULLA GESTIONE
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE n. 72/2025/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: ANTONIO BUCCARELLI

MAGISTRATO RELATORE: CONS. VITTORIA CERASI

Hanno collaborato

Dott.ssa Francesca Perreca

Dott.ssa Michela Ricciardi



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere (Relatore)
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato, Prot. 175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTE le deliberazioni SRCLOM/208/2022/GEST, SRCLOM/314/2023/GEST sulla ricognizione e attuazione dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Milano;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2024/INPR "sulla Programmazione delle attività per l'anno 2024";

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 45/2024/INPR con cui la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2024/INPR "Linee Guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266";

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 59/2024/REF "Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) nel primo semestre 2024, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77";

VISTO il riscontro del 11 dicembre 2024, prot. Cdc n. 23495, con cui il Comune di Milano ha risposto alla nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 11 novembre 2024, prot. n. 22378, sullo stato di attuazione del PNRR;

VISTA l'ordinanza n. 34 del 26 febbraio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Adunanza pubblica;

VISTA la memoria in merito all'attuazione dei progetti PNRR trasmessa il 10 marzo 2025, prot. Cdc n. 3210;

UDITO il relatore, Cons. Vittoria Cerasi

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di Milano, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Milano, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'organo di revisione del Comune.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025.

il Relatore
(Cons. Vittoria Cerasi)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

3 aprile 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI MILANO
CONTROLLO SULLA GESTIONE
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

SOMMARIO

1. Stato di attuazione degli interventi	10
1.1 <i>Avanzamento procedurale</i>	14
1.2 <i>Avanzamento finanziario</i>	17
1.3 <i>Progetti defINANZIATI</i>	20
1.3.1 <i>Progetti totalmente defINANZIATI</i>	22
1.3.2 <i>Progetti parzialmente defINANZIATI</i>	23
2. Tempi di rimborso da parte dei ministeri	27
3. Applicazione delle norme contabili	29
4. Sistema di monitoraggio del comune	31
4.1 <i>La governance del PNRR</i>	31
4.2 <i>Sistema dei controlli interni</i>	31
5. Contraddittorio pubblico	33
6. Valutazioni conclusive	36
Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per Missione e per tipologia	11
Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei progetti PNRR e PNC (in euro)	12
Tabella 3 - Aggiornamento avanzamento procedurale al 30 gennaio 2025	15
Tabella 4 - Avanzamento finanziario	17
Tabella 5 - Anticipazione al 31 dicembre 2023	19
Tabella 6 - Progetti totalmente defINANZIATI	22
Tabella 7- Progetti parzialmente defINANZIATI	24
Tabella 8 - Rimborsi	27
Tabella 9 - Elenco dettagliato per CUP dei progetti per stato di attuazione	39
Grafico 1 - Fonti del finanziamento dei progetti del PNRR e del PNC	13
Grafico 2 - Stato di attuazione procedurale al 30 giugno 2024.....	15
Grafico 3 - Stato di attuazione finanziaria (pagamenti su impegni) per Missione.....	18

1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In continuità con la deliberazione n. 314/2023/GEST, in relazione alle attività programmate nella deliberazione n. 45/2024/INPR da questa Sezione regionale si è proceduto al monitoraggio dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui il Comune di Milano è soggetto attuatore o beneficiario all'interno di una o più Missioni e relative Componenti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.

La Sezione ha potuto verificare lo stato di avanzamento sull'insieme degli interventi di cui il Comune di Milano è soggetto attuatore avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria, avendo attinto ai dati disponibili sulla piattaforma ReGiS¹ e nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026. Quest'ultima fonte informativa è frutto dell'adempimento² richiesto ai revisori dei conti dell'ente locale dalla Sezione delle Autonomie; si tratta di una cartella Excel in cui vengono inserite informazioni circa l'avanzamento finanziario al 31 dicembre 2023 e lo stato di attuazione dei singoli progetti del PNRR e PNC al 30 giugno 2024.

Innanzitutto, si è proceduto ad un controllo puntuale dell'elenco dei progetti individuati da un Codice Unico di Progetto (CUP) finanziati con fondi PNRR e PNC. Laddove si è riscontrata una discrasia sono stati richiesti chiarimenti all'Ente per poter giungere ad un insieme "omogeneo" dei progetti su cui svolgere l'analisi, tenendo conto anche che, a seguito della decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023, alcuni progetti sono stati defINANZIATI.

¹ Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che *"i soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza."* Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

² La Sezione delle Autonomie in allegato alle Linee Guida sul bilancio di previsione 2024-2026 (Deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR) ha richiesto ai revisori dei conti degli enti locali di compilare una tabella con i dati relativi ai progetti attivati, fornendo informazioni circa lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei singoli CUP. I revisori hanno dovuto trasmettere la "Tabella PNRR" non oltre il termine del 30 settembre 2024. È bene chiarire che, mentre lo stato di avanzamento procedurale si riferisce al 30 settembre 2024, lo stato dell'avanzamento finanziario è quello accertato dai dati di bilancio al 31 dicembre 2023. Per rappresentare lo stato degli impegni e dei pagamenti si è attinto alle informazioni aggiornate alla data 30 gennaio 2025 dalla piattaforma ReGiS.

Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Attuazione del PNRR del Comune di Milano, controllo sulla gestione

Dall'esame della Tabella PNRR compilata dall'Organo di revisione dell'Ente, sono stati evidenziati n. 94 CUP per il Comune di Milano, da cui sono stati sottratti n. 7 CUP relativi a progetti di cui l'Ente non è soggetto attuatore. Dai risultanti n. 87 CUP, ulteriori n. 6 CUP sono stati "totalmente definanziati" dal PNRR per effetto della rimodulazione intervenuta in seguito alla citata decisione del Consiglio UE. Dall'analisi effettuata residuano quindi n. 81 CUP. È da rilevare che n. 1 CUP (B45B22002220001) è stato revocato e ricondotto al CUP originario, come risulta sulla piattaforma ReGiS (B41B18001080004).

Dalla Piattaforma ReGiS, alla data del 30 gennaio 2025, risultano invece n. 83 CUP, ponendosi un problema di corrispondenza dei dati tra le due fonti di informazione. Di fatto, da questi, occorre eliminare n. 5 CUP, uno cancellato e n. 4 totalmente definanziati. Inoltre, vi è da osservare che, dei restanti n. 78 CUP, mentre uno (B44E07000120004) è presente due volte, riferito a due Missioni diverse: "CUP 6 - ID 94 Comune di Milano (M5C2-PINQUA)" e "Strade comunali Piazza Zavattari (M2C2)", devono essere aggiunti n. 4 CUP, nonostante non si preveda una loro rendicontazione sulla piattaforma ReGiS, in quanto n. 2 CUP finanziati con il PNC e n. 2 CUP relativi a progetti della Cybersecurity. Si è così ottenuta l'ottimale conciliazione tra i CUP nella Tabella PNRR e i dati estratti dalla piattaforma ReGiS.

Dunque, gli interventi di cui il Comune di Milano è soggetto attuatore sono n. 81, a cui sono associati n. 82 CUP (uno dei CUP è doppio) poiché un intervento è finanziato su due Missioni (M2 e M5). Gli interventi all'esito dell'attività istruttoria e dall'esame delle fonti esaminate sono rappresentati nella seguente tabella, aggregati per Missione.

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per Missione e per tipologia

	n. CUP	Lump Sum	non nativi PNRR
M1 - Digitalizzazione della PA	11	4(*)	-
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	22	-	13
M4 - Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido	5	-	3
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	42	-	-
Totale	80	4	16
Piano Nazionale Complementare	2	-	-
Totale	82		

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base della Tabella PNRR e dal riscontro dell'Ente (*).

Nota: il CUP doppio (B44E07000120004) è suddiviso sulle due missioni M2 e M5.

Dalla tabella si osserva come n. 4 progetti sono della tipologia *Lump-Sum*³ e si trovano nell’ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA). Dalla Tabella PNRR della Sezione delle Autonomie risultano n. 16 progetti della tipologia “*non nativi PNRR*” (anche detti progetti “in essere”), la cui origine ha preceduto il PNRR, in cui sono stati poi successivamente inseriti tra i progetti finanziabili⁴. In particolare, n. 13 nella Missione M2, mentre n. 3 nella Missione M4.

Nella tabella che segue si rappresentano le fonti del finanziamento, considerando l’insieme dei progetti aggregati per Missione.

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei progetti PNRR e PNC (in euro)

	Fondi PNRR	Fondi PNC	FOI	Fondi Ente	altri fondi	Fondi UE	Fondi totali	Perc.del totale
M1	18.040.662,00						18.040.662,00	1,7%
M2	452.715.002,60		19.435.598,21	47.363.854,32	3.176.936,94	4.859.816,33	527.551.208,40	49,1%
M4	45.920.000,00		1.592.000,00	28.848.245,39			76.360.245,39	7,1%
M5	205.825.236,60	5.222.269,28	19.960.817,91	44.048.424,91	21.709.923,71	9.000.000,00	305.766.672,41	28,5%
TOT.	722.500.901,20	5.222.269,28	40.988.416,12	120.260.524,62	24.886.860,65	13.859.816,33	927.718.788,20	86,3%
PNC		111.074.000,00	16.661.100,00	19.001.000,00			146.736.100,00	13,7%
TOT.	722.500.901,20	116.296.269,28	57.649.516,12	139.261.524,62	24.886.860,65	13.859.816,33	1.074.454.888,20	100,0%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS (dati al 30 gennaio 2025)
Nota: il CUP doppio (B44E07000120004) è finanziato per un totale di €46.800.000 su due missioni, la M2 e la M5.

Il Comune di Milano risulta essere soggetto attuatore per un ammontare complessivo di 838,8 milioni, di cui 722,5 milioni dal PNRR e 116,3 milioni dal PNC. Sommando i fondi PNRR e PNC ad altri fondi pubblici (FOI, fondi UE e dello Stato) il finanziamento complessivo ammonta a 1 miliardo e 74 milioni circa.


Distinguendo tra le diverse Missioni, la quota maggiore delle risorse si rinviene nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), pari a quasi il 50 per cento del totale dei fondi, a cui segue la Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le

³ Si tratta di misure che assegnano contributi forfettari, diversamente dagli altri interventi del PNRR. Per tali misure non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell’obiettivo assegnato, a seguito della quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Inoltre, per questi progetti non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un’unica soluzione a obiettivo raggiunto e verificato.

⁴ In quanto progetti non originati nell’ambito del PNRR, occorre che nella fase di rendicontazione possano soddisfare i vincoli posti dal piano, quale per esempio i vincoli di sostenibilità ambientale, noti con l’acronimo DNSH (*Do Not Significant Harm*), ovvero che non arrechino danni agli obiettivi di salvaguardia ambientale.

comunità) con il 29 per cento circa dei fondi totali, nonostante in quest'ultima vi si concentri il 50 per cento circa dei progetti.

Grafico 1 – Fonti del finanziamento dei progetti del PNRR e del PNC

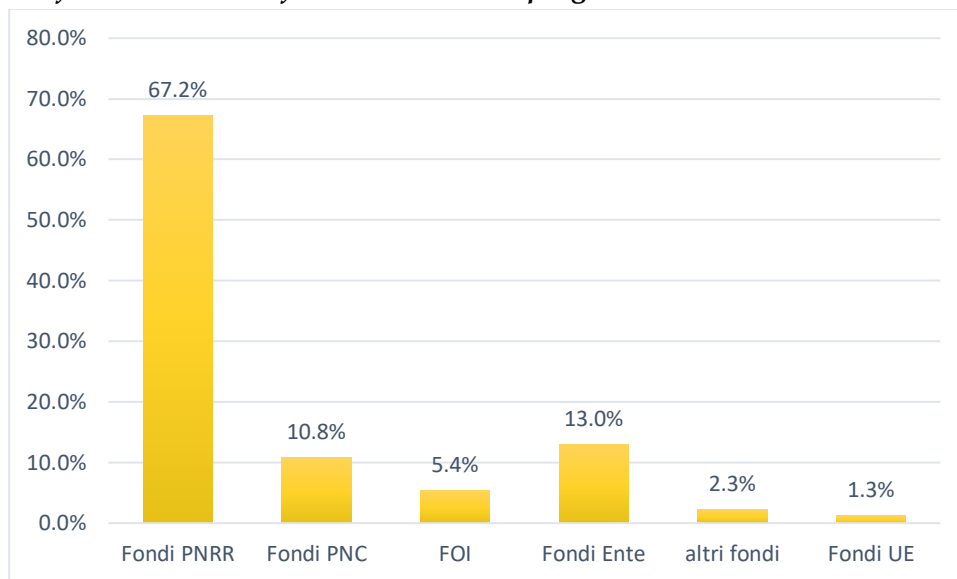

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS (dati al 30 gennaio 2025)

La Sezione ha potuto accertare che le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 67 per cento del totale, mentre le risorse del PNC, ovvero del fondo statale complementare che segue sia per la rendicontazione sia per l'attuazione le stesse procedure del PNRR, sono pari all'11 per cento del totale. Il resto delle risorse proviene da fondi propri dell'Ente per il 13 per cento, dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI)⁵, per il 5,4 per cento, a cui si devono aggiungere il 2,3 per cento di altri fondi statali e l'1,3 per cento di fondi europei.

⁵ Per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta. Nello specifico, l'articolo 26, comma 7, del predetto DL n. 50/2022 ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. Allo stanziamento iniziale di complessivi 7.500 milioni di euro, sono stati aggiunti ulteriori 1.300 milioni, previsti dall'articolo 34 del DL n. 115/2022, per complessivi 8,8 miliardi di euro dal 2022 al 2027.

(https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/).

Per una descrizione più dettagliata dei singoli interventi e del loro finanziamento si rimanda al sito del Comune di Milano sezione “Amministrazione Trasparente”⁶.

1.1 Avanzamento procedurale

È stato possibile accertare lo stato di avanzamento procedurale dei progetti di cui il Comune di Milano è soggetto attuatore attingendo a due fonti di informazioni: la tabella PNRR, che riporta quanto riferito dai revisori dell’Ente relativamente allo stato di attuazione per ciascun CUP alla data del 30 giugno 2024 in relazione alle fasi della procedura, nonché la piattaforma ReGiS alla data del 30 gennaio 2025 quanto allo stato del singolo CUP (“in corso/concluso”).

Sulla base di quanto emerge dalla Tabella PNRR, si rileva la seguente situazione complessiva:


- n. 7 CUP raggruppati nella voce “Altro”, in cui sono comprese anche le fasi di erogazione finanziamento; progettazione esecutiva; PFTE rafforzato e pubblicazione bando di gara;
- n. 17 CUP risultano nella fase di stipula contratto, di cui n. 2 sono “progetti in essere” (Missione M2C2I4.01) - a valere su bilancio comunale - finanziati prima dal DM 344/2020 e poi confluiti nel PNRR con DM 120/2023;
- n. 51 CUP risultano in fase di esecuzione. Di questi n. 4 CUP sono “progetti in essere”, di cui n. 3 (Missione M2C2I4.01) a valere su bilancio comunale, finanziati prima dal DM 344/2020 e poi confluiti nel PNRR con DM 120/2023, e n. 1 (Missione M2C2I4.04) a valere su bilancio comunale, confluito nel PNRR con comunicazione del MIT prot. 3336 del 26 ottobre 2023;
- n. 6 CUP sono nella fase di collaudo. Risultano tutti “progetti in essere” a valere sul bilancio comunale, finanziati prima dal DM 344/2020 e poi confluiti nel PNRR con DM 120/2023 nella M2C2I4.01- Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie);
- n. 1 CUP (B49I22002730006 - M1C3I1.02-Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura) risulta concluso.

La Sezione sulla base dei dati ha, quindi, potuto accertare la fase procedurale di ogni singolo progetto del PNRR o del PNC del Comune di Milano.

⁶ <https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/pnrr-fondi-europei-e-nazionali/pnrr#navpageinside>

Il grafico seguente ne fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale.

Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale al 30 giugno 2024

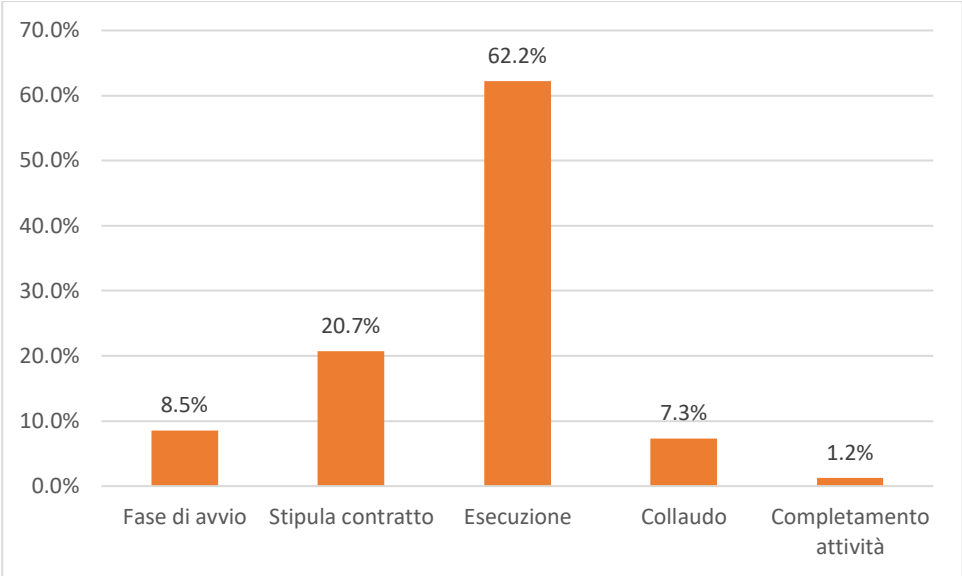

Fonte: Elaborazione Corte dei conti - Tabella PNRR

Il grafico consente di verificare lo stato di avanzamento procedurale al 30 giugno 2024, tenuto conto di quanto indicato dai revisori dei conti nella tabella PNRR. Dal suo esame emerge che oltre il 62 per cento dei progetti è in fase di “esecuzione”, mentre il 29 per cento risulta in una fase precedente e solo n. 7 progetti (8,5 per cento) sono nella fase conclusiva.

Un aggiornamento dell’avanzamento procedurale di ciascun progetto si può ricavare a partire dai dati della piattaforma ReGiS al 30 gennaio 2025. Nella tabella che segue si rappresenta lo stato dei CUP conclusi o ancora in corso per ciascuna Missione, nonché dei progetti in essere e dei progetti *Lump Sum*, come riferito dall’Ente in sede di riscontro istruttorio.

Tabella 3 – Aggiornamento avanzamento procedurale al 30 gennaio 2025

	CUP	CUP conclusi	CUP in corso	% CUP conclusi sul totale dei CUP	Progetti Lump Sum	Progetti “non nativi” PNRR
M1	11	3	8	27%	4	0
M2	22	7	15	32%	0	13
M4	5		5	0%	0	3
M5	42		42	0%	0	0
PNC	2		2	0	0	0
	82	10	72	12%	4	16

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati rilevati sulla piattaforma ReGiS al 30 gennaio 2025 e sui dati forniti in sede di riscontro istruttorio (prot. Cdc n. 23495 dell'11 dicembre 2024).

Dall'esame della tabella emerge, innanzitutto, un lieve avanzamento complessivo. Difatti, al 30 gennaio 2025 sono stati completati ulteriori n. 3 progetti, portando quindi la percentuale dei progetti conclusi al 12 per cento (era 8,5 per cento al 30 giugno 2024). I progetti conclusi si concentrano tutti nelle Missioni M1 e M2. In particolare, nella Missione M1, risultano conclusi n. 3 CUP. Nella Missione M2, dove peraltro si rinviene la quota maggiore di "progetti in essere", si registra la percentuale maggiore di progetti completati (32 per cento). Nelle restanti Missioni, M4 e M5, tutti i progetti risultano ancora in corso.

Si evidenzia, inoltre, che gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma predefinito a livello nazionale. Questo implica che i diversi progetti si sviluppano nel rispetto della sequenza temporale con cui ciascuna fase dell'intervento deve essere completata. Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma, la Sezione si è affidata alle informazioni rilasciate dai revisori dell'Ente, così come riportate nella tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2024-2026, circa il rispetto del cronoprogramma al 30 giugno 2024. Dall'esame di quanto dichiarato dai revisori, risultavano a quella data solo n. 4 progetti in ritardo rispetto al cronoprogramma.

Si riporta il dettaglio dei progetti con la spiegazione delle ragioni del ritardo in quanto segue:

1. CUP B42E20000070005 - M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - finanziamento PNRR di 8,9 milioni.
Per l'intervento è risultato necessario attivare una bonifica ambientale a seguito della presenza rilevata di elementi inquinanti maggiori rispetto alla soglia consentita. Attualmente sono in corso le rilevazioni stagionali per terminare il processo di bonifica;
2. CUP B49E18000390004 - M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - finanziamento PNRR di 21 milioni.
Anche per questo progetto è stato necessario intervenire con una bonifica ambientale a causa degli elementi inquinanti, rilevati come superiori alla soglia di tolleranza.

Per questi due interventi l'Ente, nel suo riscontro istruttorio, ha precisato che si tratta di "progetti in essere" e che i ritardi non sono imputabili al Comune, in quanto i progetti originari non prevedevano una scadenza al 2026.

Inoltre, si sono registrati ritardi anche per i seguenti CUP:

- 3. CUP (B42C22000070006) - M4C1I1.01-Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia- Scuola dell'infanzia di Via Reni 1 (Municipio 3 - Demolizione, bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico) - finanziamento PNC di 190 mila euro. L'intervento non ha rispettato il termine del cronoprogramma per mancato adeguamento al principio DNSH ("Do No Significant Harm");
- 4. CUP B43J18000130004 - M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare - finanziamento PNRR di 1,3 milioni. L'Ente ha evidenziato che si tratta di un intervento sottoposto a processo di bonifica ambientale. Completato l'iter, i lavori sono stati riavviati.

1.2 Avanzamento finanziario

È stato possibile esaminare l'avanzamento finanziario dei n. 82 CUP al 30 gennaio 2025 partendo dai dati estratti da ReGiS.

Tabella 4 - Avanzamento finanziario

	Fondi totali	Impegni	Pagamenti	Impegni su fondi totali
M1	18.040.662,00	5.454.792,44	2.359.727,41	30%
M2	527.551.208,40	522.281.740,33	131.964.683,69	99%
M4	76.360.245,39	73.920.000,00	4.903.946,47	96%
M5	305.766.672,41	288.900.936,74	39.566.419,17	94%
TOT.	927.718.788,20	890.557.469,51	178.794.776,74	95%
PNC	146.736.100,00	-	-	0%
TOT.	1.074.454.888,20	890.557.469,51	178.794.776,74	83%


Fonte: elaborazione Cdc sui dati ReGIS al 30 gennaio 2025

Dall'esame della tabella, si riscontra una percentuale complessiva di fondi impegnati sul totale delle risorse a disposizione del Comune di Milano pari al 95 per cento. Emerge, invece, una percentuale piuttosto bassa dei pagamenti sul totale dell'impegnato pari al 20 per cento. Per quanto riguarda i progetti finanziati dal PNC, non è dato conoscere né l'importo degli impegni, né quello dei pagamenti alla data della rilevazione (30 gennaio 2025), poiché la loro rendicontazione non passa

obbligatoriamente da ReGiS. Per questa ragione si rileva una minore percentuale di impegni complessivi sul totale dei fondi rispetto al dato del 95 per cento.

La bassa percentuale di pagamenti sui fondi totali, pari al 16,6 per cento, denota comunque una rilevante quota di progetti in esecuzione e non ancora conclusi.

Grafico 3 – Stato di attuazione finanziaria (pagamenti su impegni) per Missione

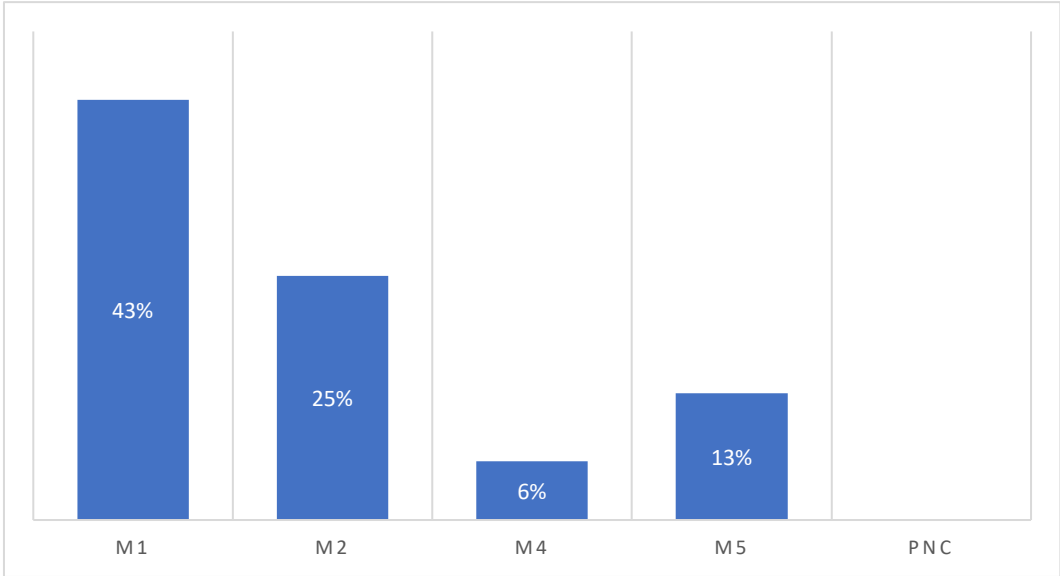

Fonte: elaborazione Cdc sui dati ReGiS al 30 gennaio 2025

Nella Missione 1, dove si registrano anche n. 4 progetti *Lump Sum*, si rileva una percentuale di pagamenti sugli impegni di spesa, pari al 43 per cento, superiore alla percentuale sul totale dei fondi, pari al 30 per cento. Le Missioni 2, 4 e 5 mostrano, invece, una tendenza opposta con un percentuale degli impegni sui fondi totali superiore al 90 per cento, a fronte di una bassa percentuale di pagamenti (rispettivamente del 25 per cento, 6 per cento e 13 per cento).

Per quanto riguarda l'intervento di realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC, che accentra in un solo CUP (F41B21005960005) il finanziamento di 101,6 milioni a valere sui fondi del PNC, la Sezione lamenta l'assenza di informazioni sia sull'avanzamento procedurale sia sull'andamento della spesa. Da un controllo effettuato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", aggiornato al 18 febbraio 2025, è possibile risalire ad un quadro parziale di tale finanziamento. In particolare, oltre ad informazioni circa lo stato dei finanziamenti, risulta che la stazione appaltante è INVITALIA e che la data di fine lavori prevista è il 15 maggio 2026. Da un confronto dei dati con la Tabella PNRR,

emerge una discrasia riguardo al finanziamento complessivo. Infatti, pur coincidendo l'importo del PNC (101.574.000,00 euro) e del FOI (15.236.100,00 euro), l'importo complessivo indicato sul sito istituzionale è pari a 130.236.100,00 euro, con una differenza di 500mila euro rispetto al costo totale del progetto di 130.736.100,00 euro, come da Tabella PNRR. Non sono disponibili informazioni che consentano di conciliare gli importi, né che indichino lo stato di avanzamento procedurale.

1.3 Anticipazione

L'avanzamento dello stato procedurale dei progetti, e quindi della realizzazione delle opere, può collegarsi anche all'erogazione delle anticipazioni che ha contribuito all'accelerazione delle stesse. Data la previsione dell'erogazione delle risorse solo dopo la rendicontazione delle spese, l'anticipazione si è resa necessaria per ovviare alle carenze di liquidità delle amministrazioni locali per l'effettuazione dei pagamenti in corso d'opera con riflessi sul rallentamento dei progetti.

Per quanto riguarda i fondi richiesti e ottenuti dall'Ente in forma di anticipazione, ci si è basati sulle informazioni fornite dai revisori dei conti nella relazione sul PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026, così come richiesto dalla Sezione delle Autonomie. Occorre ribadire che i dati finanziari tratti dalla Tabella PNRR si riferiscono ai dati di consuntivo al 31 dicembre 2023, quindi registrano la situazione con ritardo rispetto ai dati sull'avanzamento finanziario estratti da ReGiS, su cui non sono rinvenibili i dati delle anticipazioni. Le informazioni vengono riassunte in forma aggregata per Missione nella seguente tabella.

Tabella 5 - Anticipazione al 31 dicembre 2023

MISSIONI	CUP	Importo finanziamento PNRR o PNC	Anticipazione PNRR	Impegni su risorse PNRR e PNC	FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	Pagamenti PNRR e PNC
M1	11	18.040.662,00	199.876,00	1.751.527,13	-	1.415.091,85
M2	22	456.238.818,93	40.915.716,45	92.744.404,96	30.913.355,32	92.074.405,56
M4	5	45.920.000,00	2.000.000,00	10.741.093,28	19.255.359,15	2.126.042,15
M5	42	222.248.341,91	24.175.748,98	21.483.144,84	14.335.298,27	18.605.220,28
PNC	2	111.074.000,00	38.946.410,77	7.139.869,53	31.417.672,31	7.121.469,53
Totale	82	853.521.822,84	106.237.752,20	133.860.039,74	95.921.685,05	121.342.229,37

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati della Tabella PNRR.

Dall'esame della tabella emerge innanzitutto che le anticipazioni sui n. 82 CUP costituiscono il 12,44 per cento del totale dei fondi, ovvero una percentuale superiore

al 10 per cento stabilita inizialmente per i fondi PNRR. Tuttavia, occorre precisare che le anticipazioni sono state assegnate solo per una quota parte degli interventi, quindi non per tutti i CUP. In particolare, per la Missione M1, su n. 11 CUP solo n. 2 sono assegnatari di risorse anticipate; per la Missione 2 solo n. 8 su n. 21 CUP; per la Missione 4 solo uno su n. 5 CUP; invece per la Missione 5 e per i progetti PNC l'anticipazione è stata erogata per tutti i CUP.

I dati della tabella PNRR si riferiscono, peraltro, ad una data precedente alla modifica della normativa sulle anticipazioni intervenuta con l'art. 11 co. 1 del d.l. n. 19/2024 che ha previsto l'innalzamento della quota del 10 per cento al 30 per cento dell'importo concesso da erogare entro 30 giorni dalla richiesta, previo controllo della documentazione e registrazione nel sistema ReGiS⁷.

Inoltre, il totale dei pagamenti a valere sulle risorse PNRR e/o PNC, pari a 121 milioni, risulta complessivamente superiore rispetto all'anticipazione ricevuta, di 106 milioni: questo indica che l'Ente ha potuto attingere a risorse addizionali rispetto ai fondi ottenuti in anticipazione.

1.3 Progetti definanziati

La versione iniziale del PNRR (approvata dal Consiglio della UE del 13 luglio 2021) è stata oggetto finora di quattro modifiche⁸.

La più rilevante è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 ed è stata approvata dal Consiglio della UE l'8 dicembre 2023 con una rimodulazione e un incremento di 2,9 miliardi dei fondi UE a favore dell'Italia (attualmente pari a 194,4 miliardi) con l'inserimento della nuova Missione 7 (RePowerEU) ed altre modifiche alle misure

⁷ A livello di intervento, la norma trova applicazione sia per i nuovi progetti finanziati a valere sul fondo Next Generation EU-Italia, sia per i c.d. "progetti in essere", le cui risorse finanziarie sono recate da specifiche autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente. Nel mese di dicembre 2024 è stato emanato il decreto attuativo per semplificare le procedure di finanziamento dei progetti previsti dal PNRR. Il decreto, operativo dal 4 gennaio 2025 (data di pubblicazione sulla G.U.) e basato sull'art. 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. "DL Omnibus"), mira a velocizzare i pagamenti trasferendo fino al 90 per cento del costo degli interventi entro 30 giorni dalla richiesta da parte dei soggetti attuatori. Di conseguenza, le verifiche sulla documentazione saranno concentrate solo nella fase finale, prima dell'erogazione del saldo, per accelerare l'esecuzione degli interventi, con l'obbligo, da parte dei soggetti attuatori e delle Amministrazioni centrali, di aggiornare regolarmente i dati di monitoraggio nel sistema ReGiS.

⁸ La prima modifica, nel luglio 2023 è stata approvata dal Consiglio UE del 19 settembre 2023, ha riguardato milestones e targets (M&T). La seconda è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 e approvata dal Consiglio della UE l'8 dicembre 2023. La terza modifica, richiesta dal Governo il 4 marzo 2024 è stata approvata dal Consiglio della UE il 14 maggio 2024 (correzione di 55 errori materiali). La quarta modifica è stata richiesta dal Governo il 10 ottobre 2024 e approvata dal Consiglio della UE il 12 novembre 2024.

originariamente previste. Queste ultime sono divenute necessarie per criticità di natura oggettiva dovute principalmente all'aumento dei costi, alla scarsità di materiali, ai limiti del sistema produttivo⁹.

Dopo la revisione del PNRR, approvata con decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, alcune misure sono state definanziate totalmente o parzialmente, ovvero sono state sostituite le fonti del finanziamento con fondi statali o di altra fonte europea.

Il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, all'art. 1 ha riconosciuto l'esigenza di recuperare le necessarie risorse finanziarie per coprire il fabbisogno necessario per assicurare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano.

La predetta normativa ha salvaguardato i progetti con obbligazioni giuridicamente vincolanti, vale a dire quelli per i quali vi sia stata l'assunzione dell'impegno contabile ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oppure nei casi di stipula del contratto.

La norma ha, inoltre, previsto che, dopo l'individuazione degli interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento, nell'ipotesi di mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano rese indisponibili le relative risorse.

Il quadro generale dei definanziamenti e rifinanziamenti è riportato in modo dettagliato nell'art. 1, comma 8 del DL 19/2024, laddove si prevede lo stanziamento delle ingenti risorse nazionali necessarie per la copertura finanziaria dei progetti definanziati ovvero parzialmente fuoriusciti dal PNRR.

Il 29 ottobre 2024, su richiesta del Governo, la Commissione ha assentito alcune ulteriori proposte di modifica al PNRR italiano, rispetto alla revisione più ampia dell'8 dicembre 2023; le stesse sono state poi approvate dal Consiglio europeo il 18 novembre 2024. In seguito alla revisione del PNRR, alcune misure sono state dunque rimodulate, con la conseguenza che il finanziamento inizialmente programmato sui fondi del PNRR è stato sostituito da fondi statali o di altra fonte europea.

Con la delibera SRCLOM/314/2023/GEST, la Sezione aveva preso atto della possibile revisione di alcune misure del PNRR, annunciata nel giugno 2023, successivamente

⁹ La questione è diffusamente esaminata nella nota di lavoro 2/2024 – la riforma del codice dei contratti e la rimodulazione del PNRR – Ufficio parlamentare del bilancio dicembre 2024

approvata dalla Commissione Europea, che avrebbe potuto comportare la ridefinizione delle fonti di finanziamento per diversi interventi.

L'analisi evidenziava n. 18 progetti, suddivisi in tre interventi, che potevano essere eventualmente interessati dalla revisione, di cui solo due non originariamente previsti nel PNRR, rientranti nell'intervento M2C4-2.2 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei comuni).

L'importo complessivo coinvolto risultava essere di 131,6 milioni, pari al 15 per cento dei fondi PNRR e PNC destinati al Comune di Milano, a cui si aggiungevano 4,1 milioni di fondi FOI per gli interventi della Missione 5 Componente 2, relativi ai Piani Urbani Integrati e alla Rigenerazione Urbana.

Con l'integrazione istruttoria, prot. Cdc n. 22378 dell'11 novembre 2024, la Sezione ha chiesto un aggiornamento in merito allo stato di finanziamento dei progetti. Il Comune nel proprio riscontro istruttorio ha precisato che la rimodulazione del PNRR ha comportato solo una modifica delle fonti di finanziamento per alcuni progetti, in parte coperte con fondi statali, senza incidere sui tempi previsti e senza comprometterne la realizzazione. Inoltre, ha chiarito che la discrepanza emersa, tra le informazioni iniziali trasmesse dal Collegio dei revisori nella tabella PNRR e quelle più aggiornate dallo stesso Ente in sede istruttoria, si deve imputare all'attuazione dei decreti ministeriali di revisione del PNRR del dicembre 2023, di cui il Comune non era a conoscenza al momento della precedente comunicazione.

1.3.1 Progetti totalmente definanziati

La tabella che segue offre una visione dettagliata sullo stato di avanzamento e sulle variazioni delle fonti di finanziamento delle misure interamente definanziate.

Tabella 6 - Progetti totalmente definanziati

		n. CUP	Fondi PNRR	Fondi PNRR - Nuova estrazione	Fondi PNC	Fondi PNC Nuova estrazione	Importo altra fonte di finanziamento	Totale impegni assunti a seguito di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti	Totale impegni nuova estrazione	Stato di avanzamento o cancellazione dell'intervento
M5C2	2.02-Piani urbani integrati	4	51.586.903,52	0,00	1.269.284,68	0,00	52.856.188,20	52.856.188,20	53.653.520,13	In esecuzione
M2C4	2.02-Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	2	0,00		0,00		0,00	750.000,00		concluso

Fonte: Elaborazione Cdc dai dati presenti sulla piattaforma ReGiS e da riscontro istruttorio (prot. Cdc n. 23495 dell'11 dicembre 2024).

In particolare, l'intervento M5C2 - 2.02, relativa ai Piani Urbani Integrati, comprende n. 4 CUP (B42J22000010001, B45B22000420001, B47D22000120006, B47D22000130006), inizialmente finanziati con 51,6 milioni di fondi PNRR, integrati da 1,3 milioni di fondi PNC. Successivamente, tali risorse sono state interamente sostituite da finanziamenti statali per un importo complessivo di 52,9 milioni, in applicazione dell'art. 1, comma 5, lettera d) del d.l. n. 19/2024.

Tra i progetti interamente definanziati, il riscontro istruttorio include anche n. 2 CUP già conclusi, relativi all'intervento M2C4I2.02 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei comuni) per un totale di 750 mila euro. Anche in questo caso, i finanziamenti iniziali sono stati completamente sostituiti da risorse statali ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera d) del d.l. n. 19/2024.

Nel raffronto istruttorio, il Comune di Milano ha dichiarato che gli impegni assunti corrispondono all'intero finanziamento sostitutivo. Tuttavia, da una verifica sulla piattaforma ReGiS si è evidenziato che l'importo dell'impegnato è pari a 53,6 milioni, superiore a quanto inizialmente riportato dall'Ente.

In conclusione, dai dati emerge che dei n. 6 CUP inizialmente finanziati con fondi PNRR e PNC che risultano "totalmente definanziati", per n.4 CUP è stata effettuata una completa sostituzione dei fondi con risorse statali, mentre per i restanti n. 2 CUP i lavori si sono conclusi.

1.3.2 Progetti parzialmente definanziati

In relazione ai CUP oggetto di questa delibera, dalla tabella PNRR emerge che n. 18 CUP sono stati parzialmente definanziati.

La tabella seguente fornisce il dettaglio sulle variazioni delle fonti di finanziamento inizialmente programmate.

Tabella 7- Progetti parzialmente defINANZIATI

		n. CUP	Fondi PNRR	Fondi PNRR - Nuova estrazione	Fondi PNC	Fondi PNC Nuova estrazione	Importo altra fonte di finanziamento	Totale impegni assunti a seguito di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti	Totale impegni nuova estrazione	Stato di avanzamento o cancellazione dell'intervento
M4C1	1.02-Piano di estensione del tempo pieno	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	In esecuzione
M5C2	1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	5	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	0,00	0,00	4.310.000,00	989.688,31	In esecuzione
M5C2	2.01-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	2	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	28.350.000,00	In esecuzione
M5C2	2.02-Piani urbani integrati	9	47.677.095,31	30.056.422,50	2.401.134,50	5.042.379,89	20.962.090,79	50.078.229,81	51.866.839,45	In esecuzione
M5C2	2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	1	1.951.972,14	1.072.277,69	48.027,86	179.889,39	747.832,92	2.000.000,00	2.000.000,00	In esecuzione

Fonte: Elaborazione Cdc dai dati forniti dall'Ente in sede di riscontro istruttorio prot. Cdc n. 23495 dell'11 dicembre 2024.

Dalla lettura dei dati della tabella si evidenzia che i fondi PNRR sono diminuiti di 18,5 milioni, mentre i fondi PNC sono aumentati di 2,7 milioni. Inoltre, vi sono 41,7 milioni di nuovi finanziamenti statali secondo quanto stabilito dal d.l. n. 19/2024, art. 1 comma 5 lett. d). La differenza tra i fondi programmati e quanto emerge dai dati ReGiS è di 25,9 milioni aggiuntivi.

Qui di seguito si illustra il dettaglio del definanziamento e la relativa sostituzione di fondi per ciascuna Missione, secondo quanto riferito dall'Ente in sede di contraddittorio cartolare:

- L'intervento **M4C1 - 1.02**, relativo all'estensione del tempo pieno scolastico, comprende un unico CUP (B43D22000110006) inizialmente finanziato con 1 milione di fondi PNRR. Gli impegni assunti corrispondono a tale importo e gli interventi sono stati cofinanziati con risorse del bilancio dell'Amministrazione. Il Comune, in sede di riscontro istruttorio, ha confermato che tale cofinanziamento era stato già previsto in fase iniziale, senza necessità di immettere risorse a causa del definanziamento. Questo intervento è stato aggiunto rispetto a quelli riportati nella delibera SRCLOM/314/2023/GEST. Sulla piattaforma ReGiS, risulta ancora quale fonte di finanziamento il PNRR.
- Nell'investimento **M5C2 - 1.03** che comprende gli interventi denominati Housing First e Stazioni di Posta, risultavano n. 5 CUP (B44H22000150006, B44H22000160006, B44H22000170006, B44H22000180006, B44H22000190006) finanziati con i fondi PNRR per un importo pari a 4,3 milioni. Dal riscontro istruttorio gli impegni assunti risultano pari all'intero importo dei fondi PNRR, mentre dai dati ReGiS, gli impegni registrati sono pari a 990 mila euro. Secondo quanto riferito dal Comune, anche in questo caso il cofinanziamento con risorse proprie di bilancio era già stato previsto in fase iniziale, senza richiedere la mobilitazione di ulteriori risorse a copertura del definanziamento. Come per la Missione precedente, sulla piattaforma ReGiS risulta ancora il PNRR quale fonte di finanziamento. Si segnala anche che questi CUP non erano inclusi nella delibera SRCLOM/314/2023/GEST.
- Nell'intervento **M5C2 - 2.01** vi sono n. 2 CUP (B47H21001800001, B49J20002240004) relativi ai progetti di rigenerazione urbana. Secondo il riscontro istruttorio, il finanziamento dei progetti è stato sostituito con risorse statali in base all'art. 1, comma 5, lettera d) del d.l. n. 19/2024. L'importo inizialmente coperto con fondi PNRR, pari a 20 milioni, infatti, è stato successivamente sostituito da altra fonte statale. Gli impegni assunti, come confermato dall'Ente, risultano pari a 20 milioni, ma dai dati di ReGiS emerge un importo superiore pari a 28,3 milioni, oltre all'assenza del dato circa la sostituzione della fonte di finanziamento.
- Nell'intervento **M5C2 - 2.02**, relativo ai Piani Urbani Integrati (PUI), vi sono n. 9 CUP (B43C22000360006, B43C22000370006, B43C22000380006, B43C22000390006,

B43C22000400006, B43C22000410006, B47D22000140006, B47H21006410004, B45B22000410001). L'importo iniziale risultava finanziato da fondi PNRR, per 47,6 milioni, e da fondi PNC per 2,4 milioni, poi successivamente definanziato parzialmente. Secondo i dati estratti dalla piattaforma ReGiS, invece, gli importi relativi ai fondi PNRR risultano essere pari a 30 milioni, mentre quelli relativi ai fondi PNC ammontano a 5 milioni. Tuttavia, questa differenza non è stata valorizzata nel riscontro istruttorio. Le risorse originarie sono state sostituite da fondi statali, per un totale di 20 milioni, come indicato dall'Ente. Gli impegni assunti risultano pari a 50 milioni, con una differenza rispetto al dato di ReGiS che mostra, invece, un totale di 51 milioni.

- L'intervento **M5C2 - 2.03** denominato Programma innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA) prevede un unico CUP. Il finanziamento iniziale includeva 1,9 milione di fondi PNRR e 48 mila di fondi PNC. A seguito del definanziamento, i dati di ReGiS indicano che 1 milione proviene dai fondi PNRR e 180 mila dai fondi PNC. Tale differenza non è riportata nel riscontro istruttorio, mentre è specificato che una parte delle risorse è stata sostituita da fondi statali per un totale di 748 mila, con impegni assunti di 2 milioni. Pertanto, i dati riportati nel riscontro istruttorio non appaiono aggiornati rispetto a quelli presenti sulla piattaforma ReGiS. L'intervento, secondo quanto indicato dall'Ente, è stato parzialmente definanziato con la sostituzione delle risorse, in linea con il Decreto del Ministero dell'Interno del 12 giugno 2024.

A conclusione dell'attività istruttoria sui CUP definanziati, come emerge dal riscontro dell'Ente, *“la modifica – parziale o totale – della fonte di finanziamento degli interventi indicati nell'Excel di cui in allegato non ha comportato né la rinuncia alla realizzazione degli interventi né alcun impatto sul cronoprogramma realizzativo”*.

Inoltre, tutti i progetti, sia quelli parzialmente sia totalmente definanziati, risultano attualmente in fase di esecuzione, ad eccezione di n. 2 CUP totalmente definanziati dell'intervento M2C4 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni), ma che risultano già conclusi.

Dall'analisi di questa Sezione è emerso come l'Ente non abbia completato l'aggiornamento dei dati sulla piattaforma ReGiS, nonostante quanto riferito nel riscontro. La Sezione sollecita il Comune di Milano ad aggiornare i dati come da indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato laddove afferma che *“nel rispetto dell'art. 12 comma 4 D.L. n. 19, del 2 marzo 2024, gli enti territoriali, soggetti attuatori, anche con riferimento ai progetti parzialmente o interamente finanziati dal PNRR, sono tenuti ad alimentare il sistema Regis nel rispetto delle indicazioni di dettaglio fornite dalle Amministrazioni centrali titolari”* (FAQ n. 7/2024 RGS).

2. TEMPI DI RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTERI

La Sezione chiedeva all'Ente informazioni sullo stato della rendicontazione e sui tempi dei rimborsi ricevuti dai ministeri. Dal riscontro istruttorio del mese di dicembre 2024, l'Ente riferiva di aver inviato il rendiconto per n. 8 su 82 CUP, tra cui sono compresi i n. 4 progetti *Lump Sum*. Si riporta il dettaglio dei progetti rendicontati nella seguente tabella:

Tabella 8 – Rimborsi

CUP	Codice Misura	Descrizione	PRG - Finanziamento PNRR	Importo totale rendicontato	Importo totale trasferito dal Ministero titolare	Rendiconto inoltrato
B41C22000380006	M1C1I1.02- Abilitazione al cloud per le PA locali	1.2c_f205comune di milano	4.753.682,00		-	Lump sum*
B41F22001120006	M1C1I1.04- Servizi digitali e esperienza dei cittadini	1.4.3 - app c_f205comune di milano	19.122,00		19.122,00	Lump sum*
B41F22001130006	M1C1I1.04- Servizi digitali e esperienza dei cittadini	1.4.3 - pagoc_f205comune di milano	223.076,00		223.076,00	Lump sum*
B41F22001140006	M1C1I1.04- Servizi digitali e esperienza dei cittadini	1.4.4c_f205comune di milano	14.000,00		14.000,00	Lump sum*
B49G22000050006	M1C1I1.04- Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Mobility as a Service Milano.	3.300.000,00	1.161.503,11	1.161.503,11	14/4/2024
F40D19000000001	M2C2I4.04- Rinnovo flotte bus e treni verdi	Comune di Milano - bus l.v.	23.945.719,00	23.945.719,00	-	14/11/2024
F40J22000010001	M2C2I4.04- Rinnovo flotte bus e treni verdi	CUP1 Comune di Milano - bus	213.495.400,00	51.209.110,00	-	27/12/2023
J42C21002820004	M5C2I2.03- Programma innovativo della qualità dell'abitare	CUP 1 - ID 94 Comune di Milano	47.979.999,74	10.962.263,14	-	30/7/2024
TOTALE			293.730.998,74	92.288.475,25	1.417.701,11	

Fonte: riscontro istruttorio prot. Cdc n. 23495 dell'11 dicembre 2024

*Nota: per i progetti Lump Sum al termine dell'attività l'Ente invia la richiesta di rimborso che è soggetta ai tempi di asseverazione da parte del Dipartimento per la transizione digitale¹⁰.

Dalla tabella risulta che su 293,7 milioni di finanziamento di PNRR, con riferimento alle Missioni 1, 2 e 5, il Comune ha inoltrato la rendicontazione per 92,3 milioni, ricevendo un trasferimento ministeriale corrispondente all'1,5 per cento dell'importo rendicontato, per i soli CUP della Missione 1 (di cui per n.3 dei 4 progetti Lump sum;

¹⁰ Le linee guida definiscono le modalità di rimborso per questi progetti che non prevedono la possibilità di ricevere anticipazioni (si veda al link <https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/#sistema-di-gestione-e-controllo>)

si noti che per quello di importo pari a 4,7 milioni non era ancora stato trasferito il rimborso). Per le restanti Missioni l'Ente non ha ricevuto alcun rimborso, compreso l'importo di 51,2 milioni, rendicontato in data 27 dicembre 2023, relativo all'intervento M2C2I4.04 - Rinnovo flotte bus e treni verdi.

3. APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI

In sede di contraddittorio cartolare, questa Sezione chiedeva di confermare il rispetto delle procedure di contabilizzazione applicate ai progetti finanziati con i fondi del PNRR e/o PNC, ai sensi dell'art. 15 (procedure finanziarie e contabili) del d.l. n. 77/2021 e del D.M. 11 ottobre 2021, con particolare riferimento alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in relazione alle anticipazioni ricevute (come specificato nella FAQ n. 48/2021 della Ragioneria Generale dello Stato), nonché alla creazione di un capitolo di spesa per ciascun CUP (art. 3 del D.M. 11 ottobre 2021). Si chiedeva inoltre se fosse stato rispettato il tracciamento del flusso finanziario applicato alle singole transazioni, in base alla propria struttura e organizzazione.

In sede di riscontro istruttorio, l'Ente si è limitato a confermare di aver rispettato le procedure di contabilizzazione, così come delineate dall'art. 15 del d.l. n. 77/2021 e dal D.M. 11 ottobre 2021, specificando che le risorse finanziarie, riferibili al PNRR e al PNC, sono state iscritte nel bilancio finanziario gestionale in conformità alle disposizioni di cui alla FAQ n. 48 richiamata, al fine di poter garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari. Ancora, precisava che *“l'obbligo di perimetrazione delle risorse degli interventi del PNRR/PNC, previsto al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative a tali finanziamenti, viene assolto attraverso l'accensione di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione, con imputazione ai quali vengono effettuate tutte le registrazioni contabili riferite a risorse PNRR riportanti l'indicazione della Missione, componente, investimento e CUP relativi al finanziamento specifico”*.

In merito al rispetto delle norme contabili previste, questa Sezione in sede istruttoria evidenziava alcune criticità riguardanti in particolare n. 3 CUP.

- Per quanto riguarda il CUP doppio (B44E07000120004) utilizzato dall'Ente per individuare un intervento a cavallo tra due diverse Missioni (M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare e M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa - metropolitana tram autobus), la procedura seguita sembrerebbe non garantire una effettiva tracciabilità dei relativi flussi finanziari, oltre che una corretta rendicontazione dei due progetti con lo stesso CUP. Sul punto, l'Ente chiariva che il CUP si riferisce di fatto ad un solo intervento con un unico quadro economico e con risorse provenienti da due diverse linee di finanziamento PNRR (TRM e PINQUA). Nello specifico, precisava che la tracciabilità e la rendicontazione sarebbe stata garantita da sistemi *“WPS differenti e da iscrizioni contabili (accertamenti e impegni distinti)”*.

La Sezione, in merito, raccomandava al Comune di Milano di verificare l'effettiva aderenza della procedura contabile adottata a quanto prescritto dalla normativa vigente, tenuto conto che l'obiettivo è quello di garantire la piena tracciabilità dei flussi

finanziari ed il puntuale rispetto del vincolo di destinazione posto sulle risorse incluse nel piano. Si ricorda, in tal senso, che l'art. 3, comma 3, del Decreto Ministeriale MEF dell'11 ottobre 2021 stabilisce che le risorse del PNRR destinate a progetti specifici debbano essere gestite tramite capitoli dedicati nel piano esecutivo di gestione o nel bilancio finanziario, come già indicato nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29/2022, in base alla quale gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto, devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto. Si evidenzia che gli enti che utilizzano una struttura contabile diversa devono adeguarla obbligatoriamente alle linee guida dei documenti ministeriali, che sono vincolanti.

- Infine, la Sezione rilevava che, con riferimento al CUP B44D22000090005, l'importo indicato nella piattaforma ReGiS, relativamente al finanziamento con il fondo FOI, è pari a 13,1 milioni, risultando superiore rispetto a quello indicato dai revisori nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026, pari a 7,9 milioni. Sul punto, il Comune ha chiarito che è stato chiesto all'Amministrazione Centrale di apportare le necessarie modifiche sulla piattaforma ReGiS per allineare i dati relativi al fondo FOI.

4. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL COMUNE

4.1 La governance del PNRR

Nella deliberazione n. 314/2023/GEST, si evidenziava che il Comune di Milano ha seguito le indicazioni per il monitoraggio dei progetti del PNRR e PNC, in coordinamento con le amministrazioni centrali, elaborando linee guida interne per gestire e monitorare i progetti, per facilitare la raccolta di informazioni, il rispetto del cronoprogramma e l'adozione di azioni correttive in caso di ritardi. In quella sede, si precisava che ogni Direzione provvede a nominare i Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP) e a gestire il Codice Unico di Progetto (CUP).

In aggiornamento a quanto già indicato, nel proprio riscontro istruttorio, il Comune di Milano riferisce che il modello di *governance* interno, progettato e descritto nel Sistema di Gestione e Controllo, è stato formalmente adottato con atto del Direttore Generale in data 27 marzo 2023, ritenendolo funzionale ed efficace, tanto da non richiedere modifiche.

La Sezione ricorda come un adeguato sistema di gestione e controllo debba fungere da strumento chiave per assicurare la corretta gestione delle risorse, garantendo il rispetto delle normative e l'efficacia degli interventi.

Questo approccio non solo consente di perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, ma favorisce anche una stretta collaborazione con istituzioni, cittadini e imprese locali, creando sinergie utili per massimizzare l'impatto positivo dei progetti sul territorio.

La Sezione ha potuto verificare come questa struttura di *governance* abbia assicurato il rispetto del cronoprogramma per il 95 per cento dei progetti (n.4 su n.82 CUP in ritardo).

4.2 Sistema dei controlli interni

I controlli interni rivestono un ruolo fondamentale per garantire trasparenza, efficienza e regolarità nell'attuazione dei procedimenti amministrativi, con particolare attenzione alla gestione delle risorse derivanti dal PNRR e dal PNC.

Il Comune di Milano nel riscontro istruttorio riferisce che, anche per l'annualità 2024, è proseguita l'attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, sui procedimenti finanziati da risorse del PNRR e del PNC.

La Sezione rammenta che questo tipo di controllo si deve configurare come un elemento essenziale del sistema di gestione e controllo, adottato dal Comune per garantire il rispetto delle normative e la corretta destinazione dei fondi pubblici.

Attraverso questi controlli, infatti, l'Amministrazione comunale deve monitorare l'efficacia delle procedure e la coerenza delle azioni rispetto agli obiettivi strategici, al

fine di intercettare eventuali criticità, correggerle tempestivamente, assicurando che le risorse siano gestite con responsabilità e nell'interesse della collettività.

4.3 Amministrazione trasparente

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e comunicazione previsti dalla normativa vigente, il Comune di Milano, nel proprio riscontro istruttorio, attesta l'avvenuto aggiornamento del sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata al PNRR. Tale aggiornamento include informazioni dettagliate e continuamente aggiornate sui progetti finanziati, sull'impiego delle risorse, nonché sugli stati di avanzamento delle attività e dei risultati raggiunti. In particolare, la sezione è strutturata in modo tale da fornire ai cittadini, agli *stakeholder* e agli organi di controllo:

- documenti di gara e contratti, relativi al PNRR e al Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC);
- dati sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo delle risorse assegnate;
- *report* sull'avanzamento dei progetti, in stato di esecuzione o conclusi.

Questa impostazione rispetta le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 (riformato dal d. Lgs. 97/2016), che regola la trasparenza nella pubblica amministrazione, e le linee guida ANAC sul PNRR.

5. CONTRADDITTORIO PUBBLICO

Questa Sezione, al termine dell'attività istruttoria cartolare ha ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, deferendo l'Ente in adunanza pubblica al fine di una valutazione ponderata da parte del Collegio sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi del PNRR e del PNC.

L'Ente ha dunque fornito gli elementi richiesti sia con una memoria depositata il 10 marzo 2025 con prot. Cdc. n. 3210, sia con il contraddittorio orale avvenuto in sede di adunanza pubblica.

Gli aspetti approfonditi sono stati:

1. Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC), che prevede un finanziamento complessivo di 130,7 milioni (101,5 milioni PNC; 15,2 milioni FOI; 13,9 milioni fondi Ente). In merito, si era osservata la mancanza di informazioni supportati da documentazione ufficiale sull'avanzamento fisico (fine lavori previsti al 15 maggio 2026) e sul progresso dei pagamenti (l'Ente nella memoria riferisce solo di un importo pari al 22 per cento di pagamenti sugli impegni). Inoltre, dal disciplinare regolante i rapporti tra i soggetti coinvolti con il Ministero della Cultura, risulta quale soggetto attuatore, insieme al Comune di Milano, anche la Fondazione BEIC. I revisori dei conti, tuttavia, evidenziano difficoltà finanziarie per quest'ultima. In particolare, nella relazione al bilancio di previsione (BDP) 2024 dichiaravano che *"dal punto di vista finanziario l'anno 2024, a risorse invariate si accinge ad essere l'ultimo anno di vita della Fondazione, rendendosi necessario l'apporto di nuove entrate"*, mentre in quella del 2025 che *"le risorse non sono più in grado di garantire la continuità aziendale della Fondazione"*.
2. L'attività di rendicontazione relativa alla presenza di un CUP doppio (B44E07000120004) - intervento a cavallo tra due diverse Missioni (M5C2 - PINQUA e M2C2 - Sviluppo trasporto rapido di massa - metropolitana tram autobus). Nonostante la rassicurazione dell'Ente nelle memorie trasmesse in vista dell'adunanza, sulla piattaforma ReGiS risultano presenti le stesse fatture con data, numero e importo per entrambi i progetti inerenti alle due Missioni. Questa situazione evidenzia una criticità riguardante il flusso finanziario per ciascun intervento, con particolare riguardo alla fase di trasferimento dei rimborsi da parte dei Ministeri coinvolti.

In sede di contraddittorio, in cui sono intervenuti il Direttore della Direzione Specialistica Autorità di Gestione Monitoraggio e Piani, nonché il Funzionario dei Servizi amministrativi della Direzione Generale, sono stati forniti alcuni chiarimenti.

Per quanto riguarda il primo punto, relativo al progetto della Biblioteca europea, è stata evidenziata una chiara divisione dei compiti tra la Fondazione BEIC, in qualità di responsabile dello sviluppo biblioteconomico e il Comune di Milano, che ha in carico la progettazione e l'esecuzione delle opere edili. La Fondazione, in particolare, gestisce solo una parte limitata delle risorse (500 mila euro). Il piano dei lavori prevede che il progetto si concluda in anticipo rispetto alla scadenza iniziale, con un termine previsto per il 9 maggio 2026 (anziché il 15 dello stesso mese). Il Comune ha dichiarato di non intravedere difficoltà nel rispettare la scadenza. L'Ente ha dichiarato che entro marzo 2025 verrà completato il solaio, seguito dalle opere successive. Il Comune ha inoltre attivato risorse proprie per l'automazione interna, l'illuminazione e gli arredi. I rappresentanti dell'Ente hanno comunicato che è stato istituito un tavolo di coordinamento per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori. È stato, infine, rappresentato che l'Ente, che detiene una quota di partecipazione nella Fondazione pari al 27 per cento, per garantirne la continuità operativa ha trasferito 200 mila euro. La situazione della Fondazione BEIC, dunque, secondo i rappresentanti dell'Ente, non costituirebbe elemento di preoccupazione tale da incidere sul completamento dell'opera.

Con riferimento al secondo punto, relativo al doppio CUP (Codice Unico di Progetto), il Direttore della Direzione Specialistica Autorità di Gestione Monitoraggio e Piani ha riferito che le criticità sulla rendicontazione del progetto sono note, ma ha affermato che le liquidazioni verranno tenute distinte; inoltre, per evidenziare le differenze tra gli avanzamenti sulle due diverse misure, in ReGiS è stata adottata la mappatura dei CLP (Codici Locali di Progetto), mentre in bilancio l'apertura di due distinti capitoli consente già una distinzione netta ai fini della tracciabilità. La Sezione raccomanda di verificare che le modalità adottate garantiscano l'univocità dei rimborsi sulle due Missioni.

Infine, i rappresentanti dell'Ente hanno illustrato le difficoltà nel gestire i dati e la documentazione dovendo adempiere a richieste non omogenee tra i diversi Ministeri: agli enti si chiede di caricare le informazioni relative ai progetti su piattaforme aggiuntive (quali ad esempio, BDA-MOP, Futura, ecc.) oltre a ReGiS.

Un punto critico riguarda la lentezza dei rimborsi ministeriali in seguito alla rendicontazione da parte dell'Ente.

I ritardi nei trasferimenti ministeriali hanno interessato tra l'altro l'acquisto degli autobus elettrici, nonostante l'importo di 51,2 milioni sia stato rendicontato alla fine del 2023. La richiesta di documentazione supplementare ha ulteriormente dilatato le

tempistiche. L'Ente confida che il decreto del MEF di dicembre 2024 consenta di accelerare i tempi dei

Il Comune ha dichiarato di avere già rendicontato circa 132,7 milioni ovvero poco meno del 60 per cento di quanto già liquidato; inoltre, che si sta provvedendo all'aggiornamento della piattaforma ReGis, quale adempimento obbligatorio prodromico per la richiesta di nuove anticipazioni e trasferimenti. Infatti, il Comune prevede di completare la richiesta di ulteriori 40 milioni, oltre a nuove anticipazioni, auspicando un rapido trasferimento delle somme rendicontate.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione, sulla base delle informazioni contenute nella Tabella PNRR compilata dai revisori dell'Ente allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 (che contiene informazioni circa i dati di bilancio al 31 dicembre 2023 e sullo stato di avanzamento dei progetti al 30 giugno 2024) e della piattaforma ReGiS consultata in data 30 gennaio 2025, oltre agli elementi raccolti in occasione dell'adunanza pubblica, si possono formulare le seguenti conclusioni:

1. gli interventi di cui il Comune di Milano è **soggetto attuatore** sono n. 81, a cui sono associati n. 82 CUP (uno dei CUP è doppio) poiché un intervento è finanziato su due Missioni (2 e 5);
2. l'importo complessivo di **fondi PNRR e PNC** per la realizzazione di questi progetti è pari a 838,8 milioni, di cui 722,5 milioni dal PNRR e 116,3 milioni dal PNC. Sommando i fondi PNRR e PNC ad altri fondi pubblici (FOI, fondi UE e dello Stato) il finanziamento complessivo ammonta a 1 miliardo e 74 milioni circa. La quota maggiore delle risorse si rinviene nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), pari a quasi il 50 per cento del totale dei fondi, a cui segue la Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità) con il 29 per cento circa dei fondi totali, nonostante in quest'ultima vi si concentri il 50 per cento circa dei progetti;
3. per quanto concerne l'**avanzamento procedurale**, al 30 giugno 2024, da quanto certificato dai revisori nella Tabella PNRR, risultava che oltre il 62 per cento dei progetti fosse in fase di "esecuzione", mentre il 29 per cento in una fase precedente e solo 7 progetti (8,5 per cento) nella fase conclusiva; sulla base delle informazioni estratte da ReGiS al 30 gennaio 2025, risulta che sono stati completati ulteriori n. 3 progetti, portando quindi la percentuale dei progetti conclusi al 12 per cento. I progetti conclusi si concentrano tutti nelle Missioni 1 e 2. In particolare, nella Missione 1, risultano conclusi n. 3 CUP. Nella Missione 2, dove peraltro si rinviene la quota maggiore di "progetti in essere", si registra la percentuale maggiore di progetti completati (32 per cento). Nelle restanti Missioni, 4 e 5, tutti i progetti risultano ancora in corso;
4. in merito al **rispetto del cronoprogramma**, dalle informazioni dei revisori dell'Ente, risultavano solo n. 4 progetti in ritardo rispetto al cronoprogramma. Per due di questi, tuttavia, l'Ente dichiara trattarsi di "progetti in essere" e che i ritardi non sono imputabili al Comune, in quanto i progetti originari non prevedevano una scadenza al 2026;
5. per quanto concerne l'**avanzamento finanziario** dai dati ReGiS al 30 gennaio 2025 si riscontra una percentuale complessiva di fondi impegnati sul totale delle risorse a disposizione del Comune di Milano pari al 95 per cento. Emerge, invece, una

percentuale piuttosto bassa dei pagamenti sul totale dell'impegnato pari al 20 per cento. Per quanto riguarda la realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC), che accentra in un solo CUP un finanziamento di 101,6 milioni a valere su fondi del PNC, la Sezione ha ricevuto risposta circa l'avanzamento fisico del progetto nella interlocuzione diretta in adunanza pubblica. Il Comune ha rassicurato la Corte sia circa il completamento delle opere edili, che dovrebbero concludersi entro il 9 maggio 2026, sia per la situazione finanziaria della Fondazione BEIC, che non costituirebbe elemento di preoccupazione tale da incidere sul completamento dell'opera;

6. il totale dei pagamenti a valere sulle risorse PNRR e/o PNC, pari a 121 milioni, risulta complessivamente superiore all'**anticipazione** ricevuta che risulta essere 106 milioni (circa il 12 per cento dei fondi PNRR): questo indica che l'Ente ha attinto a risorse addizionali rispetto ai fondi ottenuti in anticipazione;
7. in merito al **definanziamento**, conseguenza della decisione del Consiglio Europeo del 8 dicembre 2023, risulta che 6 CUP inizialmente finanziati con fondi PNRR e PNC sono stati "totalmente definanziati": per 4 di questi CUP è stata effettuata una completa sostituzione con risorse statali, mentre i restanti CUP sono già conclusi. L'Ente ha dichiarato che *"la modifica - parziale o totale - della fonte di finanziamento degli interventi non ha comportato né la rinuncia alla realizzazione degli interventi né alcun impatto sul cronoprogramma realizzativo"*;
8. l'Ente dichiarava a dicembre 2024 di aver inviato la **rendicontazione** per n. 8 su 82 CUP, tra cui anche i 4 progetti *Lump Sum*. Per un importo rendicontato pari a 92,3 milioni su 293,7 milioni di fondi PNRR, il Comune ha ricevuto il rimborso ministeriale solo per l'1,5 per cento del totale rendicontato. Il Comune non ha ricevuto alcun rimborso né per i 4,7 milioni rendicontati dell'intervento M1C1I1.02- Abilitazione al Cloud per le PA locali, né per i 51,2 milioni rendicontati in data 27 dicembre 2023, dell'intervento M2C2I4.04 - Rinnovo flotte bus e treni verdi.;
9. la Sezione aveva manifestato l'esigenza di chiarimenti in merito alla **contabilizzazione** relativa al CUP B44E07000120004 afferente a due diverse linee di finanziamento PNRR (TRM e PINQUA) con unico quadro economico. In sede di adunanza pubblica il Comune ha dichiarato di voler procedere ad una verifica in relazione alla procedura contabile adottata, per garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ed il puntuale rispetto del vincolo di destinazione posto sulle risorse incluse nel piano;
10. il Comune riferisce che il **modello di governance** interno, progettato e descritto nel Sistema di Gestione e Controllo, è stato formalmente adottato con atto del Direttore Generale in data 27 marzo 2023, ritenendolo funzionale ed efficace, tanto da non richiedere modifiche. Peraltro, la Sezione ha potuto verificare come questa struttura abbia assicurato il rispetto del cronoprogramma per il 95 per cento dei progetti (n.4 su n.82 CUP in ritardo);

11. in ottemperanza agli obblighi di **trasparenza** e comunicazione previsti dalla normativa vigente, il Comune, nel proprio riscontro istruttorio, attesta l'avvenuto aggiornamento del sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tabella 9 - Elenco dettagliato per CUP dei progetti per stato di attuazione

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
1	M1C1I1.02-Abilitazione al cloud per le PA locali	B41C22000380006	Abilitazione Cloud PA Locali	Altro	Dato Mancante	In Corso	No
2	M1C1I1.03-Dati e interoperabilità	B41C22002050006	PDND - Piattaforma interoperabilità	Stipula contratto	Dato Mancante	In Corso	No
3	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B41F22001120006	ADOZIONE APP IO	Erogazione finanziamento	Dato Mancante	Concluso	No
4	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B41F22001130006	PagoPA	Erogazione finanziamento	Dato Mancante	Concluso	No
5	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B41F22001140006	Adozione SPID CIE	Erogazione finanziamento	Dato Mancante	Concluso	No
6	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B41F22003610006	Piattaforma Notifiche Digitali	Altro	Dato Mancante	In Corso	No
7	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B49G22000050006	Maas4Italy - Mobility as a service - Progetto Pilota in cui digitalizzazione del trasporto pubblico locale	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
8	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B49G22000970006	Maas4Italy - Mobility as a Service - Living Lab	Pubblicazione bando di gara	Termini rispettati	In Corso	No
9	M1C1I1.05-Cybersecurity	B46G22015740004	Cybersecurity - Analisi e miglioramento dei processi Cyber	Esecuzione	Dato Mancante		No
10	M1C1I1.05-Cybersecurity	B46G22015750004	Cybersecurity - Cyber resilienza e potenziamento	Stipula contratto	Dato Mancante		No
11	M1C3I1.02-Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	B49I22002730006	Riduzione delle barriere all'accessibilità presso il Museo del Novecento	Completamento attività	Termini rispettati	In Corso	No
12	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	B41B17000290004	CUP Legislazione Vigente 2 - ciclovie urbane	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
13	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	B44E12000060004	CUP Legislazione Vigente 3 - ciclovie urbane	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì
14	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	B47H14000500004	CUP Legislazione Vigente 4 - ciclovie urbane	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Termini rispettati	Concluso	Sì
15	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	B47H15001780004	CUP Legislazione vigente 5 - ciclovie urbane	Esecuzione	Termini rispettati	Concluso	Sì
16	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano	B47H15001790004	CUP Legislazione Vigente 6 - ciclovie urbane	Esecuzione	Termini rispettati	Concluso	Sì

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
	nazionale delle ciclovie)						
17	M2C2I4.01- Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	B47H17000590004	CUP Legislazione Vigente 10 - ciclovie urbane	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Termini rispettati	Concluso	Sì
18	M2C2I4.01- Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	B47H17000620004	CUP Legislazione Vigente 7 - ciclovie urbane	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Termini rispettati	Concluso	Sì
19	M2C2I4.01- Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	B47H17000630004	CUP Legislazione Vigente 8 - ciclovie urbane	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì
20	M2C2I4.01- Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	B47H19003610004	CUP Legislazione Vigente 9 - ciclovie urbane	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Termini rispettati	Concluso	Sì
21	M2C2I4.01- Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	B47H20001030004	CUP Legislazione Vigente 11 - ciclovie urbane	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
22	M2C2I4.01- Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	B47H20001040004	CUP Legislazione Vigente 1 - ciclovie urbane	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Termini rispettati	Concluso	Sì
23	M2C2I4.01- Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	B47H20018670001	Mobilità ciclistica: Miglioramento delle condizioni di ciclabilità cittadina - Lotto 1	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
24	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	B44D22000070005	Metrotranvia interquartiere nord - tratta funzionale Adriano - Cascina gobba - LOTTO 3	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
25	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	B44D22000090005	Metrotramvia 2 basan - villapizzzone	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
26	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	B44D22000100005	Metrotranvia interquartiere nord - tratta funzionale Niguarda - cascina gobba - LOTTO 4	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
27	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	B44E07000120004	Piano dei trasporti linea circolare 90-91 - sede riservata da p.za zavattari a p.za stuparich	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
28	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	F40E19000030008	Rinnovo della flotta filobus per la città di Milano: fornitura di 10 nuovi veicoli	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
29	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	F40J21000050001	Fornitura di 14 tram bidirezionali (a servizio della linea 7)	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
30	M2C2I4.04-Rinnovo flotte bus e treni verdi	F40D19000000001	Bus Legislazione Vigente - ex PSNMS	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Si
31	M2C2I4.04-Rinnovo flotte bus e treni verdi	F40J22000010001	Mobilità sostenibile: Rinnovo flotte bus e treni verdi - fornitura di 350 bus	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
32	M2C2I4.04-Rinnovo flotte bus e treni verdi	F40J22000020001	Mobilità sostenibile: Rinnovo flotte bus e treni verdi - Infrastrutture elettriche	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
33	M2C3I1.01-Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	B42C22000060006	Scuola secondaria di I Grado di Viale Sarca 24 (Municipio 9) - demolizione, bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Si
34	M4C1I1.01-Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	B42C22000070006	Scuola dell'infanzia di Via Reni 1 (Municipio 3 - Demolizione, bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico)	Stipula contratto	Termini NON rispettati	In Corso	No
35	M4C1I1.02-Piano di estensione del tempo pieno	B43D22000110006	Risanamento strutturale - distributivo - impiantistico del centro cucine e del refettorio della scuola elementare di Via Anselmo da Baggio, 58 - 60 (Municipio 7)	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
36	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	B42E20000070005	Scialoia Lotto 1	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Si
37	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	B44I18000160004	Bonifica e demolizione dell'edificio di via Pizzigoni n.9 e realizzazione di una nuova scuola secondaria di 1°	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Si
38	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	B49E18000390004	Scialoia Lotto 2	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Si
39	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	B44H22000040006	Pippi R-Evolution 1	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
40	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	B44H22000060006	Pippi R-Evolution 2	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
41	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione	B44H22000070006	Pippi R-Evolution 3	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
	dell'istituzionalizzazione						
42	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	B44H22000080006	Sostegno all'autonomia degli anziani non autosufficienti mediante interventi di domotica	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
43	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	B44H22000090006	Prevenzione del fenomeno dell'accumulo domestico per persona con disagio mentale	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
44	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	B44H22000100006	Take Care 1	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
45	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	B44H22000110006	Take Care 2	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
46	M5C2I1.02-Percorsi di autonomia per persone con disabilità	B44H22000120006	Lo sviluppo delle autonomie delle persone affette da disabilità - Progetto Personalizzato - Abilitazione - Lavoro	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
47	M5C2I1.02-Percorsi di autonomia per persone con disabilità	B44H22000750006	Lo sviluppo delle autonomie delle persone affette da disabilità - Progetto Personalizzato - Abilitazione - Lavoro	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
48	M5C2I1.02-Percorsi di autonomia per persone con disabilità	B44H22000760006	Lo sviluppo delle autonomie delle persone affette da disabilità - Progetto Personalizzato - Abilitazione - Lavoro	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
49	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	B44H22000150006	Progetto A - Aldini - genitori soli/nuclei monoparentali	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
50	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	B44H22000160006	Progetto B - Aldini - persone senza fissa dimora	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
51	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	B44H22000170006	Progetto C - Via Mosso - nuclei familiari	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
52	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	B44H22000180006	Shelter Via Aldini 70,72,74 (Stazioni di Posta)	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
53	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	B44H22000190006	Shelter Barabino 6 (Stazioni di Posta)	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
54	M5C2I2.01-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	B47H21001800001	Intervento di manutenzione straordinaria generale e riqualificazione energetica e	Progettazione esecutiva	Termini rispettati	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGIS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
			impiantistica - via rizzoli 13-45 e 73-87				
55	M5C2I2.01-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	B49J20002240004	Interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree golenali del fiume Lambro e di miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturali	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
56	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	B43C22000360006	Superamento delle barriere architettoniche nelle Linee Metropolitane di Milano M1 e M2 - nuovi ascensori - Lotto 1	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
57	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	B43C22000370006	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della metropolitana milanese: Sesto Rondò	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
58	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	B43C22000380006	Superamento delle barriere architettoniche: Bande Nere M1	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
59	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	B43C22000390006	Superamento delle barriere architettoniche: Sant'Agostino M2	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
60	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	B43C22000400006	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese - Lambrate M2	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
61	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	B43C22000410006	Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese - Garibaldi M2	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
62	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	B45B22000410001	Rubattino - Ampliamento del parco della Lambretta - bonifica	Progettazione esecutiva	Termini rispettati	In Corso	No
63	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	B47D22000140006	Stazione di Porta Garibaldi - Interventi di riqualificazione di Piazza Sigmund Freud Lotto 3A	Aggiudicazione	Termini rispettati	In Corso	No
64	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	B47H21006410004	Risanamento conservativo dell'edificio sito in Viale Delle Rimembranze di Lambrate n.24, da destinare a uso scolastico	PFTE rafforzato	Termini rispettati	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGIS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
65	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B43J18000130004	Nuova biblioteca lorenteggio via e. odazio	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
66	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B44E07000120004	Piano dei trasporti linea circolare 90-91 – sede riservata da p.za zavattari a p.za stuparich	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
67	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B44E21012970001	Ristrutturazione immobile di via Pianel 15 per la realizzazione di nuovi servizi abitativi	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
68	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B44E21012980001	Ristrutturazione immobile di Via Newton 15 per la realizzazione di nuovi servizi abitativi	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
69	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B47D22000150006	Interventi di riqualificazione dello spazio pubblico della stazione di Ferrovie Nord – Domodossola	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
70	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B47H20011270004	Masterplan m.u.s.t.: riqualificazione di via olona e della pista ciclabile olona – modestino – solari	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
71	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B47H21004480004	Interventi finalizzati alla riqualificazione dei sedimi stradali per la pedonalità, la ciclabilità e gli spazi pubblici nel quartiere di greco e niguarda	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
72	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B47H21004490004	Interventi finalizzati alla riqualificazione dei sedimi stradali per la pedonalità, la ciclabilità e gli spazi pubblici nel quartiere di San Siro	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
73	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B47H21008570001	Interventi di manutenzione, riqualificazione e razionalizzazione di unità immobiliari e parti comuni in edifici di edilizia residenziale pubblica nel quartiere niguarda	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
74	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B47H21008580001	Interventi di riqualificazione e razionalizzazione di unità immobiliari e parti comuni in edifici di edilizia residenziale pubblica e di spazi aperti degli edifici pubblici nel quartiere San Siro	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGIS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
75	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J42C21002820004	Demolizione e ricostruzione integrale degli edifici di edilizia residenziale pubblica di via giaggioli 7/9/11	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
76	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J49J21000080004	Sistemazioni superficiali linea m4 tratta ovest	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
77	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J49J21000090004	Sistemazioni superficiali linea m4 zona san cristofaro area sbarco passerella e collegamento ciclopeditoneale	Progettazione esecutiva	Termini rispettati	In Corso	No
78	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J49J21000100004	Sistemazioni superficiali linea m4 tratta centro	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
79	M5C2I3.01-Progetto Sport e inclusione sociale	B41B18001080004	Realizzazione e gestione di un nuovo centro natatorio nell'area sita in Milano in Via del Cardellino n.3	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
80	M5C2I3.01-Progetto Sport e inclusione sociale	B42H22003230006	Interventi di riqualificazione del Palazzetto nell'ambito del Centro Sportivo Carraro - Via dei Missaglia, 146 - Milano	Progettazione esecutiva	Termini rispettati	In Corso	No
81	PNC-A.1	B48I21002300004	Via Tofano 5: Demolizione e ricostruzione	Esecuzione	Dato Mancante		No
82	PNC-A.1	F41B21005960005	Biblioteca Europea di Informazione e Cultura	Stipula contratto	Termini rispettati		No

