CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

ATTUAZIONE DEL PNRR

COMUNE DI BERGAMO

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE 1 aprile 2025, n. 63 /2025/GEST



PRESIDENTE: SUSANNA LOI

RELATORE: MAURA CARTA

I funzionari:

GIULIA MILANI

GIUSEPPE PRO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (Relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell' adunanza pubblica del 12 marzo 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la deliberazione SRCLOM/45/2024/INPR con la quale sono stati definiti gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la nota del 16 dicembre 2024, Prot. Cdc n. 23 658, con la quale il Comune di Bergamo ha trasmesso i dati sullo stato di attuazione del PNRR in riscontro alla nota istruttoria inviata dalla Sezione;

VISTA l' ordinanza n. 57 del 27 febbraio 2025 con la quale il Presidente ha fissato l'adunanza pubblica;

VISTA la memoria e i documenti depositati dall'Ente in data 10 marzo 2025 prot. 3187;

SENTITI per il Comune di Bergamo il Dott. Pietro San Martino Segretario Generale, il Dott. Corrado Viscardi Dirigente bilancio, tributi e società partecipate, il Dott. Dimitri Rota Funzionario amministrativo e componente Cabina di Regia PNRR e la Dott.ssa Mara Vignotto Collaboratrice amministrativa della Cabina di Regia PNRR;

UDITO il relatore Maura Carta

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di BERGAMO, controllo sulla gestione ex art.7, *comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77*".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Bergamo, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il

1 aprile 2025
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

ATTUAZIONE DEL PNRR

COMUNE DI BERGAMO

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 29 LUGLIO 2021 n. 108)

INDICE

1 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 8
1.1 Avanzamento procedurale 13
1.2 Avanzamento finanziario 15
1.3 Progetti definanziati 18
2 TEMPI DI RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTERI 21
3 CRITICITA' NELL'ATTUAZIONE 23
3.1 Rimodulazioni progettuali e aumento dei costi 23
4 APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI 26
5 SISTEMA DI MONITORAGGIO 27
6 VALUTAZIONI CONCLUSIVE 28

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti attuati per il tramite delle partecipate 9
Tabella 2 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione 11
Tabella 3 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC 11
Tabella 4 - Avanzamento procedurale al 30 giugno 2024 13
Tabella 5 - Avanzamento procedurale al 30 gennaio 2025 14
Tabella 6 – Risorse impegni in bilancio e pagamenti 15
Tabella 7– Anticipazioni PNRR 18
Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Bergamo 31

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 – Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC al 30.01.2025 12
Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase) 13
Grafico 3 – Avanzamento finanziario 16

1.STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La presente relazione, in continuità con le deliberazioni della Sezione n. **252/2022/GEST** e n. **38/2024/GEST**, espone l'esito del monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (di seguito PNC) di pertinenza del Comune di Bergamo, nell'ambito del controllo di gestione previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

La verifica dello stato di avanzamento degli interventi di cui il Comune è soggetto attuatore è stata compiuta avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria, dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS[1] e delle informazioni rese dall'Organo di Revisione nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026.

Quest'ultima fonte informativa è frutto dell'adempimento[2] richiesto ai Revisori dei conti dell'Ente locale dalla Sezione delle Autonomie attraverso una griglia di rilevazione somministrata agli Enti che contiene informazioni aggiornate al **30 giugno 2024** per quanto riguarda l'avanzamento procedurale e fisico, e al **31 dicembre 2023** per l'avanzamento finanziario. Sono stati presi in considerazione anche i progetti interamente o parzialmente finanziati con risorse PNC.

In riscontro alla nota istruttoria della Sezione, il 16 dicembre 2024 il Comune ha trasmesso una dettagliata risposta.

---

[1] Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che "*I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza*." Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

[2] La Sezione delle Autonomie in allegato alle Linee Guida sul bilancio di previsione 2024-2026 (Deliberazione n. 6/SEZAUT/2024/INPR) ha richiesto ai Revisori dei conti degli enti locali di compilare una tabella precompilata con i dati relativi ai progetti attivati, fornendo informazioni circa lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei singoli CUP. I Revisori hanno dovuto trasmettere la "Tabella PNRR" non oltre il termine del 30 settembre 2024. E' bene chiarire che mentre lo stato di avanzamento procedurale si riferisce al 30 settembre 2024, lo stato dell'avanzamento finanziario è quello accertato dai dati di bilancio al 31.12.2023. Per rappresentare lo stato degli impegni e dei pagamenti si è attinto alle informazioni aggiornate alla data del 30 gennaio 2025 dalla piattaforma ReGiS.

In data **30 gennaio 2025** è stata effettuata una verifica significativa su ReGiS per acquisire altri elementi informativi e il 10 marzo 2025 è stata trasmessa un' ulteriore nota istruttoria da parte del Comune[3].

Il monitoraggio della precedente delibera della Sezione - n. **38/2024/GEST -** indicava come attivi n. 53 CUP.

Nel corso del 2024 si sono registrate variazioni, in quanto:

- n. **7** CUP presenti nel monitoraggio precedente, sono stati **definanziati**;
- n. **8** CUP risultano **aggiunti** rispetto al precedente monitoraggio;
- di questi n. 8 nuovi CUP, **1** è stato **escluso** dall'istruttoria in quanto da verifica in ReGiS il Comune non risulta soggetto attuatore (è un progetto assegnato alla Regione Lombardia – CUP H18C22000140006 *"Manutenzione straordinaria per nuova sede centro per l'impiego presso palazzo della libertà"*).

Per **n. 8 CUP** il Comune ha segnalato di **non essere soggetto attuatore bensì soggetto beneficiario**, trattandosi di interventi assegnati alle partecipate ATB Servizi S.p.A.- Azienda Trasporti di Bergamo, ATB Mobilità S.p.A. e Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A.

Per detti interventi, nella piattaforma ReGiS il Comune di Bergamo è indicato quale *soggetto attuatore* e, ai fini del presente monitoraggio, deputato alla gestione dei fondi. Di seguito sono riportati i progetti che sono attuati per il tramite di una partecipata; degli 8 totali, un progetto (CUP: H17H20001040001) risulta definanziato dal PNRR e, pertanto, non è oggetto della presente relazione.

Tabella 1 - Progetti attuati per il tramite delle partecipate

Cup	M	Descrizione	Soggetto Attuatore	% Partecipazione del Comune di Bergamo
C19J21048760001	M2	AUTOBUS URBANO ELETTRICO E RELATIVA INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DEL ALIMENTAZIONE	ATB Servizi S.p.a. -C.F. e P.IVA 02967830163	Diretta 100%
C19J21048770001	M2	AUTOBUS URBANO ELETTRICO E RELATIVA INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DEL ALIMENTAZIONE	ATB Servizi S.p.a. -C.F. e P.IVA 02967830163	Diretta 100%
H10J20000000008	M2	PIANO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - EROGAZIONE CONTRIBUTI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI AUTOBUS - ANNI 2019-2023	ATB Servizi S.p.a. -C.F. e p.iva 02967830163	Diretta 100%
H11B21006730001	M2	E-BRT BERGAMO-DALMINE	ATB Mobilità S.p.a. CF e P.IVA 02485010165 Servizi S.p.a. - C.F. e P.IVA 02967830163	Diretta 100%

[3] con nota prot. 3187 del 10 marzo 2025

Cup	M	Descrizione	Soggetto Attuatore	% Partecipazione del Comune di Bergamo
H17H20001040001 (**segnalato come definanziato**)	M2	ZONE 30 DEI QUARTIERI CITTADINI*COMUNE DI BERGAMO (QUARTIERI VARI)*REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ZONE 30 DEI QUARTIERI CITTADINI DEL COMUNE DI BERGAMO	ATB Servizi S.p.a. -C.F. e P.IVA 02967830163	Diretta 100%
H19J22001050008	M2	ACQUISTO DI AUTOBUS CLASSE I, ELETTRICI, ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA NELL'AREA URBANA DI BERGAMO E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA DI RICARICA	ATB Servizi S.p.a. -C.F. e P.IVA 02967830164	Diretta 100%
H21D18000120001	M2	LINEA TRAMVIARIA T2 DELLA VALLE BREMBANA	TEB S.p.a. - C.F. e P.IVA 02802700167	Indiretta (partecipazione del 55% tramite A T B Mobilità S.p.A.)
J19J22001980008	M2	ACQUISTO DI N° 2 AUTOBUS ELETTRICI, COMPRENSIVI DI RELATIVA INFRASTRUTTURA DI RICARICA	ATB Servizi S.p.a. -C.F. e P.IVA 02967830166	Diretta 100%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base della tabella PNRR

Invitata a chiarimenti sul punto, in vista dell'Adunanza pubblica del 12 marzo 2025, l'Amministrazione ha precisato che: "*I n. 7 CUP sopra indicati risultano sul sistema ReGiS in capo al Comune di Bergamo in qualità di soggetto beneficiario dei relativi fondi. L'indicazione del Comune di Bergamo, sempre in piattaforma ReGiS, quale soggetto attuatore deriva da un'impostazione anagrafica del Ministero competente, senza che il comune di Bergamo sia autonomamente titolato ad effettuare modifiche. … si è provveduto a segnalare tale circostanza al fine di richiedere i conseguenti correttivi*".

Con la stessa nota sono state trasmesse, per ciascun CUP, le delibere di approvazione e gli schemi di convenzione con le quali le società partecipate sono state indicate quali "soggetti attuatori dell'intervento".

All' esito dell'istruttoria i CUP in capo al Comune risultano **53**, comprensivi dei 7 progetti sopra indicati.

Il finanziamento con fondi PNRR come accertato al 30 gennaio 2025, è pari **a 263.871.529,12 euro**, in aumento di 50.024.205,59 euro rispetto al dato del 2023 (213.388.517,31 euro): la differenza è dovuta all'incremento della quota del finanziamento PNRR per il CUP H21D18000120001 "LINEA TRAMVIARIA T2 DELLA VALLE BREMBANA" (da 50 a 100 milioni di euro).

I **53 progetti** di cui il Comune di Bergamo risulta soggetto attuatore/beneficiario sono rappresentati nella seguente tabella, aggregati per Missione.

Tabella 2 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione

	n. CUP
M1 - Digitalizzazione della PA	6
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	14
M4 - Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido	6
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	26
M1 – finanziato da Piano Nazionale Complementare	1
Totale	**53**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dei dati estratti da ReGiS il 30 gennaio 2025.

Tra questi CUP n. 6 si trovano nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA) a cui si aggiunge un ulteriore progetto finanziato dal PNC, n.14 si trovano nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), n. 6 nella Missione 4 (Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido) e n. 26 nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità).

Nella tabella che segue sono rappresentate le fonti di finanziamento per le distinte Missioni.

Tabella 3 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC

Fonti	M1	M2	M4	M5	M1 -PNC	Tot.	% Fonti/Tot
Fondi PNRR	1.843.610,00 €	203.079.390,59 €	9.169.296,00 €	49.779.232,53 €	- €	**263.871.529,12 €**	**64,26%**
Fondi FOI	- €	31.302.479,84 €	916.929,60 €	5.157.226,18 €	- €	**37.376.635,62 €**	**9,10%**
Fondi altra fonte pubblica	- €	72.260.355,40 €	- €	2.219.875,81 €	- €	**74.480.231,21 €**	**18,14%**
Risorse proprie	- €	10.670.304,46 €	1.347.010,08 €	19.985.300,79 €	- €	**32.002.615,33 €**	**7,79%**
Fondi PNC	- €	- €	- €	- €	12.346,40 €	**12.346,40 €**	**0,00%**
Fondi FPOP	- €	- €	- €	103.934,73 €	- €	**103.934,73 €**	**0,03%**
Fondi Privati	- €	2.768.231,00 €	- €	- €	- €	**2.768.231,00 €**	**0,67%**
Finanziamento Totale	**1.843.610,00 €**	**320.080.761,29 €**	**11.433.235,68 €**	**77.245.570,04 €**	**12.346,40 €**	**410.615.523,41 €**	**100,00%**
% Miss/Tot	**0,45%**	**77,95%**	**2,78%**	**18,81%**	**0,00%**	**100,00%**	


Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 30 gennaio 2025

Dal prospetto emerge che il 78 per cento ca. dei finanziamenti totali è concentrato nella Missione 2, il 18 per cento ca. nella Missione 5, mentre sono residuali le percentuali assegnate alle Missioni 1 e 4.

Nel dettaglio, il Comune di Bergamo risulta soggetto attuatore/beneficiario di fondi PNRR pari a 263.871.529,12 euro, di fondi FOI pari a 37.376.635,62 euro, di fondi PNC pari a 12.346,40 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica e propri, per un ammontare complessivo di **410.615.523,41 euro.**

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 64,26 per cento del totale, mentre le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC) sono pari allo 0,003 per cento del totale. Il resto delle risorse proviene da fondi propri dell'Ente e dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI)[4], risorse che contribuiscono con il 16,90 per cento dei fondi complessivi a cui occorre aggiungere il 18,14 per cento di altri finanziamenti pubblici e risorse per la prosecuzione delle opere pubbliche (FPOP[5]) lo 0,004 per cento delle risorse totali.

Grafico 1 – Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC al 30.01.2025

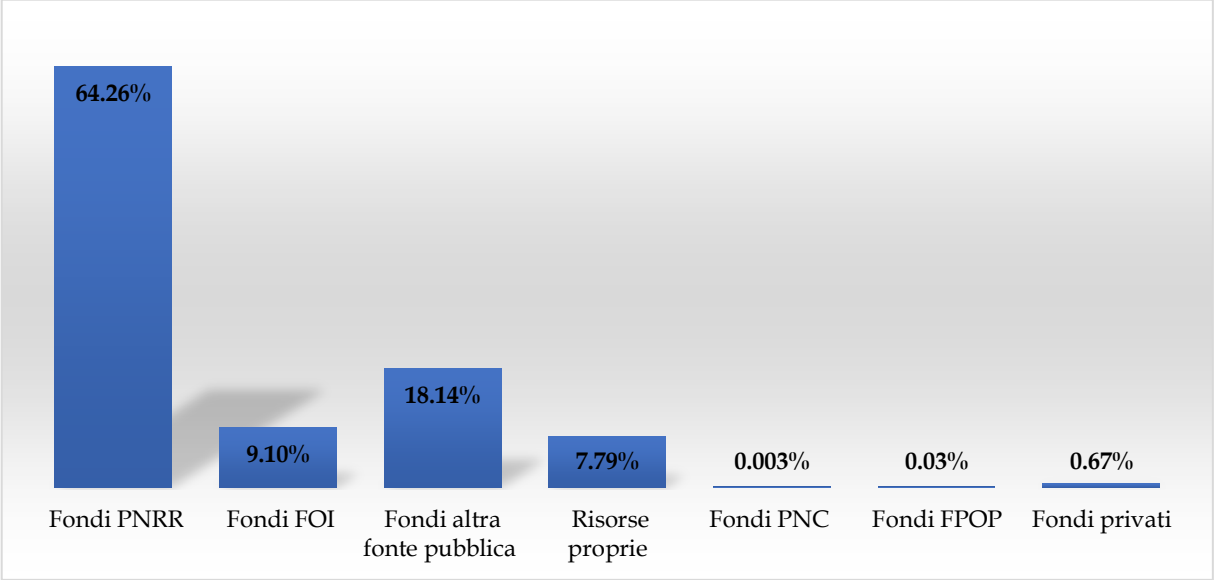

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla Tabella in calce alla relazione.

*

[4] Per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il c.d. DL Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta. Nello specifico, l'articolo 26, comma 7, del predetto DL n. 50/2022 ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, finalizzato a consentire l'avvio entro il 31/12/2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. Allo stanziamento iniziale di complessivi 7.500 milioni di euro, sono stati aggiunti ulteriori 1.300 milioni, previsti dall'articolo 34 del DL n. 115/2022, per complessivi 8,8 miliardi di euro dal 2022 al 2027.

[5] l'articolo 26 comma 6 ter del D.L. n. 50/22 e s.m.i. ha previsto risorse suppletive per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale. La misura è stata più volte prorogata e, da ultimo, dalla L. 30 dicembre 204, n. 207.

1.1 Avanzamento procedurale

L'avanzamento procedurale di ogni singolo progetto è stato rilevato al **30 giugno 2024** sulla base di quanto dichiarato dai Revisori dell'Ente nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026.

Tabella 4 - Avanzamento procedurale al 30 giugno 2024


FASI	M1	M2	M4	M5	M1-PNC	Totale complessivo	% Totale
In avvio	1	3	-	4	-	**8**	15,09%
Conferenza servizi	-	2	-	-	-	**2**	3,77%
In aggiudicazione	-	-	-	1	-	**1**	1,89%
Esecuzione lavori/fornitura	2	2	6	12	-	**22**	41,51%
Collaudo/CRE	3	-	-	9	-	**12**	22,64%
Conclusi	-	-	-	-	1	**1**	1,89%
N.D.	-	7	-	-	-	**7**	13,21%
Totale complessivo	**6**	**14**	**6**	**26**	**1**	**53**	**100,00%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base della tabella PNRR

Per i 7 progetti della Missione 2, rispetto ai quali il Comune si dichiara "non soggetto attuatore", in quanto realizzati per il tramite di una società partecipata, la Tabella PNRR non riporta informazioni (sono indicati come "N.D.").

Il grafico seguente fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale: n. 11 progetti risultano nella fase iniziale, n. 22 sono in corso di realizzazione, n. 12 sono in attesa del collaudo/certificazione di conformità ed 1 risulta concluso.

Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase)

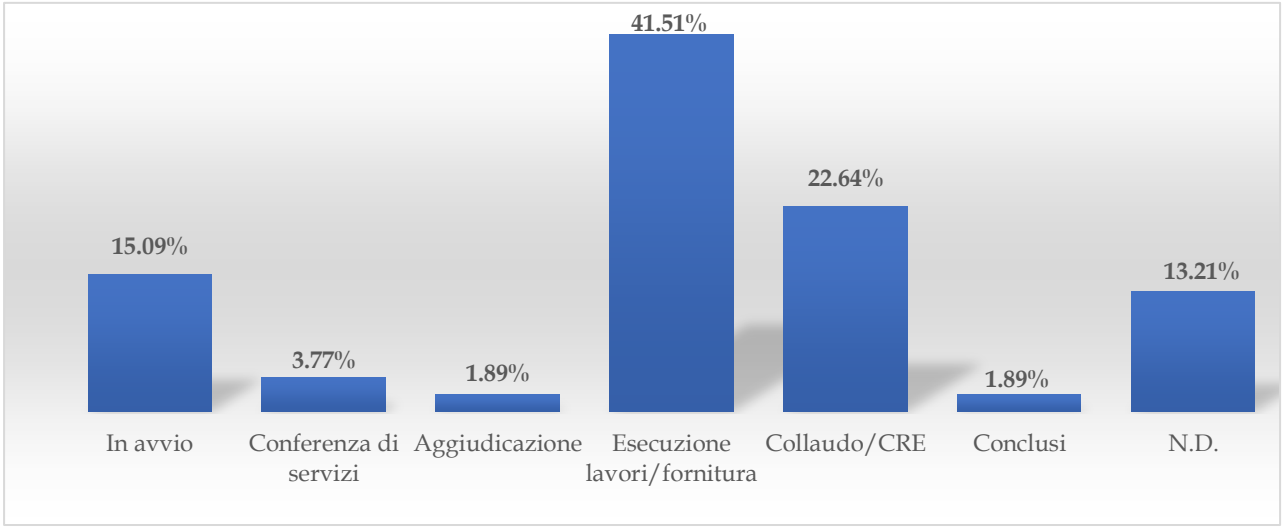

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati della tabella PNRR al 30 giugno 2024

La successiva verifica su ReGiS alla data del **30 gennaio 2025** evidenzia un avanzamento procedurale, senza distinzione delle fasi, come meglio risulta dalla seguente tabella.

Tabella 5 - Avanzamento procedurale al 30 gennaio 2025

MISSIONE	M1	M2	M4	M5	M1-PNC	Totale complessivo	% Totale
In corso	2	13	6	21	-	**42**	79,25%
Concluso	4	1	-	5	1	**11**	20,75%
Totale	**6**	**14**	**6**	**26**	**1**	**53**	**100,00%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 30 gennaio 2025

Al 30 gennaio 2025 risultano n. 42 progetti in corso di esecuzione e n. 11 conclusi, rispettivamente, pari a ca. l'80 per cento e a ca. il 21 per cento dei CUP in esame.

Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un **cronoprogramma** predefinito dal PNRR a livello nazionale, per consentire l'accertamento dei traguardi qualitativi e quantitativi (*milestone* e *target*) e favorire la tempestiva individuazione di eventuali ritardi (art. 8, co.5 D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021).

Questo implica che i diversi progetti si devono sviluppare e devono essere ultimati secondo una precisa sequenza temporale.

Con riguardo al cronoprogramma la Sezione ha constatato l'assenza di informazioni da parte dei Revisori dell'Ente nella Tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2024-2026.

In data 10 marzo 2025 l'Ente ha trasmesso l'elenco aggiornato degli interventi attivi, la data prevista per l'ultimazione dei lavori/servizi/forniture previste e, ove già conclusi, la data di ultimazione effettiva dei lavori/servizi/forniture, precisando "*come l'avanzamento procedurale degli interventi sia in linea e comunque coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee e non vengono segnalate particolari criticità in merito agli interventi ivi indicati. Unica eccezione è l'intervento oggetto del CUP* ***H11B21002620002*** *il cui attuale termine previsto di esecuzione (24.4.2026) oltrepassa, seppur in misura ridotta, la prescritta milestone del 31.3.2026. Si evidenzia che lo scostamento, lieve, rispetto alla milestone del 31.3.2026 deriva dal gravissimo evento meteorologico che ha colpito la città di Bergamo in data 9.9.2024, con esondazioni del torrente Morla nei pressi del cantiere che hanno determinato una parziale sospensione dei lavori…. Per tale aspetto correlato allo*

slittamento del termine di ultimazione previsto è già stata data comunicazione al Ministero competente. In conclusione, l'Amministrazione comunale ha ***ultimato n° 21 interventi****; non risultano allo stato attuale contenziosi giurisdizionali".*

L'elenco trasmesso dall'Ente riporta, per ciascun CUP, la data prevista contrattualmente e quella effettiva di conclusione; è stato rilevato che alcuni interventi conclusi in anticipo rispetto alla data prevista (rinnovo flotte bus, lavori di riqualificazione esterna scuola d'arte Carrara, rifacimento campo di calcio in via Acquaderni, pista ciclabile in via Bianzana, cestini compattanti e sensore di riempimento).

*

1.2 Avanzamento finanziario

L'art.15 del d.l. 77/2021 ha accelerato l'avvio degli interventi PNRR ammessi al finanziamento, stabilendo che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie che sono loro attribuite su specifici capitoli di spesa sin dalla data del decreto o atto di riparto, ovvero, ancora prima che le risorse risultino impegnate dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l'accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa.

Lo stato di avanzamento finanziario di cui qui si riferisce riguarda le risorse impegnate in bilancio e i pagamenti effettuati al 30 gennaio 2025 in base a ReGiS.

Tabella 6 – Risorse impegni in bilancio e pagamenti

Missione	n. CUP	Totale dei finanziamenti (€)	Impegni (€)	% impegni su totale dei finanziamenti	Pagamenti (€)	% pagamenti su totale degli impegni
M1	6	1.843.610,00 €	413.639,00 €	22%	413.639,00 €	100%
M2	14	320.080.761,29 €	238.130.091,28 €	74%	76.215.978,36 €	32%
M4	6	11.433.235,68 €	9.798.189,40 €	86%	5.320.328,94 €	54%
M5	26	77.245.570,04 €	50.396.209,33 €	65%	17.888.159,00 €	35%
M1-PNC	1	12.346,40 €	12.346,40 €	100%	12.346,40 €	100%
Totale	**53**	**410.615.523,41 €**	**298.750.475,41 €**	**73%**	**99.850.451,70 €**	**33%**


Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati REGIS al 30 gennaio 2025.

La tabella mostra il finanziamento totale, ovvero le risorse a disposizione del Comune di Bergamo per attuare i progetti del PNRR e PNC e riporta la percentuale e l'importo dei pagamenti effettuati dal Comune in relazione agli impegni assunti nel bilancio:

- per la Missione 1 si constata un livello di impegno pari a circa il 22 per cento del totale dei fondi, seguito il pagamento integrale; per il progetto della Missione 1 finanziato PNC le somme sono integralmente impegnate e pagate;
- per la Missione 2 sono stati impegnati in bilancio 238.130.091,28 euro , pari al 74 per cento dei finanziamenti, seguiti da pagamenti per 76.215.978,36 euro (il 32 per cento);
- per la Missione 4 sono stati impegnati in bilancio 9.798.189,40, l' 86 per cento dei finanziamenti assegnati. Sono stati eseguiti pagamenti per 5.320.328,94 (il 54 per cento);
- per la Missione 5 sono stati impegnati 50.936.209,33, il 65 per cento delle risorse assegnati. Sono stati eseguiti pagamenti per 17.888.159,00 (il 35 per cento).

Per una migliore lettura si propongono i dati anche in forma grafica.

Grafico 3 – Avanzamento finanziario

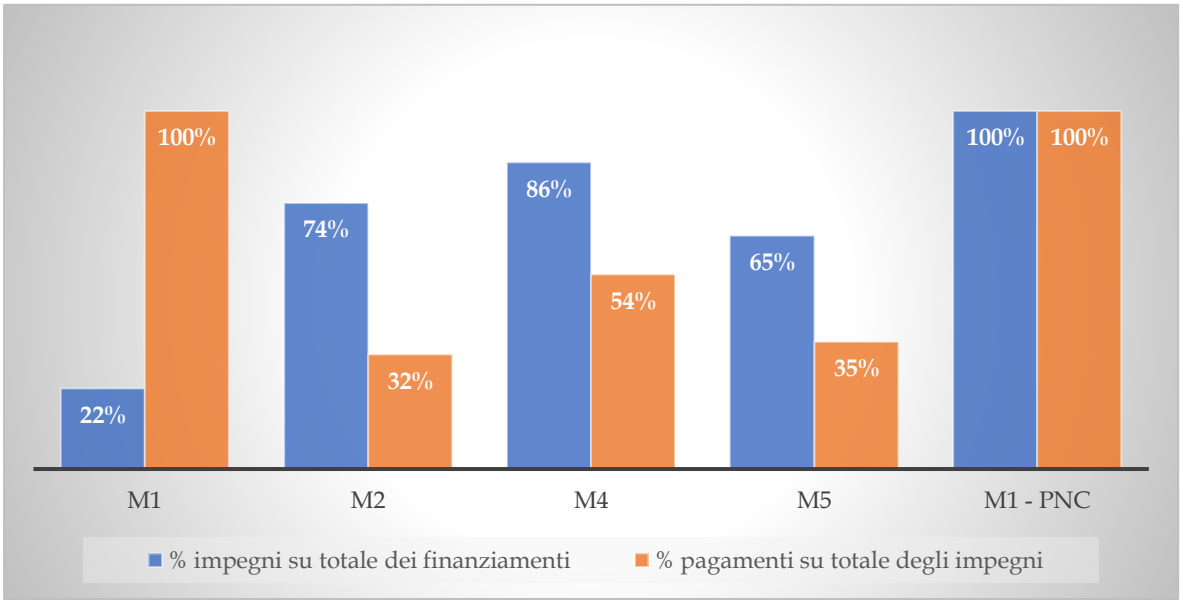

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati REGIS al 30 gennaio 2025.

Per quanto concerne le **anticipazioni**, si rammenta che il PNRR ha previsto che l'avvio dei progetti precede il finanziamento ma, per gli enti privi di capienza finanziaria l'art.

9, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 152 del 2021 "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*", aveva previsto la possibilità di disporre di anticipi di liquidità, nella misura del **10 per cento** delle risorse complessive assegnate, su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale, da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR.[6]

Nel tempo sono intervenute ulteriori modifiche del quadro normativo finalizzate a velocizzare i flussi finanziari del PNRR e, da ultimo, l'art. 18-quinquies "disposizioni finanziarie in materia di PNRR" del D.L. n. 113/2024 (conv. in L. n. 143 del 7 ottobre 2024) ha previsto che "*le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo* ***del 90 per cento*** *del costo dell'intervento a carico del PNRR…"*. Per l'attuazione di questa previsione è stato adottato il decreto MEF del 6 dicembre 2024 recante "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2025, i cui effetti potranno essere apprezzati nel successivo monitoraggio.

Di seguito si espone lo stato delle anticipazioni erogate al Comune di Bergamo, con talune precisazioni.

I dati riportati nella **tabella 7** sono riferiti a diverse soglie temporali: per l'anticipazione concessa dalle amministrazioni titolari e i successivi pagamenti i dati sono riferiti al **31 dicembre 2023**, sulla base di quanto riportato nella Tabella PNRR dei Revisori, mentre le informazioni sull'importo complessivo del finanziamento PNRR, sugli impegni iscritti a bilancio e sul fondo pluriennale vincolato di spesa sono aggiornate al **30 giugno 2024**.

L'importo di finanziamento PNRR riportato nella tabella sottostante, ricavata dalla Tabella PNRR al 30 giugno 2024, differisce da quello accertato al 30 gennaio 2025 e indicato nelle tabelle precedenti (vd. tabella 3) principalmente per la mancata valorizzazione di n. 2 progetti (CUP H11B21006730001 "E-BRT BERGAMO-DALMINE" e CUP H21D18000120001 "LINEA TRAMVIARIA T2 DELLA VALLE BREMBANA") finanziati dal PNRR per oltre 180 milioni di euro.

[6] La contabilizzazione di questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso decreto, "*per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR*".

Tabella 7– Anticipazioni PNRR

MISSIONE	CUP	Finanziamento PNRR	Anticipazione PNRR	% anticipazione sul PNRR	Impegni a valere su risorse PNRR e/o PNC	FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	Pagamenti PNRR e/o PNC
M1	6	1.843.610,00 €	- €	-	- €	- €	- €
M2	14	12.359.781,59 €	1.295.000,00 €	10%	8.076.710,84 €	869.645,69 €	650.786,65 €
M4	6	9.169.296,00 €	916.929,60 €	10%	9.169.296,00 €	555.116,05 €	732.317,34 €
M5	26	49.780.540,32 €	4.480.585,33 €	9%	47.404.052,03 €	2.443.092,47 €	11.067.666,26 €
PNC	1	- €	- €	-	- €	- €	- €
Totale complessivo	**53**	**73.153.227,91 €**	**6.692.514,93 €**	**9%**	**64.650.058,87 €**	**3.867.854,21 €**	**12.450.770,25 €**

Fonte: elaborazione Corte dei Conti sulla base della Tabella PNRR al 30 giugno 2024

Come si ricava dalla tabella, per le missioni 2, 4 e 5 sono state concesse anticipazioni non superiori al 10 per cento del totale del PNRR.

Nessuna anticipazione è stata corrisposta per la Missione 1, trattandosi di fondi che, di regola, vengono tempestivamente erogati.

La percentuale complessiva è stata calcolata tenendo conto dei finanziamenti per tutti i 53 CUP elencati dai Revisori.

Risultano, alla data del 31 dicembre 2023, pagamenti superiori alle anticipazioni, effettuati attingendo alla cassa disponibile.

*

1.3 Progetti definanziati

La versione iniziale del PNRR (approvata dal Consiglio della UE del 13 luglio 2021) è stata oggetto finora di quattro modifiche[7].

La più rilevante è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 ed è stata approvata dal Consiglio della UE l'8 dicembre 2023 con una rimodulazione e un incremento di 2,9 miliardi dei fondi UE a favore dell'Italia (pari a 194,4 miliardi) con l'inserimento della nuova Missione 7 (RePowerEU) ed altre modifiche alle misure originariamente previste. Queste ultime sono divenute necessarie per criticità di natura oggettiva

[7] la prima modifica, nel luglio 2023 è stata approvata dal Consiglio UE del 19 settembre 2023, ha riguardato milestones e targets (M&T). La seconda è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 e approvata dal Consiglio della UE l'8 dicembre 2023. La terza modifica, richiesta dal Governo il 4 marzo 2024 è stata approvata dal Consiglio della UE il 14 maggio 2024 (correzione di 55 errori materiali). La quarta modifica è stata richiesta dal Governo il 10 ottobre 2024 e approvata dal Consiglio della UE il 12 novembre 2024

dovute principalmente all'aumento dei costi, alla scarsità di materiali, ai limiti del sistema produttivo[8].

Dopo la revisione del PNRR, approvata con decisione del Consiglio dell'UE dell' 8 dicembre 2023, alcune misure sono state de-finanziate totalmente o parzialmente, ovvero sono state sostituite le fonti del finanziamento con fondi statali o di altra fonte europea.

Il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR*)", convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, all'art. 1 ha riconosciuto l'esigenza di recuperare le necessarie risorse finanziarie per coprire il fabbisogno necessario per assicurare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano.

La predetta normativa ha *salvaguardato i progetti con obbligazioni giuridicamente vincolanti*, vale a dire quelli per i quali vi sia stata l'assunzione dell'impegno contabile ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 oppure nei casi di stipula del contratto.

La norma ha, inoltre, previsto che, dopo l'individuazione degli interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento, nell' ipotesi di mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano rese indisponibili le relative risorse.

Il quadro generale dei definanziamenti e rifinanziamenti è riportato in modo dettagliato nell'art. 1, comma 8 del DL 19/2024: è previsto lo stanziamento delle ingenti risorse nazionali necessarie per la copertura finanziaria dei progetti definanziati ovvero parzialmente fuoriusciti dal PNRR.

Il 29 ottobre 2024, su richiesta del Governo, la Commissione ha assentito alcune ulteriori proposte di modifica al PNRR italiano, rispetto alla revisione più ampia dell'8 dicembre 2023; le stesse sono state poi approvate dal Consiglio europeo il 18 novembre 2024.

Sullo sfondo di tale inquadramento normativo si riferisce dei progetti che i Revisori del Comune di Bergamo hanno elencato come definanziati totalmente o parzialmente. Risultano totalmente definanziati n. **7 CUP,** tutti ricompresi nella M2 per "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*" di ammontare complessivo di 5.150.000,00 euro.

[8] La problematica è stata oggetto della nota di lavoro 2/2024 – la riforma del codice dei contratti e la rimodulazione del PNRR – Ufficio parlamentare del bilancio dicembre 2024

Il Comune ha riferito che tutti i progetti stralciati sono stati integralmente rifinanziati con risorse a carico del bilancio dello Stato.

2. TEMPI DI RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTERI

Come sopra rilevato, l'art. 1 del D.M. MEF del 6 dicembre 2024 ha previsto la possibilità di anticipazioni fino al 90% e disposto che "*A fronte delle erogazioni effettuate ai sensi del presente decreto, le amministrazioni titolari di misura provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati dei trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori*".

La verifica al 30 gennaio 2025 non ha consentito di apprezzare gli effetti di queste innovative previsioni che saranno accertati nel prossimo monitoraggio.

I dati sui tempi di rimborso sono quelli indicati dall'Ente nel riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024.

Sono stati trasmessi alle amministrazioni titolari n. **21** rendiconti.

Fatta eccezione per gli interventi della Missione 1, per i quali decorso un breve termine dalla rendicontazione, le risorse sono state erogate in tempi brevi, vengono segnalate criticità per i progetti di seguito elencati:

a. **CUP H10J20000000008** M2 - piano strategico della mobilità sostenibile - erogazione contributi da destinare all'acquisto di autobus - anni 2019-2023; il rendiconto di 3.402.125,00 è stato trasmesso in data 16 febbraio 2024. Il pagamento, dopo un'integrazione istruttoria, è avvenuto dopo 159 giorni;
b. **CUP H11B21002610004** M5 - presentato il rendiconto di 208.629,30 euro il 30 ottobre 2023. Non risulta pervenuto alcun pagamento;
c. **CUP H11B21002620002** M5. Il rendiconto di 1.440.021,63 euro è stato presentato in data 28 ottobre 2024, ma non è ancora pervenuto il pagamento;
d. **CUP H11B21006730001** -M2 di E-BRT BERGAMO-DALMINE di 80 milioni di euro. È stato trasmesso il resoconto per 651.751,68 il 25 gennaio 2024. Dopo un'integrazione istruttoria non è pervenuto alcun pagamento;
e. **CUP H11B22001930006** -M2 rendiconto di 275.425,34 euro in data 5 dicembre 2023. Alla data odierna non è pervenuto alcun pagamento;
f. **CUP H13D21000650004**- M5. È stato trasmesso il rendiconto di 203.795,06 il 22 marzo 2024. Dopo una richiesta istruttoria non c'è stato alcun trasferimento;
g. **CUP H13D21000660004**- M5 . È stato trasmesso il rendiconto di 194.310,47 euro in data 28 ottobre 2024, ma non è ancora avvenuto alcun trasferimento;
h. **CUP H14E21000520004 –** M5. È stato trasmesso il rendiconto di 264.398,85 euro in data 23 ottobre 2023, ma nel frattempo non è intervenuto alcun trasferimento;

i. **CUP H15F21000370004** – M5. È stato trasmesso il rendiconto di 1.668.650,86 euro in data 23 febbraio 2024 con successiva richiesta di integrazione da parte del Ministero il 16 ottobre 2024; alla data odierna non è ancora pervenuto alcun trasferimento;
j. **CUP H16G20000210004**- M5. È stato trasmesso il rendiconto di 243.551,33 euro in data 15 maggio 2024 con successiva richiesta di integrazione da parte del Ministero il 16 ottobre 2024, ma non è pervenuto alcun trasferimento;
k. **CUP H17H21001440004**- M5. È stato trasmesso il rendiconto di 578.173,89 euro in data 6 novembre 2024, ma nel frattempo non è avvenuto alcun trasferimento;
l. **CUP H17H21001470004**- M5. È stato trasmesso il rendiconto di 307.614,72 euro in data 6 novembre 2024, ma nel frattempo non è avvenuto alcun trasferimento;
m. **CUP H19E20000010004**-M5. È stato trasmesso il rendiconto di 1.214.766,20 euro in data 31 marzo 2023 con successiva richiesta di integrazione da parte del Ministero il 16 ottobre 2024, ma nel frattempo non c'è stato alcun trasferimento;
n. **CUP H19J21002270004**-M5. È stato trasmesso il rendiconto di 238.275,39 euro in data 30 ottobre 2024, ma nel frattempo non c'è stato alcun trasferimento.

Da quanto precede, emerge una tempistica significativa che, pur dopo la trasmissione dei rendiconti e le eventuali integrazioni istruttorie, vede un tempo di "ritardo" stimato tra **154 giorni** e **565 giorni**.

Tempi così dilatati per disporre i trasferimenti, ai quali auspicabilmente si potrà porre rimedio in futuro con le misure previste dal decreto MEF del 6 dicembre 2024, possono rappresentare una grave rischio per gli equilibri finanziari del Comune e comportano effetti dannosi per le imprese che hanno eseguito i lavori, in disparte ogni considerazione su eventuali future problematiche contrattuali con le imprese esecutrici e fornitrici.

3. CRITICITA' NELL'ATTUAZIONE

1.4 Rimodulazioni progettuali e aumento dei costi

La Tabella PNRR dei Revisori non segnala criticità, ma evidenzia alcuni casi nei quali si è resa necessaria una **rimodulazione**.

Per alcuni progetti vi sono stati lievi **incrementi** rispetto all'importo del PNRR.

Il dettaglio è stato illustrato dal Comune in un file Excel del 10 marzo 2025 che di seguito si riassumono:

- M2 - **CUP H11E22000330001** (acquisto ed installazione di isole ecologiche con dispositivo per disabile rd raee). Il finanziamento PNRR è di 486.254,91. Rimodulazione di 489.626,00 euro;
- M2 - **CUP H11E22000340001** (acquisto ed installazione di cestini con meccanismo compattante del rifiuto e sensori di riempimento). Il finanziamento PNRR è di 984.322,00 euro con previsione di incremento a 999.922,00 euro;
- M2 – **CUP H11E22000350001** (fornitura e posa di eco-isole interrate e informatizzate per la raccolta differenziata del rifiuto) Finanziamento PNRR di 989.237,68 euro con previsione di incremento fino a 1.000.000,00 euro.

Per i seguenti progetti la rimodulazione è riconducibile a esigenze tecniche:

- M2 - **CUP H12F22001230001** (centro di raccolta rifiuti). Importo finanziamento PNRR 1.000.000,00. Rimodulazione con risorse proprie 1.500.000,00 per un costo totale di 2.500.000,00;
- M2- **CUP H12F22001240001** (nuovo centro del riuso). Finanziamento PNRR 1.000.000,00. Intervento rimodulato in riduzione ad euro 1.000.000,00 (solo fondi PNRR) a fronte dell'importo di euro 1.309.611,00 previsto in fase di attivazione CUP sulla base dell'originario livello progettuale.

*

Tra le criticità rilevate in sede di attuazione del PNRR vi è stato il significativo e progressivo **incremento dei prezzi**.

Il contesto geopolitico ed economico internazionale ha, da tempo, intensificato tensioni nei prezzi dei beni energetici e determinato spinte inflazionistiche i cui effetti si sono riverberati significativamente sulla dinamica delle spese nei diversi settori produttivi.

Poco tempo dopo l'approvazione del PNRR, nella consapevolezza del costante incremento dei prezzi, il Governo ha introdotto il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - FOI, con il DL 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022. Successivamente, per fronteggiare l'aumento dei costi dei costi e favorire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, nel secondo semestre 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto 11 luglio 2023 per l'assegnazione di ulteriori risorse al fine di consentire l'affidamento dei lavori con prezzi adeguati ai rincari.

Il primo monitoraggio sull'aumento dei prezzi per i progetti finanziati dal PNRR è stato effettuato dalla Banca d' Italia nella relazione del maggio 2023 evidenziando che "*In relazione all'aumento dei prezzi di materie prime e materiali da costruzione, si stima che alla fine del 2022 il costo dei progetti inclusi nel Piano era cresciuto in media di circa il 10 per cento rispetto a quanto inizialmente preventivato*." [9].

Dati e documenti più dettagliati sono stati esposti dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo che, nella Relazione al Parlamento del 6 novembre 2023, ha osservato "…*Guardando il dato aggregato, ponderato in base al peso della spesa associata agli interventi, si può stimare che con l'attuale livello dei prezzi l'aumento di prezzo ponderato per la produzione dei beni e servizi nell'ambito del PNRR sia nell'ordine del 10,7 per cento*.."[10].

La successiva Relazione sul PNRR al Parlamento del maggio 2024 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti sottolinea come "..*In circa un terzo dei casi, le scelte di rifinanziamento riguardano iniziative di investimento per le quali le modifiche hanno trovato giustificazione nell'aumento dei costi stimati a causa dell'inflazione; in altrettante ipotesi le ragioni alla base dei rifinanziamenti sono riscontrabili nell'esigenza di attuare alternative migliori per conseguire il medesimo livello di ambizione originariamente fissato ovvero in cambiamenti nella domanda di m*ercato.." (N. 41/ SSRRCO/REF/2024).

Il Comune di Bergamo ha evidenziato di aver incontrato maggiori costi per un CUP per rispetto dei criteri DNSH:

[9] Lo stato di attuazione del PNRR in Banca d'Italia, Relazione annuale sul 2022

[10] Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo – novembre 2023 - Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (cfr. n. 34/ SSRRCO/REF/2023)

- **M5 – CUP H18C22000140006 -** manutenzione straordinaria per nuova sede centro per l'impiego presso palazzo della libertà - Importo finanziato dal PNRR 400.000,00 - risorse proprie 65.0000,00 – totale progetto 465.000,00. La rimodulazione dei prezzi necessaria per il **rispetto dei criteri DNSH.**

Per altri 20 progetti è stato previsto il cofinanziamento del Comune con risorse proprie per incrementi dei costi riconducibili a esigenze tecniche sopravvenute in fase di progettazione ed esecuzione.

Invitata a chiarimenti sul punto, in vista dell'Adunanza pubblica del **12 marzo 2025**, l'Amministrazione ha precisato che *"le richieste di rimodulazione in aumento sono riferite sia ad esigenze rilevate in fase di progettazione (miglioramento progetto e adeguamento conseguente ad aumento costi materie) sia in fase di esecuzione (esigenze sopravvenute per rinvenimenti imprevisti o migliorie funzionali degli interventi). Si rileva come, in alcuni casi, ad esempio per la linea di finanziamento della "Rigenerazione urbana" del Ministero dell'Interno, l'attivazione della richiesta di contributo sia stata effettuata sulla base di una ricognizione del fabbisogno e indicazione dei target attesi e indicatori di riferimento, sulla base dei decreti ministeriali all'uopo emanati; quindi in sede di candidatura sono stati valorizzati solo elementi quantitativi e non qualitativi, pertanto non accompagnati ad una progettualità. Lo sviluppo conseguente dei livelli progettuali, correlata alle esigenze sopravvenute, ha determinato l'incremento dei relativi costi, cui l'Amministrazione comunale ha fatto fronte con risorse proprie. Parimenti la linea di finanziamento correlata al PINQuA prevedeva la produzione di solo progetto di fattibilità "semplificato". Da ultimo, anche con riferimento ai n. 5 asili nido oggetto di rimodulazione, si evidenzia come la candidatura al finanziamento PNRR, peraltro con termini assai ristretti, sia stata presentata sulla base di schede di progetto con costi su base parametrica".*

A corredo di tali informazioni, l'Ente ha altresì trasmesso un prospetto riepilogativo dei **26 CUP** oggetto di rimodulazione (in alcuni casi anche più di una), per l' incremento dei prezzi dei materiali, maggiori costi di progettazione o per esigenze sopravvenute in fase di progetto. Essendo stati modificati i quadri economici degli interventi si è provveduto al cofinanziamento con risorse proprie del Comune.

4. APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI

Nel riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024 il Comune di Bergamo ha riferito in ordine all' applicazione delle norme contabili.

Nel dettaglio:

- con riguardo alle procedure di **contabilizzazion**e applicate ai progetti finanziati con i fondi del PNRR e/o PNC ai sensi dell'art. 15 (procedure finanziarie e contabili) del d.l. n. 77/2021 e del D.M. 11 ottobre 2021, è stata confermata l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sulla base del cronoprogramma della spesa e nel pieno rispetto della disciplina armonizzata ai sensi del decreto 23 giugno 2011, n. 118 (allegato 4/2 paragrafo 5.4 "il fondo pluriennale vincolato"), solamente a seguito dell'effettivo incasso delle anticipazioni erogate dalle Amministrazioni centrali titolari (in particolare nelle annualità 2022 e 2023), come previsto dall'Art. 2 del DM 11 ottobre 2021 e dalla FAQ n. 48/2021 RGS;
- si accerta la **tracciabilità dei flussi finanziari** tramite l'apertura di un sottoconto vincolato presso il Tesoriere comunale sul quale transitano gli ordinativi di incasso e pagamento emessi a valere su fondi PNRR;
- gli uffici individuano appositi capitoli all'interno del bilancio di previsione, integrati nella descrizione della missione, componente, investimento e CUP, per garantire l'individuazione delle specifiche entrate e uscite di ogni singolo intervento finanziato o cofinanziato da risorse PNRR/PNC.

5. SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il Comune di Bergamo sin dall' avvio dei progetti PNRR ha costituito una cabina di regia, preordinata al coordinamento e al controllo dei programmi, progetti e interventi del PNRR e PNC con disposizione di servizio del Direttore Generale n. 20 del 30 settembre 2022.

Tale struttura è stata successivamente integrata, nella sua composizione, con disposizione di servizio del Direttore Generale n. 10 del 17 gennaio 2023.

Nel riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024 il Comune ha riferito di non aver apportato correttivi al sistema dei controlli interni e della governance.

È stato riferito che il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente" dedicata al PNRR viene regolarmente aggiornato e la verifica eseguita ha confermato che fino al dicembre 2024 tale sezione Amministrazione è chiara e completa.

Alla luce degli aggiornamenti documentali forniti dal Comune in prossimità dell'adunanza pubblica ove è stato riferito della conclusione di n. 21 progetti e dell'osservanza della tempistica prevista, la Sezione rileva come la struttura di *governance* abbia assicurato un avanzamento procedurale in linea e coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione, sulla base delle informazioni contenute nella Tabella PNRR compilata dai Revisori dell'Ente allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 (che contiene informazioni circa dati di bilancio al 31 dicembre 2023 e sullo stato di avanzamento dei progetti al 30 giugno 2024) e della piattaforma ReGiS consultata in data 30 gennaio 2025, si possono formulare le seguenti conclusioni:

I. il Comune di Bergamo risulta **soggetto attuatore** di n. **53** progetti identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP), inclusi 8 CUP dei quali l'Ente si dichiara soggetto beneficiario ma non attuatore;

II. le **fonti del finanziamento** sono costituite da fondi PNRR accertati a gennaio 2025, pari a 263.871.529,12 euro, in aumento di 50.024.205,59 euro rispetto al dato accertato nel 2023 (213.388.517,31 euro), dovuto all'aumento a 100 milioni di euro, del finanziamento PNRR per il CUP H21D18000120001 "linea tramviaria T2 della Valle Brembana". Oltre ai fondi PNRR vi sono fondi FOI pari a 37.376.635,62 euro, fondi PNC pari a 12.346,40 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica e propri, per un ammontare complessivo di 410.615.523,41 euro;

III. **l'avanzamento procedurale**: la Tabella dei Revisori al 30 giugno 2024 evidenzia n. 11 progetti nella fase iniziale, n. 22 sono in corso di realizzazione, n. 12 in attesa del collaudo/certificazione di conformità ed 1 risulta concluso. Per n. 7 progetti non sono riportate informazioni mentre 1 risulta concluso;

IV. **l'avanzamento procedurale** su ReGiS aggiornato al 30 gennaio 2025 riporta n. 42 progetti in corso di esecuzione e n. 11 conclusi, mentre nell'adunanza pubblica del **12 marzo 2025** l'Ente ha dichiarato di aver ultimato n. 21 interventi;

V. il **cronoprogramma**. Sul punto la Tabella dei Revisori allegata al questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 non contiene informazioni mentre la memoria illustrativa del 10 marzo 2025 segnala un avanzamento procedurale in linea e comunque coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee. Viene riportata una sola eccezione (CUP H11B21002620002) il cui termine previsto di esecuzione (24.4.2026)

oltrepassa, seppur in misura ridotta, la prescritta milestone del 31.3.2026 a causa di un grave evento meteorologico;

VI. **l'avanzamento finanziario** dai dati ReGiS al 30 gennaio 2025 evidenzia che, su fondi totali di 410.615.523,41 euro, la media è di un impegno nel bilancio del 73 per cento seguito dalla media dei pagamenti del 33 per cento. Nel dettaglio, per la Missione 1 sono previsti impegni in bilancio per 413.639,00 euro pari al 22 per cento del totale dei finanziamenti assegnati con il pagamento del 100 per cento sul totale impegnato; per la Missione 2 risultano impegnati in bilancio 238.130.091,28 euro, il 74 per cento del totale dei finanziamenti seguiti da pagamenti per 76.215.978,36 (32 per cento delle somme impegnate); per la Missione 4 sono impegnati 9.798.189,40 l' 86 per cento del totale dei finanziamenti, seguiti da pagamenti per 5.320.328,94 (54 per cento somme impegnate); per la Missione 5 sono impegnati in bilancio 50.936.209,33 euro , il 65 per cento sul totale dei finanziamenti, seguiti da pagamenti per 17.888.159,00 euro (35 per cento somme impegnate). Il CUP della M1, finanziato dal PNC di 12.346,40 euro, è stato integralmente impegnato e pagato;

VII. le **anticipazioni:** per le missioni 2, 4 e 5 sono state concesse anticipazioni pari a 6.692.514,93 euro, pari al 9 per cento del finanziamento del PNRR (73.153.227,91). Nessuna anticipazione è stata corrisposta per la Missione 1. La percentuale complessiva delle anticipazioni – 9 per cento - è stata calcolata tenendo conto dei finanziamenti per tutti i 53 CUP elencati dai Revisori. Risultano, alla data del 31 dicembre 2023, pagamenti pari a 12.450.770,25 euro, superiori alle anticipazioni erogate, per far fronte ai quali l'Ente ha attinto alla cassa disponibile;

VIII. nel Comune di Bergamo sono stati totalmente definanziati **7 CUP,** tutti ricompresi nella M2 "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*" per l'ammontare complessivo di 5.150.000,00 euro. I progetti sono stati tutti rifinanziati con risorse a carico del bilancio dello Stato;

IX. sono stati **rendicontati** n. 21 progetti. Il riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024 evidenzia che, fatta eccezione per gli interventi della Missione 1 per i quali i pagamenti sono avvenuti in tempi brevi, per tutti

gli altri progetti l'erogazione degli importi presenta criticità: il tempo di "ritardo" è stimato tra 154 giorni e 565 giorni (al 16 dicembre 2024) e per gran parte di tali progetti, oggetto di rendicontazione e integrazioni istruttorie, non risultano pagamenti al di fuori delle anticipazioni;

X. sono state evidenziate **criticità**. Per diversi interventi è stata chiesta o prevista una rimodulazione: per n. 3 progetti avviati nel 2024 è prevista una modesta variazione dell'importo, un progetto è stato ridimensionato per rientrare nell' importo originariamente previsto e per n. 21 progetti viene segnalata la necessità cofinanziamento del Comune per risolvere problematiche tecniche sopravvenute in fase di progettazione ed esecuzione. Per un CUP è stato previsto un incremento dei costi per rispettare i criteri DNSH;

XI. l'Ente ha dichiarato di attenersi alle **norme contabili** per il FPV, la registrazione dei capitoli e la tracciabilità dei finanziamenti;

XII. l'Ente riferisce di non aver apportato modifiche alla **governance** né al sistema dei controlli interni e mantiene aggiornato il sito nella sezione "amministrazione trasparente" dedicato al PNRR. La Sezione rileva come la struttura di *governance* predisposta dal Comune abbia assicurato un avanzamento procedurale in linea e comunque coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Bergamo

N.	CUP	MISSIONE	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)C	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
1	H11C22000400006	M1	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N.21 SERVIZI DA MIGRARE	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
2	H11F22002210006	M1	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	Concluso
3	H11F22002220006	M1	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	Concluso
4	H11F22003380006	M1	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADANOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	Concluso
5	H11F22004180006	M1	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA PIAZZA G. MATTEOTTI 3*ENTRAMBI	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
6	H51F22011170006	M1	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	In avvio	Dato Mancante	Concluso
7	H11F23001130001	M1-PNC	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI	Concluso	Dato Mancante	Concluso
8	C19J21048760001	M2	AUTOBUS URBANO ELETTRICO E RELATIVA INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DEL ALIMENTAZIONE	N.D.	Dato Mancante	In Corso
9	C19J21048770001	M2	AUTOBUS URBANO ELETTRICO E RELATIVA INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DEL ALIMENTAZIONE	N.D.	Dato Mancante	In Corso
10	H10J20000000008	M2	PIANO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - EROGAZIONE CONTRIBUTI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI AUTOBUS - ANNI 2019-2023	N.D.	Dato Mancante	Concluso
11	H11B21006730001	M2	E-BRT BERGAMO-DALMINE	N.D.	Dato Mancante	In Corso
12	H11B22000640006	M2	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SCURI IN VIA DEI GALLIARI	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
13	H11B22001930006	M2	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO PER RAFFORZAMENTO MOBILITÀ - ANNO 2022*VIA VARIE*REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO PER RAFFORZAMENTO MOBILITÀ - ANNO 2022	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
14	H11E22000330001	M2	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE AUTOMATICHE CON DISPOSITIVO PER DISABILE RD RAEE	In avvio	Dato Mancante	In Corso
15	H11E22000340001	M2	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI CESTINI CON MECCANISMO COMPATTANTE DEL RIFIUTO E SENSORI DI RIEMPIMENTO	In avvio	Dato Mancante	In Corso
16	H11E22000350001	M2	FORNITURA E POSA DI ECOISOLE INTERRATE E INFORMATIZZATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO	In avvio	Dato Mancante	In Corso
17	H12F22001230001	M2	NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI	Conferenza dei servizi decisoria	Dato Mancante	In Corso

N.	CUP	MISSIONE	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)C	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
18	H12F22001240001	M2	NUOVO CENTRO DEL RIUSO	Conferenza dei servizi decisoria	Dato Mancante	In Corso
19	H19J22001050008	M2	ACQUISTO DI AUTOBUS CLASSE I, ELETTRICI, ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA NELL'AREA URBANA DI BERGAMO E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA DI RICARICA	N.D.	Dato Mancante	In Corso
20	H21D18000120001	M2	LINEA TRAMVIARIA T2 DELLA VALLE BREMBANA	N.D.	Dato Mancante	**In Corso**
21	J19J22001980008	M2	ACQUISTO DI N° 2 AUTOBUS ELETTRICI, COMPRENSIVI DI RELATIVA INFRASTRUTTURA DI RICARICA	N.D.	Dato Mancante	In Corso
22	H11B22001630006	M4	ASILO NIDO "I CORIANDOLI"*VIA MOZART 2*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO "I CORIANDOLI" IN VIA MOZART	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
23	H11B22001640006	M4	ASILO NIDO VILLAGGIO DEGLI SPOSI*VIA DON BEPO VAVASSORI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO "VILLAGGIO DEGLI SPOSI" IN VIA DON BEPO VAVASSORI	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
24	H15E22000180006	M4	ASILO NIDO "L'ERBA VOGLIO" DI LONGUELO*VIA TOSCANINI 6*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO "L'ERBA VOGLIO" DI LONGUELO	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
25	H15E22000190006	M4	ASILO NIDO "BRUCO VERDE" DI VALTESSE*VIA BIAVA 24/A*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO "BRUCO VERDE" DI VALTESSE	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
26	H15E22000200006	M4	ASILO NIDO "IL CILIEGIO" DI BOCCALEONE*VIA ISABELLO 6*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO "IL CILIEGIO" DI BOCCALEONE	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
27	H15E22000300001	M4	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CORRIDONI IN VIA FLORES E SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS IN VIA DELLE TOFANE BERGAMO	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
28	H11B21002590004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LUOGO DI UNA SCUOLA PREESISTENTE, CON UN ATTENZIONE PARTICOLARE AD OFFRIRE SERVIZI DIVERSIFICATI ALLE DIVERSE ETNIE DI STUDENTI CHE ATTUALMENTE LO FREQUENTANO*VIA CALVI*REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MAZZI-CALVI IN VIA CALVI - LOTTO 1	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
29	H11B21002610004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO CHE FAVORISCA L'INTERAZIONE E LA COESIONE SOCIALE IN UN QUARTIERE PERIFERICO, RIDUCENDO MARGINALITÀ E DEGRADO (COLOGNOLA)*VIA S. SISTO*REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA NEL QUARTIERE COLOGNOLA TRA LA SS42 E VIA SAN SISTO	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	Concluso
30	H11B21002620002	M5	RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTO MIRATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREESISTENTE CON IL FINE DI RENDERE LO SPAZIO UN PUNTO DI GRANDE RILEVANZA CULTURALE*PIAZZA E. TIRABOSCHI*REALIZZAZIONE GALLERIA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA GAMEC PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso

N.	CUP	MISSIONE	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)C	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
31	H13D21000190005	M5	EX CARCERE DI SANT'AGATA*VICOLO SANT'AGATA*PROGETTO PINQUA - RESTAURO E RICONVERSIONE DEL COMPENDIO DELL'EX CARCERE DI SANT'AGATA	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
32	H13D21000200005	M5	RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI SAP IN PIAZZALE VISCONTI - UN PROGETTO DIRESILIENZA E RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATO DAL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
33	H13D21000650004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO IN STATO DI ABBANDONO E DEGRADO CON RICONOSCIBILI CONNOTAZIONI, DA DESTINARE A SPAZI A SERVIZIO PISTA CICLABILE (SANTA CATERINA/REDONA)*VIA BIANZANA*RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX CASELLO FERROVIARIO IN VIA BIANZANA PER SPAZI A SERVIZIO PISTA CICLABILE	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	In Corso
34	H13D21000660004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO IN STATO DI ABBANDONO E DEGRADO CON RICONOSCIBILI CONNOTAZIONI, DA DESTINARE A FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO (REDONA)*VIA NEGRISOLI*RIQUALIFICAZIONE SPAZI EX CASELLO FERROVIARIO IN VIA NEGRISOLI	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	In Corso
35	H13D21000670004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UN LUOGO CHE FAVORISCA LA COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ SPORTIVA OUTDOOR, IN UN QUARTIERE PERIFERICO (CONCA FIORITA)*VIA BAIONI*RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BAIONI / CAMPO UTILI - LOTTO 1	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
36	H14E21000520004	M5	RISTRUTTURAZIONE CENTRO CIVICO DEL QUARTIERE MALPENSATA DI VIA FURIETTI	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	In Corso
37	H14H22000210006	M5	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMOPIAZZA MATTEOTTI, 27BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
38	H14H22000220006	M5	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMOPIAZZA MATTEOTTI, 27BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	In avvio	Dato Mancante	In Corso
39	H14H22000230006	M5	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMOPIAZZA MATTEOTTI, 27BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA DOMICIARITÀ	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
40	H14H22000240006	M5	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMOPIAZZA MATTEOTTI, 27BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL BURN OUT	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
41	H14H22000250006	M5	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMOPIAZZA MATTEOTTI, 27BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso

N.	CUP	MISSIONE	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)C	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
42	H14H22000260006	M5	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMOPIAZZA MATTEOTTI, 27BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*HOUSING FIRST	In avvio	Dato Mancante	In Corso
43	H14H22000270006	M5	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMOPIAZZA MATTEOTTI, 27BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*STAZIONI DI POSTA	In avvio	Dato Mancante	In Corso
44	H14H23000220006	M5	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - INTEGRAZIONE	In avvio	Dato Mancante	In Corso
45	H15F21000370004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTO MIRATO ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREESISTENTE CON IL FINE DI RENDERE LO SPAZIO UN PUNTO DI GRANDE RILEVANZA CULTURALE*PIAZZA VECCHIA*RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DI CASA SUARDI DA DESTINARE AD ARCHIVIO STORICO	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	Concluso
46	H16G20000210004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA D'ARTE, QUALI LUOGO DI ACCOGLIENZA E SOCIALITÀ IN SENSO AMPIO*VIA PIGNOLO*RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA D'ARTE E GAMEC	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	Concluso
47	H17H21001440004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UN LUOGO CHE FAVORISCA LA COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ SPORTIVA OUTDOOR, IN UN QUARTIERE PERIFERICO (LORETO)*VIA MEUCCI*IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MEUCCI: RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA	Esecuzione	Dato Mancante	Concluso
48	H17H21001460004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UN LUOGO CHE FAVORISCA LA COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ SPORTIVA OUTDOOR, IN UN QUARTIERE PERIFERICO (CELADINA)*VIA PIZZO SCAIS*RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA IN VIA PIZZO SCAIS	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	In Corso
49	H17H21001470004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UN LUOGO CHE FAVORISCA LA COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ SPORTIVA OUTDOOR, IN UN QUARTIERE PERIFERICO (CELADINA)*VIA ACQUADERNI*RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA IN VIA ACQUADERNI	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	In Corso
50	H18B19000000004	M5	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA NEL QUARTIERE S.TOMASO DE CALVI IN VIA W. TOBAGI	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso
51	H19E20000010004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO STORICO, CON LO SVILUPPO DI NUOVE FUNZIONI CAPACI DI SUPERARE LE DIFFERENTI COMPETENZE SETTORIALI, IN UNA LOGICA INCLUSIVA E SOSTENIBILE (CENTRO)*VIA TASSO*RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DONADONI IN VIA TASSO	Aggiudicazione	Dato Mancante	In Corso
52	H19J21001160004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO CENTRALE CAPACE DI ATTRARRE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE LA COESIONE E A CONTRASTARE IL DEGRADO SOCIALE*PIAZZA MATTEOTTI*INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Dato Mancante	Concluso

N.	CUP	MISSIONE	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)C	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
			PIACENTINIANO ' LOTTO 3 ' 'SENTIERONE LATO OVEST E PIAZZA MATTEOTTI'			
53	H19J21002270004	M5	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO CAPACE DI ATTRARRE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE LA COESIONE E A CONTRASTARE IL DEGRADO SOCIALE*VIA BORGO PALAZZO*SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO TRATTO IN VIA BORGO PALAZZO TRA VIALE PIROVANO E VIA GRITTI	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base della tabella PNRR e di ReGiS al 30.01.2025

