CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

ATTUAZIONE DEL PNRR

COMUNE DI CREMONA

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE n. 70 /2025/GEST



PRESIDENTE: SUSANNA LOI

RELATORE: MAURA CARTA

I funzionari:
GIULIA MILANI

GIUSEPPE PRO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 12 marzo 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la deliberazione SRCLOM/45/2024/INPR con la quale sono stati definiti gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la nota del 16 dicembre 2024, Prot. Cdc n. 23.646, con la quale il Comune di Cremona ha trasmesso i dati sullo stato di attuazione del PNRR in riscontro alla nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 19 novembre 2024;

VISTA l' ordinanza n. 58 del 27 febbraio 2025 con la quale il Presidente ha fissato l'adunanza pubblica;

VISTA la memoria e i documenti depositati dall'Ente in data 10 marzo 2025, prot Cdc n. 3188;

SENTITI per il Comune di Cremona la Dott.ssa Gabriella Di Girolamo Segretario Generale, l'Arch. Giovanni Donadio Direttore Settore Programmazione, l'Ing. Emanuele Stoppa Direttore Settore Mobilità Sostenibile e la Dott.ssa Eugenia Grossi Direttore del Settore Politiche Sociali.

UDITO il relatore, Maura Carta

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di Cremona, controllo sulla gestione ex art.*7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77*".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Cremona, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il

2 aprile 2025
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

ATTUAZIONE DEL PNRR

COMUNE DI CREMONA

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 29 LUGLIO 2021 N. 108)

INDICE

1 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 8

1.1 Avanzamento procedurale 11
1.2 Avanzamento finanziario 13
1.3 Progetti definanziati 17

2 TEMPI DI RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTERI 19

3 CRITICITA' NELL'ATTUAZIONE 20

3.1 Aumento dei prezzi 22

4 APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI 24

5 SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL COMUNE 25

6 VALUTAZIONI CONCLUSIVE 26

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia 9
Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC 9
Tabella 3- Avanzamento procedurale al 30 giugno 2024 11
Tabella 4 - Avanzamento procedurale al 30 gennaio 2025 12
Tabella 5 – Avanzamento cronoprogramma 13
Tabella 6 – Risorse impegni in bilancio e pagamenti 14
Tabella 7 – Anticipazioni PNRR 16
Tabella 8 – Elenco dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Cremona 29

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 – Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC 10
Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase) 12
Grafico 3 – Avanzamento finanziario 15

1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La presente relazione, in continuità con le deliberazioni della Sezione n. 253/2022/GEST e n. 24/2024/GEST, espone l'esito del monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (di seguito PNC) di pertinenza del Comune di Cremona, nell'ambito del controllo di gestione previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

La verifica dello stato di avanzamento degli interventi di cui il Comune è soggetto attuatore è stata compiuta avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria, dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS[1] e dalle informazioni rese dall'Organo di Revisione nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026.

Quest'ultima fonte informativa è frutto dell'adempimento[2] richiesto ai Revisori dei conti dell'Ente locale dalla Sezione delle Autonomie attraverso una griglia di rilevazione somministrata agli enti che contiene informazioni aggiornate al 30 giugno 2024 per quanto riguarda l'avanzamento procedurale e fisico, e al 31 dicembre 2023 per l'avanzamento finanziario. Sono stati presi in considerazione anche i progetti interamente o parzialmente finanziati con risorse PNC.

[1] Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che "*I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza*." Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

[2] La Sezione delle Autonomie in allegato alle Linee Guida sul bilancio di previsione 2024-2026 (Deliberazione n. 6/SEZAUT/2024/INPR) ha richiesto ai Revisori dei conti degli enti locali di compilare una tabella precompilata con i dati relativi ai progetti attivati, fornendo informazioni circa lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei singoli CUP. I Revisori hanno dovuto trasmettere la "Tabella PNRR" non oltre il termine del 30 settembre 2024. E' bene chiarire che mentre lo stato di avanzamento procedurale si riferisce al 30 settembre 2024, lo stato dell'avanzamento finanziario è quello accertato dai dati di bilancio al 31.12.2023. Per rappresentare lo stato degli impegni e dei pagamenti si è attinto alle informazioni aggiornate alla data del 30 gennaio 2025 dalla piattaforma ReGiS.

Il 18 novembre 2024 la Sezione ha chiesto un aggiornamento sullo stato di attuazione dei progetti, cui ha fatto seguito una dettagliata risposta da parte del Comune, trasmessa in data **16 dicembre 2024**.

In data **30 gennaio 2025** è stata effettuata una verifica su ReGiS, per acquisire ulteriori elementi informativi e in prossimità dell'adunanza pubblica, il **10 marzo 2025**[3], l'Ente ha trasmesso una documentata nota integrativa.

Gli interventi dei quali il Comune di Cremona risulta soggetto attuatore sono rappresentati nella Tabella 1, aggregati per Missione.

Nel precedente monitoraggio, oggetto della deliberazione della Sezione, n. **24/2024/GEST**, risultavano attivi **53** CUP.

Nel corso del 2024 si sono registrate variazioni in quanto:

- n. **14** CUP presenti nel monitoraggio precedente, sono stati **definanziati**;
- n. **1** CUP è stato **aggiunto** e fa riferimento al PNC non presente nel precedente monitoraggio;
- n. **1** CUP risulta **escluso** in quanto finanziato con i contributi per investimenti opere pubbliche ex art. 1 comma 29 legge n. 160/2019.

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia

MISSIONE	n. CUP	Lump Sum
M1 - Digitalizzazione della PA	7	7
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	3	-
M4 -Istruzione e ricerca	3	-
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	25	-
Piano Nazionale Complementare	1	-
Totale	**39**	**7**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dei dati estratti da ReGiS al 30 gennaio 2025.

Il Comune di Cremona risulta soggetto attuatore di **39 progetti** identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP): tra questi, 7 sono della tipologia *Lump-Sum*[4] e si trovano nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA).

[3] prot. C.d.c. n. 3188

[4] Si tratta di misure che assegnano contributi forfettari, diversamente dagli altri interventi del PNRR. Per tali misure non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a seguito della quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Inoltre, per questi

Vi sono, inoltre, n. 3 CUP nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), altrettanti nella Missione 4 (Istruzione e ricerca) e n. 25 CUP si trovano nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità).

Infine, 1 CUP è finanziato dal Piano Nazionale Complementare.

Nella tabella che segue si rappresentano le fonti del finanziamento per le diverse Missioni.

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC

MISSIONE	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	% Fonti /Tot
Fondi PNRR	1.078.309,00 €	13.207.575,33 €	5.133.113,80 €	30.221.996,00 €	- €	**49.640.994,13 €**	78,79%
Fondi PNC	- €	- €	- €	- €	8.979,20 €	**8.979,20 €**	0,01%
Fondi FOI	- €	- €	1.246.581,30 €	4.286.708,08 €	- €	**5.533.289,38 €**	8,78%
Altra Fonte Pubblica	- €	- €	- €	255.000,00 €	- €	**255.000,00 €**	0,40%
Finanziamento Comune	- €	140.575,31 €	2.426.979,64 €	2.429.825,72 €	- €	**4.997.380,67 €**	7,93%
Finanziamento Privato	- €	2.571.551,67 €	- €	- €	- €	**2.571.551,67 €**	4,08%
Finanziamento Totale	**1.078.309,00 €**	**15.919.702,31 €**	**8.806.674,74 €**	**37.193.529,80 €**	**8.979,20 €**	**63.007.195,05 €**	100%
% M /Tot.	1,71%	25,27%	13,98%	59,03%	0,01%	100,00%	


Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati in ReGiS al 30 gennaio 2025

Come si ricava dal prospetto, ca. il 60 per cento dei finanziamenti PNRR è concentrato nella Missione 5, il 25 per cento nella Missione 2, mentre il resto è suddiviso tra le Missioni 1 e 4 .

Il Comune di Cremona risulta soggetto attuatore di fondi **PNRR** pari a **49.640.994,13 euro**, di fondi FOI pari a 5.533.289,38 euro, di fondi PNC pari a 8.979,20 euro, oltre a finanziamenti pubblici, privati e propri, per un ammontare complessivo di **63.007.195,05 euro.**

progetti non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un'unica soluzione a obiettivo raggiunto e verificato.

Grafico 1 – Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC

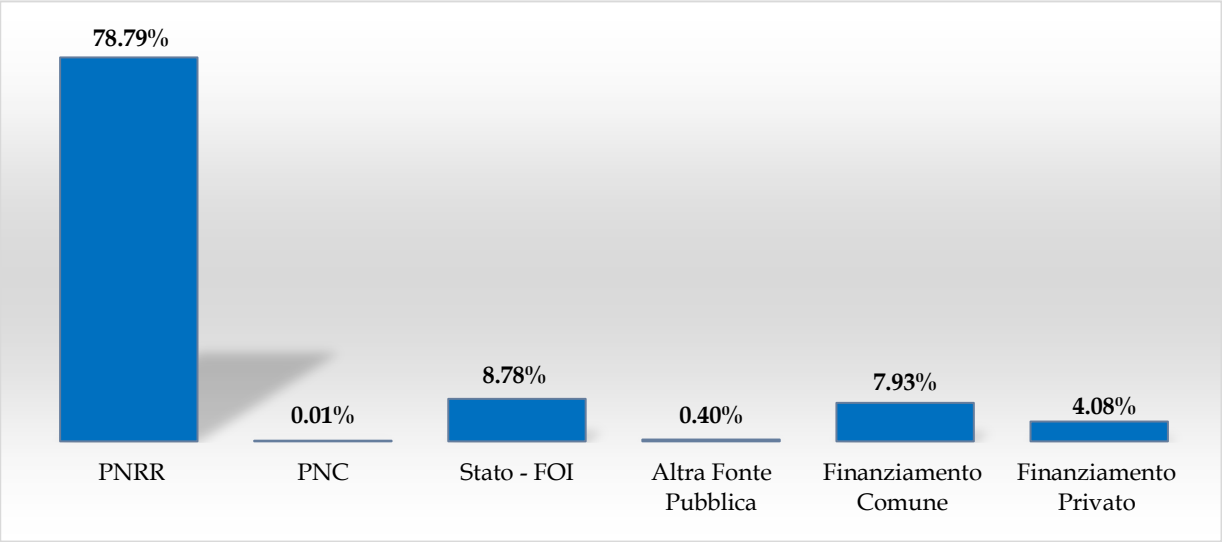

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 30 gennaio 2025

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 78,79 per cento del totale, mentre le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC), sono pari allo 0,01 per cento del totale. Il resto delle risorse proviene da fondi propri dell'Ente e dalle assegnazioni del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI)[5] e da risorse private, che insieme contribuiscono con il 20,79%per cento dei fondi complessivi oltre allo 0,40%per cento di altri finanziamenti pubblici.

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla tabella in calce alla relazione.

*

[5] Per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il c.d. DL Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta. Nello specifico, l'articolo 26, comma 7, del predetto DL n. 50/2022 ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, finalizzato a consentire l'avvio entro il 31/12/2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. Allo stanziamento iniziale di complessivi 7.500 milioni di euro, sono stati aggiunti ulteriori 1.300 milioni, previsti dall'articolo 34 del DL n. 115/2022, per complessivi 8,8 miliardi di euro dal 2022 al 2027. (*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/*).

1.1 Avanzamento procedurale

L'avanzamento procedurale di ogni singolo progetto è stato eseguito sulla base di quanto dichiarato dai Revisori nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026.


Tabella 3- Avanzamento procedurale al 30 giugno 2024

MISSIONE	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale	% sul totale
In avvio	-	-	-	4	-	4	10,26%
Aggiudicazione	-	-	-	4	-	4	10,26%
Stipula contratto	3	3	3	14	-	23	58,97%
Esecuzione lavori /fornitura	-	-	-	3	-	3	7,69%
Conclusi	4		-	-		4	10,26%
N.D.	-	-	-	-	1	1	2,56%
Totale complessivo	**7**	**3**	**3**	**25**	**1**	**39**	**100,00%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base della tabella PNRR

Il grafico seguente fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale.

Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase)

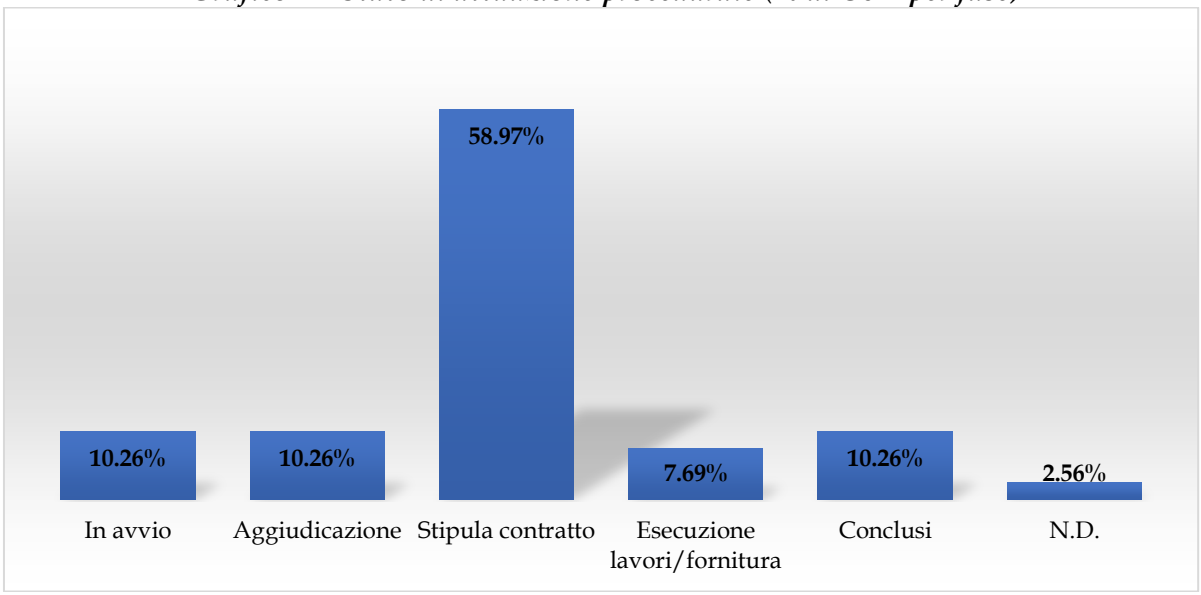

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base i della tabella PNRR al 30 giugno 2024

La più recente verifica su ReGiS offre il quadro aggiornato: tale banca dati non distingue tra le diverse fasi e individua i progetti *in corso di esecuzione* e conclusi.

Tabella 4 - Avanzamento procedurale al 30 gennaio 2025

MISSIONE	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	% sul totale
In Corso	4	3	3	22	-	32	82,05%

MISSIONE	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	% sul totale
Concluso	3	-	-	3	1	7	17,95%
Totale complessivo	**7**	**3**	**3**	**25**	**1**	**39**	**100,00%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati in ReGiS al 30 gennaio 2025

Al 30 gennaio 2025 risultano n. 32 progetti in corso di esecuzione e n. 7 conclusi.

Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un **cronoprogramma** predefinito dal PNRR a livello nazionale, per consentire l'accertamento dei traguardi qualitativi e quantitativi (milestone e target) e favorire la tempestiva individuazione di eventuali ritardi (art. 8, co.5 D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021). Questo implica che i diversi progetti si devono sviluppare e devono essere ultimati secondo una precisa sequenza temporale.

Con riguardo al cronoprogramma la Sezione ha fatto riferimento alle informazioni dei Revisori nella Tabella PNRR allegata al Questionario del bilancio di previsione 2024-2026.

Tabella 5 – Avanzamento cronoprogramma

Missione	N.D.	Dato Mancante	CUP NON in linea con il cronoprogramma	CUP In linea con il cronoprogramma	Totale CUP	% dei CUP in linea con il cronoprogramma
M1	-	2	-	5	7	71,43%
M2	-	-	-	3	3	100,00%
M4	-	-	-	3	3	100,00%
M5	-	1	3	21	25	84,00%
PNC	1	-	-	-	1	0,00%
Totale complessivo	**1**	**3**	**3**	**32**	**39**	**82,05%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base della Tabella PNRR al 30 giugno 2024.

Dalla Tabella si ricava che 32 CUP su 39 rispettano puntualmente il cronoprogramma, mentre l'informazione non è stata resa per 3 progetti.

Il dato relativo al progetto finanziato da PNC non risulta disponibile ("N.D."), in quanto non incluso nella Tabella PNRR.

*

1.2 Avanzamento finanziario

L'art.15 del d.l. 77/2021 ha accelerato l'avvio degli interventi PNRR ammessi al finanziamento, stabilendo che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie loro attribuite su specifici capitoli di spesa sin dalla data del decreto o atto di riparto, ovvero, ancora prima che le risorse risultino impegnate dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento.

Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l'accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa.

Lo stato di avanzamento finanziario di cui si riferisce nella presente relazione riguarda le risorse impegnate in bilancio e lo stato dei pagamenti rilevati dai dati ReGiS al 30 gennaio 2025.

Le informazioni vengono riassunte in forma aggregata per Missione nella seguente tabella.

Tabella 6 – Risorse impegni in bilancio e pagamenti

Missione	CUP	Totale dei finanziamenti (€)	Impegni* (€)	% impegni su totale dei finanziamenti	Pagamenti* (€)	% pagamenti su totale degli impegni
M1	7	1.078.309,00 €	493.090,00 €	45,73%	493.090,00 €	100,00%
M2	3	15.919.702,31 €	6.204.213,96 €	38,97%	1.404.761,05 €	22,64%
M4	3	8.806.674,74 €	7.301.773,69 €	82,91%	3.724.328,10 €	51,01%
M5	25	37.193.529,80 €	29.749.319,69 €	79,99%	10.610.145,42 €	35,67%
PNC	1	8.979,20 €	8.979,20 €	100,00%	8.979,20 €	100,00%
Totale complessivo	**39**	**63.007.195,05 €**	**43.757.376,54 €**	**69,45%**	**16.241.303,77 €**	**37,12%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 30.1.2025.

La tabella mostra il finanziamento totale, ovvero le risorse a disposizione del Comune di Cremona per attuare i progetti del PNRR e PNC: le risorse complessive sono costituite, come già esplicitato, dalla somma dei fondi RRF e PNC, da altri finanziamenti pubblici, come ad esempio i vari stanziamenti del FOI, e dai fondi tratti dal bilancio dell'Ente.


La predetta tabella illustra, inoltre, la percentuale e l'importo dei pagamenti effettuati dal Comune in relazione agli impegni assunti nel bilancio: per la Missione 1 si registra

un livello di impegno pari a circa il 46 per cento del totale dei fondi, cui fa seguito il pagamento integrale. Per il progetto finanziato da PNC le somme sono integralmente impegnate e pagate. Per le Missioni 2, 4 e 5, a elevati livelli di impegno corrispondono pagamenti in percentuali contenute.

Il dato si spiega avendo riguardo alla natura delle opere realizzate per tali linee di finanziamento le quali, diversamente da quelle della Missione 1 e del PNC, richiedono tempi di progettazione e di attuazione più significativi e regole vincolanti sui pagamenti in relazione agli stati di avanzamento delle opere ovvero a seconda della misura di adempimento delle prestazioni per gli appalti di servizi e di forniture.

Si fornisce in forma grafica il dato aggiornato, specificando le percentuali di impegni sul totale del finanziamento del progetto e di pagamenti per le diverse Missioni.

Grafico 3 – Avanzamento finanziario

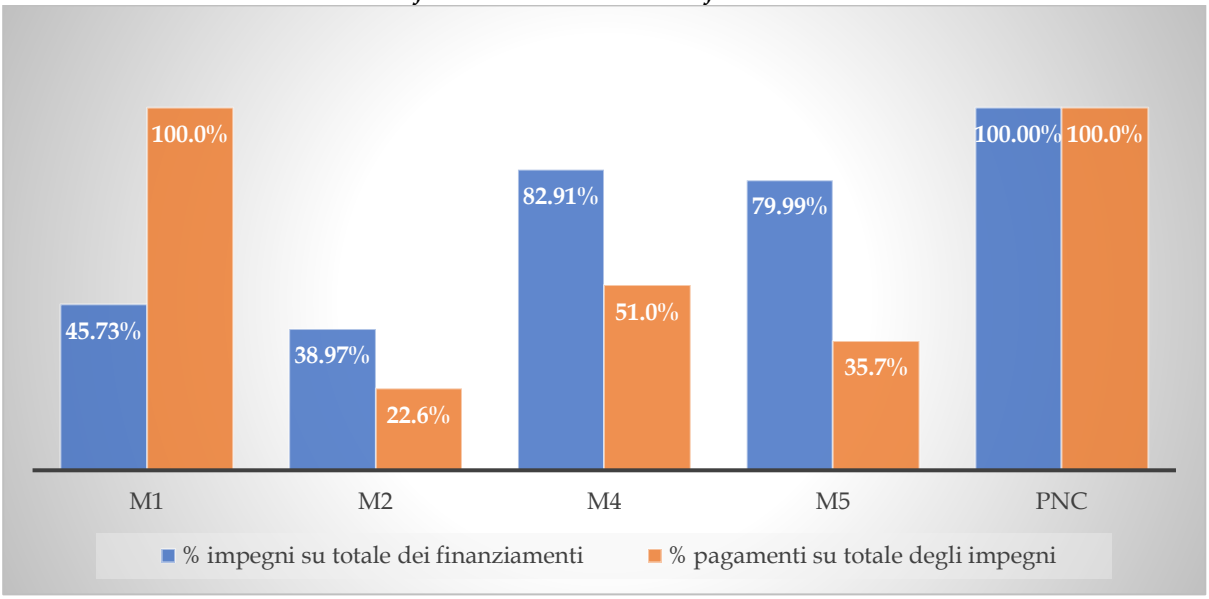

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 30 gennaio 2025.

Per quanto concerne le **anticipazioni**, si rammenta che il PNRR ha previsto che l'avvio dei progetti precede il finanziamento ma, per gli enti privi di capienza finanziaria, l'art. 9, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 152 del 2021 "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*", aveva previsto la possibilità di

disporre di anticipi di liquidità, nella misura del **10 per cento** delle risorse complessive assegnate, su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale[6].

Successivamente sono intervenute modifiche del quadro normativo finalizzate a velocizzare i flussi finanziari del PNRR e, da ultimo, l'art. 18-quinquies "disposizioni finanziarie in materia di PNRR" del d.l. n. 113/2024 (conv. con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) ha previsto che "*le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo* ***del 90 per cento*** *del costo dell'intervento a carico del PNRR…*".

Per l'attuazione di questa previsione è stato adottato il decreto MEF del 6 dicembre 2024 recante "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2025, i cui effetti potranno essere apprezzati nel successivo monitoraggio.

Di seguito si espone lo stato delle anticipazioni già erogate al Comune di Cremona, con talune precisazioni.

I dati riportati nella **tabella 7** si riferiscono a diverse soglie temporali: per l'anticipazione concessa dalle amministrazioni titolari e i successivi pagamenti i dati sono riferiti al **31 dicembre 2023**, sulla base di quanto riportato nella Tabella PNRR dei Revisori, mentre le informazioni sull'importo complessivo del finanziamento PNRR, sugli impegni iscritti a bilancio e sul fondo pluriennale vincolato di spesa sono aggiornate al **30 giugno 2024**.

Tabella 7 – Anticipazioni PNRR

MISSIONE	CUP	Finanziamento PNRR	Anticipazione PNRR	% anticipazione sul PNRR	Impegni a valere su risorse PNRR e/o PNC	FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	Pagamenti PNRR e/o PNC
M1	7	1.078.309,00 €	- €	-	431.924,00 €	- €	382.690,41 €
M2	3	13.207.575,33 €	1.843.766,10 €	14%	5.298.673,75 €	- €	1.246.017,20 €
M4	3	5.133.113,80 €	1.539.934,14 €	30%	1.441.420,00 €	369.072,28 €	1.166.440,34 €
M5	25	30.221.996,00 €	2.809.199,60 €	9%	1.319.633,59 €	1.885.571,96 €	564.171,06 €
Totale complessivo	**38**	**49.640.994,13 €**	**6.192.899,84 €**	**12%**	**8.491.651,34 €**	**2.254.644,24 €**	**3.359.319,01 €**

Fonte: elaborazione Corte dei Conti sulla base della Tabella PNRR del 30 giugno 2024

[6] La contabilizzazione di questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso decreto, "*per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR*".

Come si ricava dalla tabella, per le missioni 2 e 5 sono state concesse anticipazioni mediamente pari a ca. il 12 per cento del totale del PNRR.

La Missione 4 ha ricevuto anticipazioni pari al 30 per cento del totale del PNRR.

Nessuna anticipazione è stata corrisposta, invece, per la Missione 1, trattandosi di finanziamenti che, di regola, vengono tempestivamente erogati.

La percentuale complessiva è stata calcolata tenendo conto dei finanziamenti per tutti i 38 CUP elencati dai Revisori (con esclusione del PNC non presente nel monitoraggio).

Risultano, alla data del 31 dicembre 2023, pagamenti non superiori alle anticipazioni erogate.

*

1.3 Progetti definanziati

La versione iniziale del PNRR (approvata dal Consiglio della UE del 13 luglio 2021) è stata oggetto finora di quattro modifiche[7].

La più rilevante è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 ed è stata approvata dal Consiglio della UE l'8 dicembre 2023 con una rimodulazione e un incremento di 2,9 miliardi dei fondi UE a favore dell'Italia (attualmente pari a 194,4 miliardi) con l'inserimento della nuova Missione 7 (RePowerEU) ed altre modifiche alle misure originariamente previste. Queste ultime sono divenute necessarie per criticità di natura oggettiva dovute principalmente all'aumento dei costi, alla scarsità di materiali, ai limiti del sistema produttivo[8].

Dopo la revisione del PNRR, approvata con decisione del Consiglio dell'UE dell' 8 dicembre 2023, alcune misure sono state de-finanziate totalmente o parzialmente, ovvero sono state sostituite le fonti del finanziamento con fondi statali o di altra fonte europea.

[7] la prima modifica, nel luglio 2023 è stata approvata dal Consiglio UE del 19 settembre 2023, ha riguardato milestones e targets (M&T). La seconda è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 e approvata dal Consiglio della UE l'8 dicembre 2023. La terza modifica, richiesta dal Governo il 4 marzo 2024 è stata approvata dal Consiglio della UE il 14 maggio 2024 (correzione di 55 errori materiali). La quarta modifica è stata richiesta dal Governo il 10 ottobre 2024 e approvata dal Consiglio della UE il 12 novembre 2024

[8] La problematica è diffusamente esaminata nella nota di lavoro 2/2024 – la riforma del codice dei contratti e la rimodulazione delPNRR – Ufficio parlamentare del bilancio dicembre 2024

Il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, all'art. 1 ha riconosciuto l'esigenza di recuperare le necessarie risorse finanziarie per coprire il fabbisogno necessario per assicurare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano.

La predetta normativa ha *salvaguardato i progetti con obbligazioni giuridicamente vincolanti*, vale a dire quelli per i quali vi sia stata l'assunzione dell'impegno contabile ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 oppure nei casi di stipula del contratto.

La norma ha, inoltre, previsto che, dopo l'individuazione degli interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento, nell' ipotesi di mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano rese indisponibili le relative risorse.

Il quadro generale dei definanziamenti e rifinanziamenti è riportato in modo dettagliato nell'art. 1, comma 8 del DL 19/2024: è previsto lo stanziamento delle ingenti risorse nazionali necessarie per la copertura finanziaria dei progetti definanziati ovvero parzialmente fuoriusciti dal PNRR.

Il 29 ottobre 2024, su richiesta del Governo, la Commissione ha assentito alcune ulteriori proposte di modifica al PNRR italiano, rispetto alla revisione più ampia dell'8 dicembre 2023 e le stesse sono state approvate dal Consiglio europeo il 18 novembre 2024.

Sullo sfondo di tale normativa si riferisce sui progetti che i Revisori del Comune di Cremona hanno elencato come definanziati, totalmente o parzialmente.

Dall'istruttoria è emerso che nel Comune di Cremona sono stati totalmente definanziati **14 CUP** per un totale di **euro 1.977.709,90.**

Si tratta di interventi tutti ricompresi nella M2.

Dal riscontro istruttorio è emerso che tutti i progetti definanziati, sia quelli conclusi sia quelli in corso con obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono stati rifinanziati, trattandosi di interventi ricompresi tra le cd. *piccole opere* ai sensi della L. 160/2019.

2. TEMPI DI RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTERI

Come sopra rilevato, l'art. 1 del D.M. MEF del 6 dicembre 2024 ha previsto la possibilità di anticipazioni fino al 90% e disposto che "*A fronte delle erogazioni effettuate ai sensi del presente decreto, le amministrazioni titolari di misura provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati dei trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori*".

Gli esiti di questa previsione potranno essere apprezzati nel prossimo monitoraggio.

Allo stato la Sezione riferisce dei tempi di rimborso come illustrati nel dettagliato prospetto inviato dall'Ente il 16 dicembre 2024:

- per i progetti della Missione 1 della tipologia *Lump-Sum*, l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi e non per spese. L' Ente ha asseverato n. 3 progetti ed ha ottenuto la tempestiva liquidazione dei relativi importi;
- per i 2 progetti della Missione 2 non sono stati trasmessi rendiconti;
- per la Missione 4 sono stati rendicontati 3 progetti per i quali le amministrazioni titolari hanno chiesto integrazioni;
- per la Missione 5 sono stati rendicontati 19 progetti, in gran parte nel periodo aprile-luglio 2024. Per quasi tutti sono state chieste integrazioni ed è in corso il re-invio del rendiconto.

3. CRITICITA' NELL'ATTUAZIONE

Il Comune di Cremona nella risposta istruttoria del 16 dicembre 2024 ha elencato, in modo puntuale, diverse criticità incontrate:

- per diversi interventi sono state disposte sospensioni dei lavori a causa avverse condizioni meteo;
- per due cantieri si è manifestata la necessità di differire la stipula del contratto in quanto è stata data la priorità ad intervento PNRR sullo stesso sedime da parte di ente gestore di sottoservizi (Padania Acque Spa);
- per un cantiere è stato riscontrato un errato confinamento del lotto di cantiere con necessità di acquisire la richiesta di autorizzazione paesaggistica all'Ente Provincia per il versamento terreno di scavo;
- per un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica di rilevante importo -ca. 2.000.000,00 euro - è stata necessaria una modifica contrattuale e una variante che richiede una preliminare autorizzazione ministeriale, non ancora rilasciata pur essendo decorsi vari mesi;
- per un altro intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica di importo significativo -ca. 2.800.000,00- euro è stato riscontrato un forte rallentamento della produzione a causa della difficoltà di reperimento della forza lavoro nonché tempi di attesa per i controlli dei requisiti dei subappaltatori.

Invitato a maggiori chiarimenti sul punto, con la memoria del 10 marzo 2025, l'Ente ha fornito aggiornamenti riguardo ai CUP per i quali erano emerse difficoltà nella realizzazione degli interventi e per quelli bisognevoli di rimodulazione.

Per diverse criticità (ritardi nelle fasi esecutive, condizioni meteo avverse, difficoltà di effettivo avvio lavori da parte dell'impresa, difficoltà al reperimento forza lavoro, tempi di attesa per i controlli da parte di enti terzi, carenza di personale), con conferma anche in adunanza pubblica, è stato segnalato il superamento.

Nella nota del 16 dicembre 2024 il Comune aveva sottolineato le difficoltà "di sistema" quali :

- difficoltà utilizzo del Sistema ReGiS;
- significativi ritardi nel controllo e pagamento di rendiconti caricati;
- mancanza di uniformità ed omogeneità nelle attività di controllo delle rendicontazioni, incertezza rispetto alla documentazione da produrre ed eccessivo formalismo sulla stessa;
- richiesta di implementazione di due piattaforme (ReGiS e PNRR-Futura)) e richiesta del logo UE sulle disposizioni di liquidazione;
- difficoltà per tutti gli interventi di rigenerazione urbana, che hanno portato ad un aggravamento delle attività di monitoraggio (necessario generare le attestazioni di gara per ogni CIG, integrando i rendiconti con due nuovi allegati 3COI e 4DF). Anche in questo caso poi, come per tutti gli interventi PNRR, è stato necessario redigere le nuove checklist DNSH, aggiornate a maggio 2024;
- per tutti gli interventi PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare): difformità tra quanto richiesto dal Ministero e le previsioni del Manuale per la rendicontazione, che non prevede il caricamento di documenti e la compilazione di sezioni della piattaforma ReGiS che invece il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiede, bloccando i rendiconti presentati. Richiesta ai Subappaltatori di documenti che solo i partecipanti alle procedure di gara possono compilare; per quanto concerne i subappalti, spesso vengono caricati in automatico da sistema esterno creando dei duplicati con quelli già caricati manualmente e non di rado presentano carenze (non è presente la data e/o l'oggetto del subappalto) che non si riesce ad eliminare;
- richieste di integrazione sullo stesso rendiconto pervenute a distanza di tempo (a volte una settimana).

Gran parte di queste difficoltà sono state superate anche grazie all' impegno della struttura comunale dedicata al PNRR.

3.1.Aumento dei prezzi

Il contesto geopolitico ed economico internazionale ha, da tempo, intensificato tensioni nei prezzi dei beni energetici e determinato spinte inflazionistiche i cui effetti si sono riverberati significativamente sulla dinamica delle spese nei diversi settori produttivi.

Poco tempo dopo l'approvazione del PNRR, nella consapevolezza del costante incremento dei prezzi, il Governo ha introdotto il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - FOI, con il DL 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022.

Successivamente, per fronteggiare l'aumento dei costi e favorire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, nel secondo semestre 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto 11 luglio 2023 per l'assegnazione di ulteriori risorse al fine di consentire l'affidamento dei lavori con prezzi adeguati ai rincari.

Il primo monitoraggio sull'aumento dei prezzi per i progetti finanziati dal PNRR è stato effettuato dalla Banca d' Italia nella relazione del maggio 2023 evidenziando che "*In relazione all'aumento dei prezzi di materie prime e materiali da costruzione, si stima che alla fine del 2022 il costo dei progetti inclusi nel Piano era cresciuto in media di circa il 10 per cento rispetto a quanto inizialmente preventivato*." [9].

Dati e documenti più dettagliati sono stati elaborati dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, che nella Relazione del novembre 2023 ha affermato che "*...Guardando il dato aggregato, ponderato in base al peso della spesa associata agli interventi, si può stimare che con l'attuale livello dei prezzi l'aumento di prezzo ponderato per la produzione dei beni e servizi nell'ambito del PNRR sia nell'ordine del 10,7 per cento...*"[10].

La successiva Relazione sul PNRR al Parlamento del maggio 2024 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti sottolinea come "*...In circa un terzo dei casi, le scelte di rifinanziamento riguardano iniziative di investimento per le quali le modifiche hanno trovato giustificazione nell'aumento dei costi stimati a causa dell'inflazione; in altrettante ipotesi le*

[9] Lo stato di attuazione del PNRR in Banca d'Italia, Relazione annuale sul 2022

[10] Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo – novembre 2023 - Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - cfr. n. 34/ SSRRCO/REF/2023

*ragioni alla base dei rifinanziamenti sono riscontrabili nell'esigenza di attuare alternative migliori per conseguire il medesimo livello di ambizione originariamente fissato ovvero in cambiamenti nella domanda di m*ercato…" (cfr. n. 41/ SSRRCO/REF/2024).

Sullo sfondo di queste problematiche si espongono gli aumenti dei costi segnalati dal Comune di Cremona.

Per 18 dei 20 progetti oggetto di "rimodulazione", vale a dire progetti in corso e finanziati che hanno presentato difficoltà e scostamenti significativi rispetto alle previsioni originarie, sono state segnalate problematiche di incremento dei prezzi per far fronte al quale sono state presentate istanze di accesso ai fondi FOI.

Per gli altri 2 progetti, interessati da problematiche conseguenti a variazione della progettazione, la rimodulazione è avvenuta mediante cofinanziamento da parte dell'Ente che, a tale fine, ha provveduto al reperimento delle necessarie risorse.

4. APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI

Il Comune nel riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024 ha illustrato la regolare applicazione delle norme contabili ed ha dichiarato:

I. di aver costituito il Fondo pluriennale vincolato *(FPV*) in entrata e in spesa a fronte di una quota del finanziamento PNRR incassata dall'Ente sotto forma di anticipazione distinguendo i casi a seconda che l'incasso sia avvenuto nel 2022 o nel 2023, così come specificato nella FAQ n. 48/2021 della Ragioneria Generale dello Stato (art. 2 D.M. 11 ottobre 2021);

II. per ogni CUP finanziato da risorse PNRR è stata elaborata una scheda, utilizzando un'estrazione disponibile sul programma di contabilità così da consentire un'analisi degli accertamenti e delle reversali e, sulla base del cronoprogramma di spesa elaborato dal settore competente del progetto finanziato, degli impegni già assunti con determinazione;

III. di aver osservato gli obblighi di tracciabilità e, tra questi, per ogni trasferimento, l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), del codice unico di progetto (CUP) ed ogni altra informazione utile all'identificazione del pagamento su fondi PNRR. Nell'oggetto della fattura, della liquidazione e del mandato vengono inseriti Missione, componente, investimento e CUP, come indicato sui capitoli di entrata e spesa, accertamenti e impegni.

5. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL COMUNE

Nessun correttivo è stato apportato al sistema dei controlli e della governance rispetto a quanto segnalato nelle precedenti deliberazioni della Sezione.

Prosegue, in virtù del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 20 giugno 2023, la collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La Sezione, visti gli esiti dell'istruttoria dalla quale emerge la conclusione di 7 progetti e un buon livello di esecuzione degli altri 32, avuto riguardo alle difficoltà incontrate, rileva come la struttura organizzativa abbia assicurato un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

L'Amministrazione ha attestato che il sito istituzionale è costantemente aggiornato nelle sezioni dedicate al PNRR.

Ha, inoltre, comunicato di aver segnalato alla *task force* per la ripresa e la resilienza della Commissione Europea, ai fini dell'inserimento nella Mappa Europea, i dati sui progetti avviati.

https://www.comune.cremona.it/schede-informative/progetti-pnrr

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione, sulla base delle informazioni contenute nella Tabella PNRR compilata dai Revisori dell'Ente allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 (che contiene informazioni circa dati di bilancio al 31 dicembre 2023 e sullo stato di avanzamento dei progetti al 30 giugno 2024), della piattaforma ReGiS consultata in data 30 gennaio 2025 e delle note istruttorie trasmesse in data 16 dicembre 2024 e 10 marzo 2025, , si possono formulare le seguenti conclusioni:

I. il Comune di Cremona risulta **soggetto attuatore** attuatore/beneficiario di **39 progetti** identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP);

II. le **fonti del finanziamento** sono costituite da fondi **PNRR** pari a **49.640.994,13 euro**, da fondi FOI pari a 5.533.289,38 euro, da fondi PNC pari a 8.979,20 euro, oltre a finanziamenti pubblici, privati e propri, per un ammontare complessivo di **63.007.195,05 euro;**

III. **l'avanzamento procedurale** al 30 giugno 2024, come si ricava dalla Tabella dei Revisori, evidenzia n. 31 progetti nelle fasi iniziali, 3 progetti in corso di esecuzione, 4 conclusi. Per un progetto mancano informazioni;

IV. **l'avanzamento procedurale** su ReGiS aggiornato al **30 gennaio 2025** segnala n. 32 progetti in corso di esecuzione e n. 7 conclusi;

V. il **cronoprogramma**. Dalla Tabella dei Revisori al 30 giugno 2024 risulta che 32 CUP su 39 complessivi, rispettano il cronoprogramma, mentre l'informazione non è stata resa per 3 progetti;

VI. **l'avanzamento finanziario** dai dati ReGiS al 30 gennaio 2025 indica la percentuale e l'importo dei pagamenti effettuati dal Comune in relazione agli impegni assunti nel bilancio sul totale dei finanziamenti: per la Missione 1 sono previsti impegni in bilancio per 493.090,00 euro pari al 46 per cento del totale dei finanziamenti assegnati , interamente pagati; per la Missione 2 sono impegnati in bilancio 6.204213,96 euro, il 39 per cento del totale dei finanziamenti, seguiti da pagamenti per 1.404.761,05 euro (23 per cento delle

somme impegnate); per la Missione 4 risultano impegnati 7.301.793,69 euro, pari all' 83 per cento del totale dei finanziamenti, seguiti da pagamenti per 3.724.328,10 euro (51 per cento); per la Missione 5 risultano impegnati in bilancio 29.749.319,69 euro, l' 80 per cento sul totale dei finanziamenti, seguiti da pagamenti per 10.610.145,42 euro (36 per cento); il CUP della M1 finanziato dal PNC con 8.979,20 euro è stato integralmente pagato. Complessivamente al 30 gennaio 2025 risultano impegni in bilancio pari a 43.757.376,54 euro, ca. il 70 degli importi finanziati, mentre i pagamenti sono stati pari a 16.241.303,77 euro;

VII. quanto alle **anticipazioni** dalla Tabella PNRR dei Revisori si ricava che, al 30 giugno 2024, per la Missione 2 sono stati trasferiti 1.843.766,10 euro, pari al 14 per cento dell'importo finanziato dal PNRR, per la Missione 4 euro 1.539.934,12 corrispondenti al 30 per cento del finanziamento e per la Missione 5 risultano anticipati 2.809.199,60 euro, pari al 9 per cento. La media (12 per cento) è stata calcolata tenendo conto dei finanziamenti per tutti i 38 CUP elencati dai Revisori (con esclusione del PNC non presente nel monitoraggio).Alla data del 31 dicembre 2023 i pagamenti non sono stati superiori alle anticipazioni erogate;

VIII. sono stati totalmente definanziati n. **14 CUP** per un totale di **euro 1.977.709,90,** ricompresi nella M2. Tutti i progetti sono stati ammessi al rifinanziamento con risorse statali ai sensi della L. n.160/2019;

IX. la **rendicontazione:** nella Missione 4 ci sono n. 3 progetti rendicontati oggetto di integrazioni istruttorie; per i progetti della Missione 5 sono stati rendicontati n. 16 progetti in gran parte nel periodo aprile-luglio 2024. Dai riscontri istruttori dell'Ente risulta che per quasi tutti i progetti le amministrazioni titolari hanno chiesto integrazioni ed è in corso il re-invio del rendiconto. Per 15 progetti risultano trasferimenti da parte del Ministero titolare con un ritardo, per uno di essi, di circa 85 giorni;

X. la Tabella PNRR dei Revisori al 30 giugno 2024 elenca nel dettaglio molteplici **criticità** di ordine pratico, tecnico e giuridico incontrate dall'Ente che la

documentazione depositata il 10 marzo 2025 evidenzia come superate e superabili;

XI. l'Ente ha avviato la r**imodulazione** su 20 progetti che hanno presentato difficoltà e scostamenti significativi rispetto alle previsioni originarie. Per 18 di essi l'ente ha segnalato l' **aumento dei prezzi** ed ha presentato istanza per l'accesso ai fondi FOI, mentre per 2 progetti non interessati da problematiche afferenti all'aumento dei prezzi bensì di natura tecnica, la rimodulazione è avvenuta mediante cofinanziamento da parte dell'Ente;

XII. l'Ente ha dichiarato di attenersi alle **norme contabili** per il FPV, la registrazione dei capitoli e la tracciabilità dei finanziamenti e di non aver apportato modifiche rispetto al sistema dei controlli interni;

XIII. Nel corso dell'adunanza pubblica è stato riferito che prosegue, in virtù del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 20 giugno 2023, la collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Non è stato apportato al sistema dei controlli. La Sezione, visti gli esiti dell'istruttoria rileva come la struttura organizzativa abbia assicurato un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

XIV. per quanto riguarda la sezione dedicata al PNRR in **"Amministrazione trasparente**" l' unità organizzativa che coordina il monitoraggio degli interventi PNRR provvede all'aggiornamento della sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ente.

Tabella 8 – Elenco dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Cremona

N.	MISSIONE	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
1	M1	D11C22000480006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N.18 SERVIZI DA MIGRARE	CONCLUSI	Dato Mancante	Concluso
2	M1	D11F22000890006	"ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE - SPID CIE"	CONCLUSI	Termini rispettati	Concluso
3	M1	D11F22001710006	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
4	M1	D11F22002700006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA/EXTRA CODICE DELLA STRADA	CONCLUSI	Dato Mancante	Concluso
5	M1	D11F22003300006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA DEL COMUNE,8*RICHIESTE PER: ACCESSO AGLI ATTI, PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A UN CONCORSO PUBBLICO, AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE, DOMANDA PER BONUS ECONOMICI, DOMANDA PER UN CONTRIBUTO, SITO INTERNET (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO)	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
6	M1	D11F22003900006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	CONCLUSI	Termini rispettati	In Corso
7	M1	D51F22005770006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*EROGAZIONE API 1, EROGAZIONE API 2, EROGAZIONE API 3, EROGAZIONE API 4	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
8	M2	D10J20000040008	ACQUISTO DI N. 11 AUTOBUS ELETTRICI DA 12 M + N. 3 VEICOLI DA 9 M + N. 5 DA 10 M	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
9	M2	D10J22000000001	AUTOBUS AD EMISSIONI ZERO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA O AD IDROGENO E INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALL'ALIMENTAZIONE*VIA POSTUMIA*AUTOBUS ELETTRICI O AD IDROGENO E REALIZZAZIONE RELATIVE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALL'ALIMENTAZIONE	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
10	M2	D19J22000560001	CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE*TERRITORIO COMUNALE*ACQUISTO DI FORNITURE PER SVILUPPARE LA MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
11	M4	D15F22000440006	SCUOLA PRIMARIA TRENTO TRIESTE*VIA PALESTRO, 68*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
12	M4	D18E18000080006	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNA FRANK*VIA NOVATI*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNA FRANK	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
13	M4	D18E18000090006	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO*VIA TREBBIA*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso

N.	MISSIONE	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
14	M5	D11B21000150005	INTERSEZIONE TRA VIA CIRIA E VIA TREBBIA*VIA TREBBIA*REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA CIRIA E VIA TREBBIA E DI NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE SU VIA TREBBIA	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
15	M5	D11B21000730001	PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO*VIA BOSCHETTO*REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
16	M5	D13D21000080005	LUNGO PO EUROPA*LUNGO PO EUROPA*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE A VERDE DI LUNGO PO EUROPA	ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA	Termini rispettati	Concluso
17	M5	D13H20000010004	POLO PER L'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ*VIA DEI CLASSICI 7*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: RICOSTRUZIONE POLO PER L'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
18	M5	D14H22000630007	HOUSING TEMPORANEO*TERRITORIO COMUNALE*SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI ACCOLGIENZA FINALIZZATE AL REINSERIMENTO PER L'AUTONOMIA E H24; SVILUPPO DI UN SISTEMA DI PRESA IN CARICO (EQUIPE MULTI-PROF E LAVORO DI COMUNITÀ)	IN AVVIO	Dato Mancante	In Corso
19	M5	D14H22000640007	STAZIONE DI POSTA*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI STAZIONE DI POSTA PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ E SENZA DIMORA: SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ, COINVOLGIMENTO TERZO SETTORE, RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI E CONNESSIONE CON SOCIO-SANITARIO E CPI	AGGIUDICAZIONE	Termini rispettati	In Corso
20	M5	D14H22000650007	AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI*TERRITORIO COMUNALE*APPARTAMENTI SINGOLI E GRUPPI DI APPARTAMENTI NON INTEGRATI IN UNA STRUTTURA RESIDENZIALE; RICONVERSIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PUBBLICHE; CREAZIONE SISTEMA DI RETE MULTIPROFESSIONALEIN GRADO DI QUALIFICARE L'OFFERTA;	IN AVVIO	Termini rispettati	In Corso
21	M5	D15F21000100005	FORNO PICCOLO PRESSO EX AREA FRAZZI*PIAZZA CADORNA*INTERVENTO DI RESTAURO DEL FORNO PICCOLO PRESSO L'EX AREA FRAZZI DA DESTINARE A LABORATORI E SPAZI ESPOSITIVI	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
22	M5	D15F21000110005	FORNO GRANDE PRESSO EX AREA FRAZZI*PARCO UGO TOGNAZZI*INTERVENTO DI RESTAURO DEL FORNO GRANDE PRESSO L'EX AREA FRAZZI DA DESTINARE A SPAZI ESPOSITIVI	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
23	M5	D15F21000370001	SCALONE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO*VIA CIMITERO*RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALONE DEL CAVALCAVIA PROSPICIENTE IL CIVICO CIMITERO	STIPULA CONTRATTO	Termini NON rispettati	In Corso
24	M5	D15F21000450001	PALAZZO EX DUEMIGLIA*LARGO MADRE CARELLI*RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO EX DUEMIGLIA	STIPULA CONTRATTO	Termini NON rispettati	In Corso
25	M5	D15F21000460001	SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO*VIA BOSCHETTO, 142*RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso

N.	MISSIONE	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
26	M5	D17H21000400005	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (CAMPO DA CALCIO, PISCINE, CAMPI DA TENNIS) PRESSO PIAZZALE AZZURRI D'ITALIA*PIAZZA AZZURRI D'ITALIA*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE FACENTI PARTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRESSO PIAZZALE AZZURRI D'ITALIA	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
27	M5	D17H21000410005	PARCO IGINIO SARTORI*VIA DEL SALE*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PARCO IGINIO SARTORI	ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA	Termini rispettati	Concluso
28	M5	D17H21000420005	PARCO UGO TOGNAZZI*VIALE PO*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PARCO UGO TOGNAZZI	ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA	Termini rispettati	Concluso
29	M5	D17H21000440005	LARGO MORENI*LARGO MORENI*INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASSETTO GEOMETRICO DELLA ROTATORIA DI LARGO MORENI	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
30	M5	D17H21000450005	VIA DEL PORTO E LARGO MARINAI D'ITALIA*VIE VARIE*INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL PORTO E LARGO MARINAI D'ITALIA E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA	AGGIUDICAZIONE	Termini rispettati	In Corso
31	M5	D17H21000470005	SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA MONVISO*VIA MONVISO*RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E AREE DI INVASO PERMEABILI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI IN VIA MONVISO	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
32	M5	D17H21001130001	CENTRO CIVICO QUARTIERE BOSCHETTO*VIA BIANCHI, 2*RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO QUARTIERE BOSCHETTO	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
33	M5	D18I21000090005	EDIFICIO ERP DI VIA VECCHIA 7*VIA VECCHIA 7*RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ERP DI VIA VECCHIA 7	STIPULA CONTRATTO	Termini rispettati	In Corso
34	M5	D18I21000100005	EDIFICIO ERP DI VIA VALDIPADO*VIA VALDIPADO 2*RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ERP DI VIA VALDIPADO 2	STIPULA CONTRATTO	Termini NON rispettati	In Corso
35	M5	D24H21000040007	SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI*TERRITORIO COMUNALE*INDIVIDUAZIONE FIGURE NECESSARIE E COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO ANALISI PRELIMINARE E INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE TARGETCOSTRUZIONE DELLE CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI DI INTERVENTOPARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE	AGGIUDICAZIONE	Termini rispettati	In Corso
36	M5	D24H22000490001	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ*TERRITORIO COMUNALE*DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO; ABITAZIONE: ADATTAMENTO DEGLI SPAZI, DOMOTICA E ASSISTENZA A DISTANZA;LAVORO: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ COINVOLTE NEL PROGETTO E LAVORO A DISTANZA.	IN AVVIO	Termini rispettati	In Corso
37	M5	D24H22000500007	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ*VIA TERRITORIO COMUNALE*DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE DEL	AGGIUDICAZIONE	Termini rispettati	In Corso

N.	MISSIONE	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)
			PROGETTO INDIVIDUALIZZATO;ABITAZIONE: ADATTAMENTO DEGLI SPAZI, DOMOTICA E ASSISTENZA A DISTANZA;LAVORO: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ COINVOLTE NEL PROGETTO E LAVORO A DISTANZA			
38	M5	D34H22000500007	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ*TERRITORIO COMUNALE*GARANZIA DEL LEPS 'DIMISSIONE PROTETTE'; RAFFORZAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE;	IN AVVIO	Termini rispettati	In Corso
39	PNC	D11F23001090001	ANPR019036 CREMONA	DATO MANCANTE	DATO MANCANTE	Concluso

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base della tabella PNRR

